



“सन्धिखर्क नगरवासीको रहर, सुन्दर र समृद्ध नगर”

सन्धिखर्क नगरपालिका

आर्थिक वर्ष २०८२/०८३

तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा कार्यक्रम



मिति: २०८३ वैशाख ३१ गते





सन्धिखर्क नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
सन्धिखर्क, अर्घाखाँची

सन्धिखर्क नगरपालिका, अर्घाखाँचीद्वारा आयोजित आ.व. २०८२।०८३ को तेस्रो
त्रैमासिक समीक्षा कार्यक्रमका लागि तयार पारिएको प्रस्तुति

प्रस्तुतकर्ता

दिलिप कुमार के .सी.


योजना उप-शाखा प्रमुख

३१ वैशाख २०८३



परिचय:

- लुम्बिनी प्रदेश अन्तर्गतका १२ जिल्लाहरू मध्ये अर्घाखाँची जिल्लामा अवस्थित सन्धिखर्क नगरपालिका अर्घाखाँची जिल्लाको सदरमुकाम हो ।
- तत्कालीन स्थानीय विकास मन्त्रालयले २०७१ बैशाख २५ गते देशका विभिन्न २ सय ८३ गा.वि.स. लाइ गाभेर ७२ वटा नयाँ नगरपालिका घोषणा गर्दा अर्घाखाँचीका साविक सन्धिखर्क, नरपानी, खाँचीकोट, किमडाँडा, अर्घा, डिभर्ना र वाडला गाउँविकास समितिहरू समावेश गरी सन्धिखर्क नगरपालिका घोषणा गरिएको हो ।

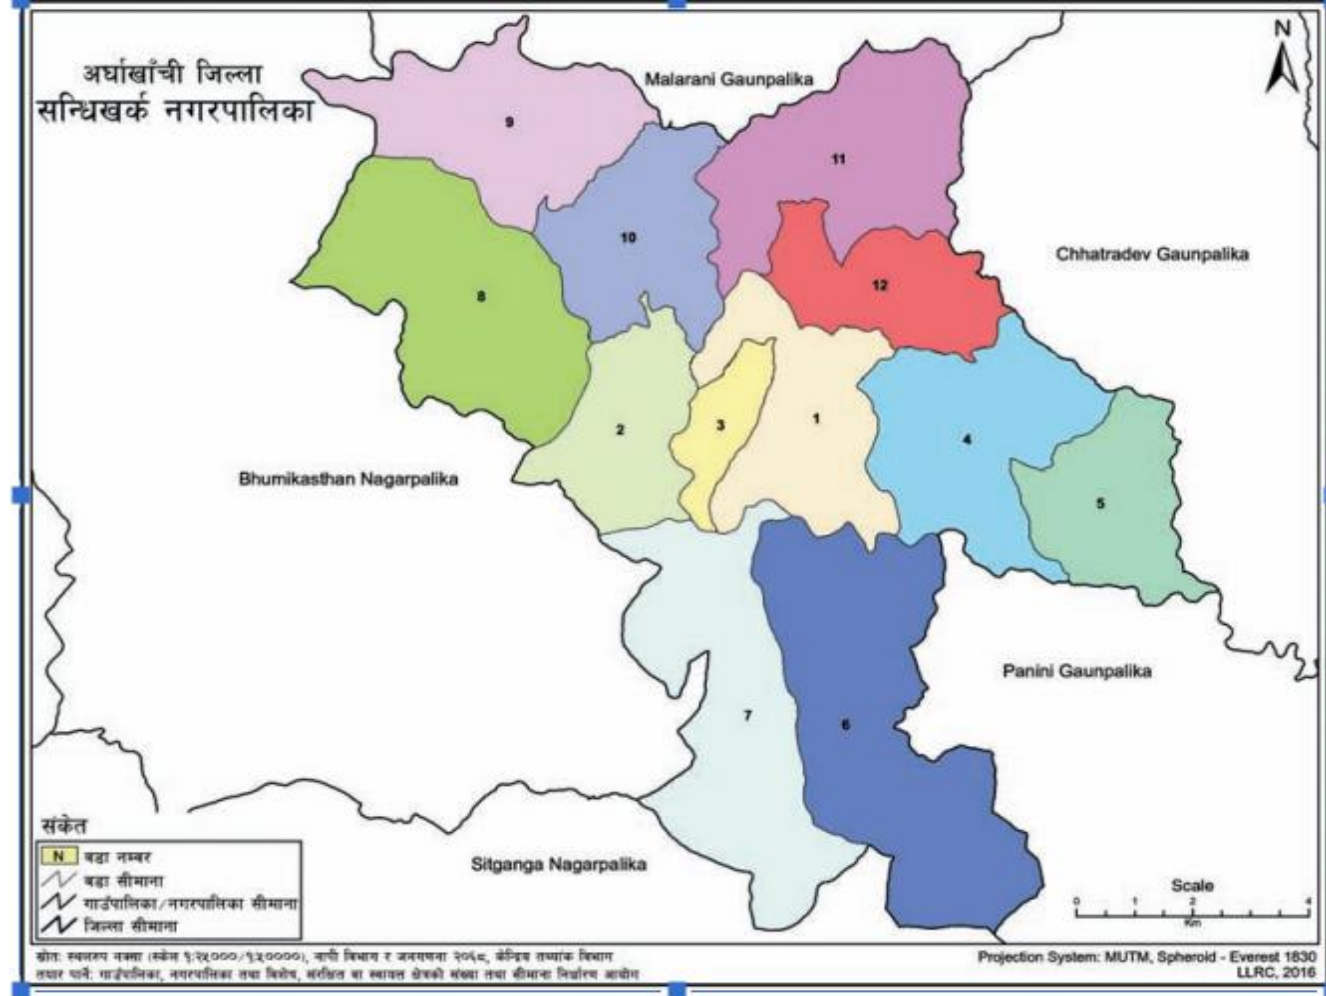

सन्धिखर्क नगरपालिकाको परिचय



स्थापना	२०७१।०१।२५
वडा संख्या	१२
क्षेत्रफल	१२९.४२ वर्ग कि.मि.
उचाइ	समुन्द्र सतहदेखि ७९५ देखि २१६२ मिटर सम्म
सिमाना	पर्व: छत्रदेव र पाणिनी गाँउपालिका, पश्चिम: भूमिकास्थान नगरपालिका, उत्तर: मालारानी गाँउपालिका, दक्षिण: शितगंगा नगरपालिका,
जनसंख्या	४२४९२
घरधुरी संख्या	१२०७०

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को प्रस्तावित बजेट तथा हालसम्मको प्राप्ति विवरण



आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को त्रैमासिक आम्दानी तथा खर्च विवरण

सि.न.	विवरण	प्रस्तावित बजेट	आम्दानी	प्रतिशत	खर्च	प्रतिशत
१	प्रथम त्रैमासिकसम्मको	८८५,३००,०००.००	१७४,८३५,४४६	१९.७५	१२९,०२८,८३६	१४.५७
२	दोश्रो त्रैमासिकसम्मको	८८५,३००,०००.००	२८७,०२६,९२४	३२.४२	२१०,६८१,०४३	२३.८०
३	तेस्रो त्रैमासिकसम्मको	८८५,३००,०००.००	६७५,३१७,६२४	७६.२८	४८८,२५५,८१८	५५.१५



आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को विषयक्षेत्रगत विनियोजन र खर्चको अवस्था

सि.न.	विषयगत क्षेत्र	विनियोजित रकम	खर्च रकम	खर्च प्रतिशत
१	आर्थिक विकास	३६०७५०००	८२९८४४७	२३.
२	सामाजिक विकास	४८३०९१७१९	३०९०१७७१८	६३.९७
३	पूर्वाधार विकास	२२३९६१२८१	१२०९१४२६७	५३.९९
४	कार्यालय संचालन तथा प्रशासनिक	१२९०७७०००	८६०४७६१२	६६.६६
५	सुशासन तथा संस्थागत क्षमता विकास	१९१९५०००	७४४६२४४	३८.७९
६	सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम	२२०००००००	१५४६९७३८१	७०.३२
	जम्मा (१ अरब ११ करोड १४ लाख)	१,११,१४,००,०००	६८,६४,२१,६६९	६१.७६



सन्धिखर्क नगरपालिका
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक योजना तथा कार्यक्रमको सारांश

योजना शाखाबाट कार्यान्वयन हुने योजनाहरुको विवरण

सि.न.	विवरण	योजना संख्या	विनियोजित रकम	कैफियत
१	वडास्तरीय कार्यक्रमहरु	१६१	१६५८५०००	
२	नगरस्तरीय कार्यक्रमहरु	३२	६०३००००	
	जम्मा कार्यक्रम	१९३	२२६१५०००	
१	वडास्तरीय पूर्वाधार योजनाहरु	१६९	१९४१५०००	
२	नगरस्तरीय पूर्वाधार योजनाहरु	३०४	२५५९५५०००	
	जम्मा योजना तथा कार्यक्रम	४७३	२७५३७००००	
	कुल योजना तथा कार्यक्रम	६६६	२९७९८५०००	
	योजना तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन विधि			
१	उपभोक्ता समितिबाट कार्यान्वयन हुने योजना संख्या	४२२	१०५२४५०००	
२	टेण्डर प्रक्रियाबाट कार्यान्वयन हुने योजना संख्या	५१	१७०१२५०००	क्रमागत समेत
३	वडा तथा नगर तथा अन्यबाट कार्यान्वयन हुने योजना संख्या	१९३	२२६१५०००	
	जम्मा	६६६	२९७९८५०००	



आर्थिक वर्ष २०८२/२०८३ को समग्र वित्तीय प्रगति

क्र.स.	विवरण	बार्षिक बजेट रु	बार्षिक खर्च रु	खर्च प्रतिशत
१	चालु खर्च	५९०४६५०००	३८००८२२१८	६४.३७
२	पूँजीगत खर्च	२९४८३५०००	१४६४९९९९२	४९.६९
३	सामाजिक सुरक्षा खर्च	२२०००००००	१५४६९७३८१	७०.३२
४	अन्तरसरकारी अख्तियारी सडक बोर्ड नेपाल	६१०००००	५१४२०७८	८४.३०
	जम्मा	१,११,१४,००,०००	६८,६४,२१,६६९	६१.७६



आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ प्रगति प्रतिवेदन

क्र.स.	विवरण	योजना संख्या	सम्झौता संख्या	प्रगति प्रतिशत
१	नगर तथा वडा योजना पूर्वाधार	४७३	३९८	८४
	जम्मा	४७३	३९८	८४

आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ प्रगति प्रतिवेदन

क्र.स.	विवरण	सम्झौता संख्या	भुक्तानी	प्रगति प्रतिशत
१	नगर तथा वडा योजना पूर्वाधार	३९८	३११	७८
	जम्मा	३९८	३११	७८

चालु कार्यक्रम तर्फका योजनाहरु सिधै भुक्तानी हुने गरेकोले उक्त कार्यक्रमको विवरण योजना शाखामा नभएको ।

आ.व.२०८२/०८३ को तेस्रो त्रैमासिक अवधिसम्मको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन



सन्धिखर्क नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
सन्धिखर्क, अर्घाखाँची

आ.व.२०८२/८३ तेस्रो त्रैमासिक अवधिसम्मको प्रगति प्रतिवेदन

सि. न.	योजना /कार्यक्रमको नाम	वडा न.	वार्षिक कार्यलक्ष्य			वार्षिक भौतिक प्रगति			वार्षिक खर्च	
			परिमाण	भार	बजेट रु.	परिमाण	भार	प्रतिशत	रकम रु.	प्रतिशत
१	सडक बोर्ड नेपाल कार्यक्रम म्याचिड सहित	०	१	२.३४	६१०००००	१	२.३४	१००	५१४२०७८	८४
२	वडा प्रशासनिक भवन निर्माण (वडा नं. ५,६,७,८ र १२)	०	१	१०.१९	२६६०००००	१	१०.१९	१००	२६६०००००	१००
३	बराङ्दी खोला ११ झो.पु., र बरखोला झो.पु. (नयाँ झो.पु.को म्याचिड समेत)	०	१	१.४६	३८०००००	०.४	०.६४	४४	१६८२७६१	४४
४	गंगा सरोवर क्षेत्रको जैविक विविधता तथा प्राकृतिक श्रोत संरक्षण	०	१	०.५४	१४०००००	१	०.५४	१००	१३९१०००	९९
५	रिठेखोला माझहटिया जरेखोला ग्रामिण सडक स्तरोन्नती	०	१	१.४२	३७०००००	१	१.४२	१००	३७०००००	१००
६	ऐतिहासिक जंगबहादुर राणा जन्मेको मथुरावेसी पौवा संरक्षण तथा पहुँच मार्ग निर्माण	०	१	०.५७	१५०००००	१	०.५७	१००	१५०००००	१००
७	ऐतिहासिक चौबिसे राज्य अन्तर्गतको खाँची दरवार पुन निर्माण तथा पहुँचमार्ग निर्माण	०	१	१.११	२९०००००	१	१.११	१००	२९०००००	१००
८	प्राकृतिक सम्पदाको रूपमा रहेको रक गाउँ संरक्षण	०	१	०.८४	२२०००००	०.४	०.३४	४०	०	०
९	ढोरपाटन बेहोरे कुर पल्लावारी दुवार गच्छे सडक स्तरोन्नती	०	१	१.१५	३००७०००	१	१.१५	१००	३००७०००	१००
१०	स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माण (सनपा-७,८ र ११)	०	१	४.६६	१२१७०४००	१	४.६६	१००	१२१७०४००	१००
११	भगवती आधारभूत विद्यालय भवन निर्माण	०	१	१.०८	२८२२६००	१	१.०८	१००	२८२२६००	१००
१२	बहुउद्देश्यीय भवन निर्माण	०	१	०.९४	२४५००००	१	०.९४	१००	२४५००००	१००
१३	फुद्वाड-डिही-किटेनी-खाँचीमैदान-खाँचीखोला देउराली सडक स्तरोन्नति (म्याचिड समेत)	०	१	८.६२	२२५०००००	०.३	२.५९	३०	०	०
१४	अलुवा खोला भलाचौर ग्रामिण सडक स्तरोन्नति	०	१	२.५८	६७२५३८४	०.६	१.५५	६०	३५३०४७१	५२
१५	रिठेखोला रानीपोखरा माझहटिया कोट ग्रामिण सडक स्तरोन्नति	०	१	२.६१	६८०५६२२	०.६	१.५६	६०	२९६७६६०	४४
१६	बडरखोला घोचकोट थापाटोला तिनपिप्ले घर्तीडाँडा लिफ्ट खानेपानी योजना	०	१	१.९०	४९६८७२०	०.९	१.७१	९०	३३४६०२७	६७
१७	गौडा इटपार्ने कुडापानी पठाशाला मैदान ग्रामिण सडक स्तरोन्नति	०	१	२.२३	५८१७४९०	१	२.२३	१००	५५४३२४७	९५
१८	गाइपालन फर्मदेखि ठुलावराप थापाडाडा रिठेपोखरी हुँदै साना वराप ढोरपाटन ग्रामिण सडक स्तरोन्नति (प्रथम)	०	१	०.८१	२१२३३३२	१	०.८१	१००	२११०६०६	९९
१९	जोगिमारे आँपागैरादेखि हडाह हुँदै जुम्लि कुलाबाँधसम्मको ग्रामिण सडक स्तरोन्नति	०	१	२.४६	६४२२६५६	०.८	१.९७	८०	३७६७१३३	५९
२०	फुद्वाड जौडी वडा कार्यालय हुँदै घुम्ती ग्रामिण सडक स्तरोन्नति	०	१	२.३५	६१३०६०९	०.५	१.१७	५०	२४२८७६५	४०
२१	जिमुरथुम कल्लाबोट गायत्री टोल मो.वा.स्तरोन्नति	०	१	१.४२	३६९६७०७	०.८	१.१३	८०	०	०
२२	गाइपालन फर्मदेखि ठुलावराप थापाडाडा रिठेपोखरी हुँदै साना वराप ढोरपाटन ग्रामिण सडक स्तरोन्नति (दोस्रो)	०	१	०.६९	१७९९२५६	०.३	०.२१	३०	०	०
२३	बडरखोला घोचकोट थापाटोला तिनपिप्ले घर्तीडाँडा लिफ्ट खानेपानी योजना (दोस्रो)	०	१	०.३७	९५९५००	०.५	०.१८	५०	०	०

चालु आर्थिक वर्ष २०८२-८३ मा सञ्चालित मुख्य मुख्य कार्यहरू



- ❖ क्रमागत योजना वडा (नं.५,६,७,८ र १२) प्रशासनिक भवन निर्माण कार्य सम्पन्न भइ तत्तत् वडाका भवनहरूबाट सेवा सूचारु भएको
- ❖ बहुउद्देश्यीय भवन सनपा-७ निर्माण सम्पन्न
- ❖ गत वर्ष सम्पन्न भइ भुक्तानी हुन बाँकी:-
- ❖ अर्घा भगवती आधारभूत विद्यालय भवन निर्माण, वडा नं.७, ८ र ११ का स्वास्थ्य भवन निर्माण, ढोरपाटन वेहोरे कुर पल्लावारी दुवार गच्छे सडक कालोपत्रे कार्यको आंशिक रकम भुक्तानी भएको छ ।
- ❖ ऐतिहासिक जंगबहादुर राणा जन्मेको मथुरावेसी पौवा संरक्षण तथा पहुँच मार्ग, रिठेखोला माझहटिया जरेखोला ग्रामिण सडक स्तरोन्नति,गंगा सरोवर क्षेत्रको जैविक विविधता तथा प्राकृतिक श्रोत संरक्षण,पर्यटकीय स्थान रक गर्डेन स्तरोन्नती ।

संचालनमा रहेका प्रमुख विकास निर्माणका आयोजनाहरू



- फुद्वाङ-डिही-किटेनी-खाँचीमैदान-खाँचीखोला देउराली सडक स्तरोन्नति
- अलुवा खोला भलाचौर ग्रामीण सडक स्तरोन्नति
- रिठेखोला रानीपोखरा माझहटिया कोट ग्रामीण सडक स्तरोन्नति
- गौँडा इटपार्ने कुँडापानी पठाशाला मैदान ग्रामीण सडक स्तरोन्नति
- वलेवाङ-मथुरा-जरेखोला-जोगीमारे सडक वडा नं. ५, ४, ११ र १२
- गाइपालन फर्मदेखि ठुलावराप थापाडाडा रिठेपोखरी हुँदै साना वराप ढोरपाटन ग्रामीण सडक स्तरोन्नति
- कृषि जन्य वस्तु सङ्कलन तथा बिक्री केन्द्र निर्माण स्थापना र उपकरण व्यवस्थापन आयोजना
- फुदवाङ जौडी वडा कार्यालय हुँदै घुम्ती ग्रामीण सडक स्तरोन्नति
- जिमुरथुम कल्लाबोट गायत्री टोल वस्याल टोलसम्म ग्रामीण सडक स्तरोन्नति
- वडरखोला घोचकोट थापाटोला तिनपिप्ले घर्तीडाँडा लिफ्ट खानेपानी योजना सन्धिखर्क, ८



संचालनमा रहेका प्रमुख विकास निर्माणका आयोजनाहरू

- जोगिमारे आँपागैरादेखि हडाह हुँदै जुम्लि कुला बाँधसम्मको ग्रामीण सडक स्तरोन्नति सन्धिखर्क-११
- खाँचीखोला पन्चासे सडक ढलान तथा स्तरोन्नति, सन्धिखर्क-६
- अर्घा स्वास्थ्य चौकी स्तरोन्नति, सन्धिखर्क ९,
- ढाँडखोला न्यौपाने टोल मोटरबाटो स्तरोन्नति सन्धिखर्क-६
- पाठशाला राशिचौर सडक स्तरोन्नति सन्धिखर्क-९
- नाङ्गेठारी देखि भूमिका स्थानमन्दिर सम्मको सडक स्तरोन्नति कार्य सन्धिखर्क -४
- राजुपानी फलेका पोखरा खाडा सडक ढलान सन्धिखर्क, ९
- पोखेडाँडा भेडावारी ट्राउट माछापालन मोटरबाटो सन्धिखर्क, ६
- नयाँ बजार पानी फ्याक्ट्री हुँदै काफलटारीदेखि ढुङ्गेदेउराली सडक स्तरोन्नति सन्धिखर्क-२
- सन्धिखर्क रेडक्रस आकस्मिक ब्लड बैंक संरचना निर्माण, सन्धिखर्क, १
- नागरिक आवास जस्तापाता साझेदारी कार्यक्रम
- जनज्योती माध्यमिक विद्यालय भवन निर्माण



मुख्य समस्या/चुनौती

- टुक्रे योजना
- योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि समयतालिका निर्माण र सोको प्रभावकारी कार्यान्वयन (योजना सम्झौता, अनुगमन तथा सम्पन्न)
- स्वीकृत दरबन्दी अनुसारको जनशक्तिको पदपूर्ति नहुनु
- निर्माण कार्यको गुणस्तर नियन्त्रण
- समयमा बजेट निकासो नहुनु ।



तस्विरहरु



गंगा सरोवर ताल सनपा-६

रक गार्डेन स्तरोन्ती सनपा ११






श्री ३जङ्गबहादुर राणाको जन्मस्थान
सन्धिखर्क नगरपालिका-५, मथुरावेंसी-अ.सं.






सनपा-७ बाघमारा कालेकारुख सडक

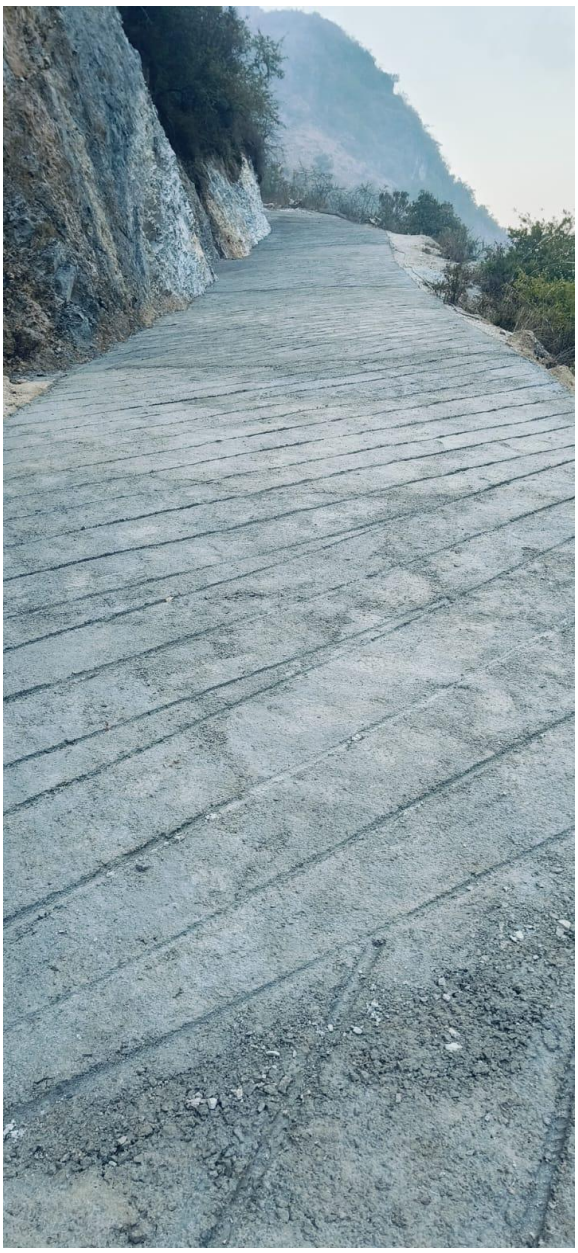



बहुउद्देश्यीय भवन सनपा-७ निर्माण सम्पन्न

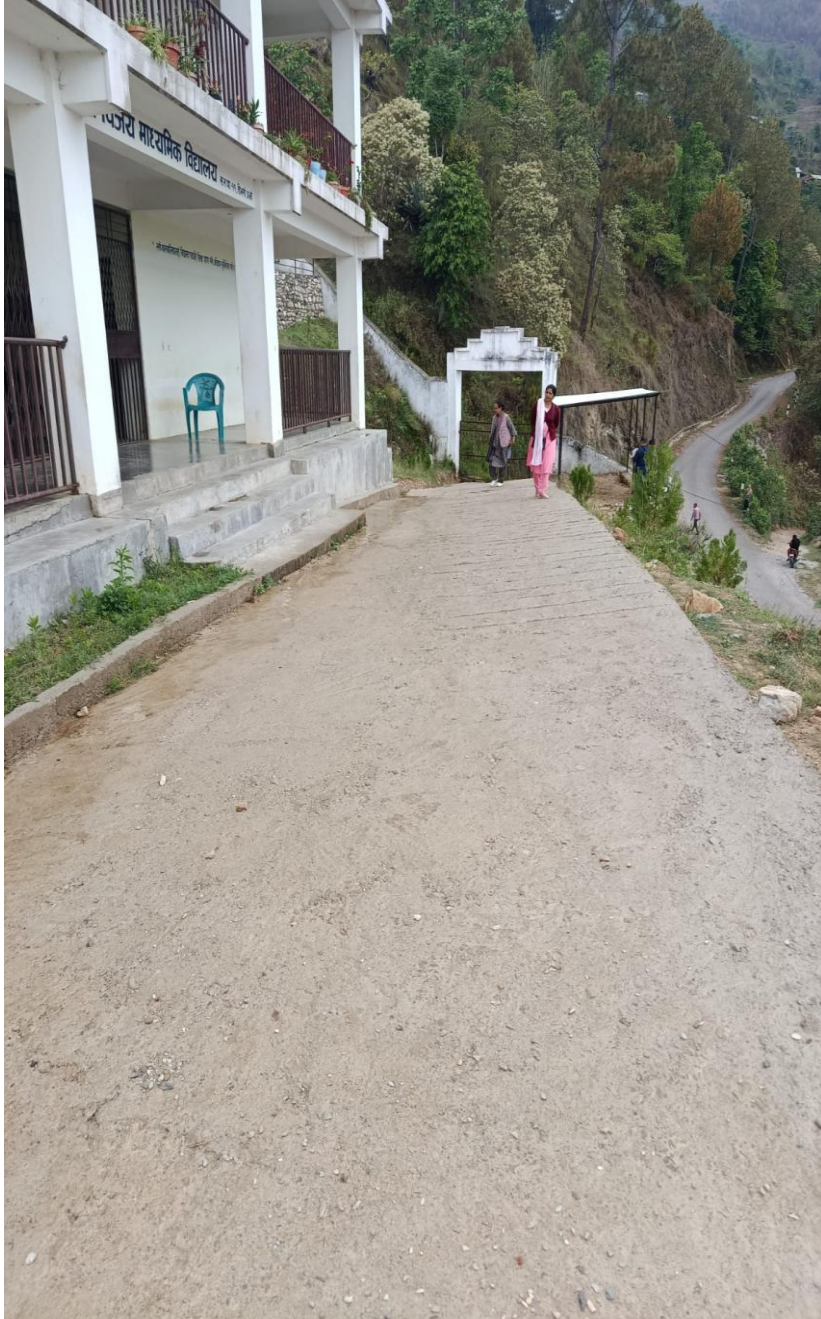

विजय मा वि पार्किङ स्थल
र प्रवेद्धार स्तरोन्नती सनपा ११



तिजुपानी नन्दली पोखरा खरिपाटा र देउराली डाडा स्तरोन्नती कार्य सनपा ४











चौतारीपाटा लुतेवारी खानेपानी टंकी निर्माण सनपा-५



नगरपालिका









यहाँहरुको धैर्यता र
समयको लागि
धन्यवाद



सन्धिखर्क नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
सन्धिखर्क, अर्घाखाँची

आ.व.२०८२/८३ तेस्रो त्रैमासिक अवधिसम्मको प्रगति प्रतिवेदन

सि. न.	योजना/कार्यक्रमको नाम	वडा न.	वार्षिक कार्यलक्ष्य			वार्षिक भौतिक प्रगति			वार्षिक खर्च तथा प्रगति %	
			परिमाण	भार	बजेट रु.	परिमाण	भार	प्रतिशत	रकम रु.	प्रतिशत
१	सडक बोर्ड नेपाल कार्यक्रम म्याचिड सहित	०	१	२.३४	६१०००००	१	२.३४	१००	५१४२०७८	८४
२	वडा प्रशासनिक भवन निर्माण (वडा नं. ५,६,७,८ र १२)	०	१	१०.१९	२६६०००००	१	१०.१९	१००	२६६०००००	१००
३	बराङ्दी खोला ११ झो.पु., र बरखोला झो.पु. (नयाँ झो.पु.को म्याचिड समेत)	०	१	१.४६	३८०००००	०.४	०.६४	४४	१६८२७६१	४४
४	गंगा सरोवर क्षेत्रको जैविक विविधता तथा प्राकृतिक श्रोत संरक्षण	०	१	०.५४	१४०००००	१	०.५४	१००	१३९१०००	९९
५	रिठेखोला माझहटिया जरेखोला ग्रामिण सडक स्तरोन्नती	०	१	१.४२	३७०००००	१	१.४२	१००	३७०००००	१००
६	ऐतिहासिक जंगबहादुर राणा जन्मेको मथुरावेसी पौवा संरक्षण तथा पहुँच मार्ग निर्माण	०	१	०.५७	१५०००००	१	०.५७	१००	१५०००००	१००
७	ऐतिहासिक चौबिसे राज्य अन्तर्गतको खाँची दरवार पुन निर्माण तथा पहुँचमार्ग निर्माण	०	१	१.११	२९०००००	१	१.११	१००	२९०००००	१००
८	प्राकृतिक सम्पदाको रूपमा रहेको रक गाउँ संरक्षण	०	१	०.८४	२२०००००	०.४	०.३४	४०	०	०
९	ढोरपाटन बेहोरे कुर पल्लावारी दुवार गच्छे सडक स्तरोन्नती	०	१	१.१५	३००७०००	१	१.१५	१००	३००७०००	१००
१०	स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माण (सनपा-७,८ र ११)	०	१	४.६६	१२१७०४००	१	४.६६	१००	१२१७०४००	१००
११	भगवती आधारभूत विद्यालय भवन निर्माण	०	१	१.०८	२८२२६००	१	१.०८	१००	२८२२६००	१००
१२	बहुउद्देश्यीय भवन निर्माण	०	१	०.९४	२४५००००	१	०.९४	१००	२४५००००	१००
१३	फुदवाङ-डिही-किटेनी-खाँचीमैदान-खाँचीखोला देउराली सडक स्तरोन्नति (म्याचिड समेत)	०	१	८.६२	२२५०००००	०.३	२.५९	३०	०	०
१४	अलुवा खोला भलाचौर ग्रामिण सडक स्तरोन्नति	०	१	२.५८	६७२५३८४	०.६	१.५५	६०	३५३०४७१	५२
१५	रिठेखोला रानीपौखरा माझहटिया कोट ग्रामिण सडक स्तरोन्नति	०	१	२.६१	६८०५६२२	०.६	१.५६	६०	२९६७६६०	४४
१६	वडरखोला घोचकोट थापाटोला तिनपिप्ले घर्तीडाँडा लिफ्ट खानेपानी योजना	०	१	१.९०	४९६८७२०	०.९	१.७१	९०	३३४६०२७	६७
१७	गौडा इटपाने कुडापानी पठाशाला मैदान ग्रामिण सडक स्तरोन्नति	०	१	२.२३	५८१७४९०	१	२.२३	१००	५५४३२४७	९५
१८	गाइपालन फर्मदिखि ठुलावराप थापाडाडा रिठेपोखरी हुँदै साना वराप ढोरपाटन ग्रामिण सडक स्तरोन्नति (प्रथम)	०	१	०.८१	२१२३३३२	१	०.८१	१००	२११०६०६	९९
१९	जोगिमारे आँपागौरादेखि हडाह हुँदै जुम्लि कुलाबौधसम्मको ग्रामिण सडक स्तरोन्नति	०	१	२.४६	६४२२६५६	०.८	१.९७	८०	३७६७१३३	५९
२०	फुदवाङ जौडी वडा कार्यालय हुँदै घुम्नी ग्रामीण सडक स्तरोन्नति	०	१	२.३५	६१३०६०९	०.५	१.१७	५०	२४२८७६५	४०
२१	जिमुरथुम कल्लाबोट गायत्री टोल मो.वा.स्तरोन्नति	०	१	१.४२	३६९६७०७	०.८	१.१३	८०	०	०
२२	गाइपालन फर्मदिखि ठुलावराप थापाडाडा रिठेपोखरी हुँदै साना वराप ढोरपाटन ग्रामिण सडक स्तरोन्नति (दोस्रो)	०	१	०.६९	१७९९२५६	०.३	०.२१	३०	०	०
२३	वडरखोला घोचकोट थापाटोला तिनपिप्ले घर्तीडाँडा लिफ्ट खानेपानी योजना (दोश्रो)	०	१	०.३७	९५९५००	०.५	०.१८	५०	०	०
२४	वडा नं ५ स्थित रिङ्दी खोला बलेवाङ लिफ्ट खानेपानी योजना	०	१	०.७५	१९६१५१५	०	०.००	०	०	०
२५	वडा नं ३ स्थित फोहरमैला विसर्जन स्थलमा ग्याविल बाल निर्माण, अर्घाखाँची पेट्रोलपम्प अगाडी चैकड्याम निर्माण, तथा मस्जिदलाईन देखि शंखेटारी जाने जिवलाल चुँदालीको घर अगाडी ठाडो बाटो निर्माण	०	१	०.३४	८९९२२७	०.१	०.०३	१०	०	०
२६	गाइपालन फर्मदिखि ठुलावराप थापाडाडा रिठेपोखरी हुँदै साना वराप ढोरपाटन ग्रामिण सडक स्तरोन्नति (तेस्रो)	०	१	०.३०	७९२३०२	०.३	०.०९	३०	०	०
२७	बलेवाङ-मथुरा-जरेखोला-जोगिमारे सडक वडा नं. ५,४,११ र १२ (म्याचिड समेत)	०	१	२.४५	६४०००००	०.८	१.९६	८०	०	०
२८	कृषि जन्य वस्तु सडकलन तथा बिक्री केन्द्र निर्माण स्थापना र उपकरण व्यवस्थापन आयोजना	०	१	२.६०	६८०००००	०.७	१.८२	७०	०	०
२९	कृषि बजार तथा स्टोर संरचना निर्माण निरन्तरता	०	१	०.५७	१५०००००	०.६	०.३४	६०	०	०
३०	देउरालीडाँडा सडक स्तरोन्नति	०	१	०.९६	२५०००००	१	०.९६	१००	१७२४०१३	६९

सि. न.	योजना/कार्यक्रमको नाम	बडा न.	वार्षिक कार्यलक्ष्य			वार्षिक भौतिक प्रगति			वार्षिक खर्च तथा प्रगति %	
			परिमाण	भार	बजेट रु.	परिमाण	भार	प्रतिशत	रकम रु.	प्रतिशत
३१	खाँचीखोला पन्चासे सडक ढलान तथा स्तरोन्नति, सन्धिखर्क-७ प्रथम	०	१	१.०८	२८२९३६९	१	१.०८	१००	२७४६६४२	९७
३२	खाँचीखोला पन्चासे सडक ढलान तथा स्तरोन्नति, सन्धिखर्क-७ दोश्रो	०	१	०.४२	१०८८४८५	१	०.४२	१००	१०८८४७१	१००
३३	ढाँडखोला न्यौपाने टोल मोटरबाटो स्तरोन्नति सन्धिखर्क-६	०	१	१.५३	४००००००	०.८	१.२३	८०	०	०
३४	नयाँ बजार पानी प्याक्ट्री हुँदै काफलटारीदेखि दुङ्गेदेउराली सडक स्तरोन्नति सन्धिखर्क -२	०	१	०.९६	२५०००००	०.८	०.७७	८०	०	०
३५	पाठशाला राशिचौर सडक सन्धिखर्क-९	०	१	०.३३	८५५१८९	०.६	०.२०	६०	०	०
३६	पाठशाला राशिचौर सडक सन्धिखर्क-९	०	१	१.५२	३९८०१४५	०.६	०.९१	६०	०	०
३७	नाङ्गेठारी देखि भूमिका स्थानमन्दिर सम्मको सडक स्तरोन्नति कार्य सन्धिखर्क -४	०	१	०.९६	२५०००००	०.५	०.४८	५०	०	०
३८	खाँचीमैदान सेती पोखरी मोटरबाटो सन्धिखर्क,७	०	१	०.३८	१००००००	१	०.३९	८०	०	०
३९	मथुराघाट पूर्वाधार निर्माण सन्धिखर्क-५	०	१	०.३८	१००००००	१	०.३८	१००	९६८३९६	९७
४०	फलेपथ खोपिडाँडा बन्दरबुटा खेलमैदान अथुरो सन्धिखर्क,९	०	१	०.४३	११२५०००	१	०.२६	६०	०	०
४१	भद्राचौर खेलमैदान निर्माण सन्धिखर्क,१०	०	१	०.३८	१००००००	१	०.३४	९०	०	०
४२	राजुपानी फलेका पोखरा खाडा सडक ढलान सनपा ९	०	१	०.५७	१५०००००	१	०.५२	९०	०	०
४३	पोखेडाँडा भेडावारी ट्राउट माछापालन मोटरबाटो सन्धिखर्क,६	०	१	१.००	१३७५०००	१	१.००	१००	१२१७४८९	८९
४४	तिजुपानी नन्दली पोखरा खरिपाटा मोटरबाटो सन्धिखर्क,४	०	१	०.३७	९७११०५	०	०.००	०	९३६२९३	९६
४५	अर्घा स्वास्थ्य चौकी स्तरोन्नति,सन्धिखर्क ९,	०	१	०.७७	२००००००	१	०.६१	८०	०	०
४६	स्थानडाँडा सिस्नेखोला लिफ्ट खानेपानी सन्धिखर्क,३	०	१	०.३८	१००००००	१	०.२७	७०	०	०
४७	सन्धिखर्क रेडक्रस आकस्मिक ब्लड बैङ्क संरचना निर्माण, सन्धिखर्क,१	०	१	१.३४	३५०००००	०.६	०.८०	६०	०	०
४८	पटुवाथुम शिवालय मन्दिर जिर्णोद्धार सन्धिखर्क,१	०	१	०.३८	१००००००	०.४	०.१५	४०	०	०
४९	काकीटोला बाहुरे सिँचाई कुलो मर्मत तथा निर्माण सन्धिखर्क,९	९	१	०.१९	५०००००	०	०.०६	३०	०	०
५०	जगा प्राप्ति तथा इम्पिडसाइट व्यवस्थापन	१	१	०.३८	१००००००	१	०.३८	१००	९८९९२८	९९
५१	फोहोर मैला व्यवस्थापन सनपा १	१	१	०.३८	१००००००	१	०.३८	१००	९८४३५७	९८
५२	पालिका सरोकार साप्ताहिक टेलिभिजन कार्यक्रम	०	१	०.०४	१०००००	१	०.०२	५०	०	०
५३	सन्धिखर्क एफ.एम.बाट नागरिक अन्तरसंवाद कार्यक्रम	०	१	०.०४	१०००००	१	०.०२	५०	०	०
५४	जिवनोद्धार मा.वि. स्टेन्डी खरिद व्यवस्थापन	०	१	०.०२	६००००	१	०.०२	१००	६००००	१००
५५	वडा कार्यालयहरूमा सुशासन सम्बन्धी कार्यक्रम	०	१	०.०४	१०००००	१	०.०४	१००	१०००००	१००
५६	सार्वजनिक सुनुवाइ	०	१	०.०६	१५००००	१	०.०३	५०	०	०
५७	मसलन्द तथा कार्यालय सामग्री	०	१	०.५६	१४५३४३५	१	०.५६	१००	१०८८३२०	७५
५८	सामाजिक परिक्षण	०	१	०.०४	१०००००	०	०.००	०	०	०
५९	सामुदायिक विद्यालयका छात्राहरुलाई निशुल्क स्थानिटी प्याड व्यवस्थापन	०	१	०.७५	१९५५०००	१	०.३७	५०	०	०
६०	नागरिक आवास जस्तापाता साझेदारी कार्यक्रम	०	१	१.९१	५००००००	१	१.९१	१००	०	०
६१	जीवनोद्धार माध्यमिक विद्यालय फर्निचर खरिद तथा शैक्षिक अनुदान	०	१	०.०५	१३५०००	१	०.०५	१००	१३५०००	१००
६२	सन्धिखर्क २ भित्रीबाटो कार्कीका घर नजिक ढलानबाटो स्तरोन्नती	०	१	०.०४	१०००००	१	०.०४	१००	९८८२१	९९
६३	हटारीदेखि हस्पिटल जाने सडक स्तरोन्नती	०	१	०.०३	६९०००	१	०.०३	१००	६६४७८	९६
६४	गरिवसँग विधवेधर कार्यक्रम लागु भएका स्थानीय तहमा कार्यक्रम सञ्चालन खर्च	०	१	०.०७	१८५०००	५	०.३५	५००	०	०
६५	टेलिभिजन/पत्रपत्रिका रिपोर्टिङ तथा प्रचार प्रसार कार्यक्रम	०	१	०.०४	१०००००	५	०.१९	५००	०	०
६६	गौशिया अहेले सुन्नक मद्रसाह व्यवस्थापन तथा शैक्षिक अनुदान	४	१	०.०१	१५०००	१	०.०१	१००	१५०००	१००
६७	पचासे बगुवा सिँचाई कुलो	१	१	०.०१	३००००	१	०.०१	१००	३००००	१००
६८	च्यानडाँडाचोक देखि रेमलालको घरसम्म बाटो पूर्णता	१	१	०.०१	३००००	०	०.००	०	०	०
६९	घन बहादुरको सोमैको घरमुनि जोखिम ठाउँमा जाली राखे सनपा-३	३	१	०.०१	३५०००	१	०.०१	१००	३५०००	१००
७०	वम बहादुर नेपालीको घरमुनि स्थानडाँडा जाने गोरटोबाटो स्तरोन्नती सनपा-३	३	१	०.०१	३५०००	१	०.०१	१००	३५०००	१००
७१	गोकर्ण भुसालको घरदेखि वि.क.टोल जाने सिँडी निर्माण सन्धिखर्क,८	८	१	०.०१	३५०००	१	०.०१	१००	३५०००	१००
७२	पाणिनि चोकमा पार्क निर्माण	१	१	०.०२	४००००	१	०.०२	१००	४००००	१००
७३	झिन्केडाँडा शिवालय मन्दिरको छेउमा नाली तथा सिँडी निर्माण	१	१	०.०२	४००००	१	०.०२	१००	४००००	१००
७४	झेडीखोला लदाम रानीगौर खानेपानी	१	१	०.०२	४००००	०	०.००	०	०	०
७५	दुर्गा आधारभूत विद्यालय मर्मत	३	१	०.०२	४५०००	१	०.०२	१००	४५०००	१००
७६	बराहनेटा पधेरा प्रतिशालय निर्माण	३	१	०.०२	४५०००	१	०.०२	१००	४५०००	१००
७७	पधेरापारी चिसापानी मोटरबाटो स्तरोन्नति	३	१	०.०२	४५०००	०	०.००	०	०	०
७८	संगम आधारभूत विद्यालय मर्मत	३	१	०.०२	४५०००	१	०.०२	१००	४५०००	१००
७९	शिवालय मन्दिर जाने सडकको पर्खालमा माटो भर्ने र सरला मार्ग स्वामीकारुख निर पर्खालमा माटो भर्ने सन्धिखर्क-३	३	१	०.०२	४५०००	१	०.०२	१००	४५०००	१००

सि. न.	योजना/कार्यक्रमको नाम	बडा न.	वार्षिक कार्यलक्ष्य			वार्षिक भौतिक प्रगति			वार्षिक खर्च तथा प्रगति %	
			परिमाण	भार	बजेट रु.	परिमाण	भार	प्रतिशत	रकम रु.	प्रतिशत
८०	पधेरापारी अधुनो खानेपानी टङ्की निर्माण	३	१	०.०२	४५०००	१	०.०२	१००	४५०००	१००
८१	भुरुङखोला खानेपानी	५	१	०.०२	४५०००	०	०.००	०	०	०
८२	रिङ्दीडाँडा चन्द्र बहादुरको घरसम्म मोटरबाटो	५	१	०.०२	४५०००	०	०.००	०	०	०
८३	जम्मापोखरा मोटरबाटो	५	१	०.०२	४५०००	१	०.०२	१००	४५०००	१००
८४	विधुत मर्मत सन्धिखर्क-५	५	१	०.०२	४५०००	०	०.००	०	०	०
८५	पन्लावारी ट्रस निर्माण	७	१	०.०२	४५०००	१	०.०२	१००	४५०००	१००
८६	डिहिडाँडा प्रतिकालय निर्माण	७	१	०.०२	४५०००	१	०.०२	१००	४५०००	१००
८७	काफलटारी बिचको कुलो निर्माण	७	१	०.०२	४५०००	१	०.०२	१००	४५०००	१००
८८	पर्यटन प्रवर्धन तथा सूचना	७	१	०.०२	४५०००	१	०.०२	१००	४५०००	१००
८९	साउने खोला देखि गार्मा खोलासम्म गोरेटोबाटो मर्मत	९	१	०.०२	४५०००	१	०.०२	१००	४५०००	१००
९०	अधेरी खानेपानी ट्याङ्की मर्मत	९	१	०.०२	४५०००	१	०.०२	१००	४५०००	१००
९१	चप्रुङ गोरेटो स्तरोन्नति	९	१	०.०२	४५०००	१	०.०२	१००	४५०००	१००
९२	सरस्ती बस्नेतको घर देखि मोटरबाटो सम्म गोरेटोबाटो निर्माण	११	१	०.०२	४५०००	१	०.०२	१००	४५०००	१००
९३	चौतारा पम्फिको घरमुनी घर संरक्षण कार्य	११	१	०.०२	४५०००	१	०.०२	१००	४५०००	१००
९४	वि.क. टोला खानेपानी पाइप खरिद व्यवस्थापन र पातलकटेरा नेपाली बस्तीमा गोरेटोबाटो मर्मत	११	१	०.०२	४५०००	१	०.०२	१००	४५०००	१००
९५	गंगा र रोशन वि.क.को घरमुनी घर संरक्षण कार्य	११	१	०.०२	४५०००	१	०.०२	१००	४५०००	१००
९६	पातलकटेरा नेपाली बस्तीमा गोरेटोबाटो मर्मत	११	१	०.०२	४५०००	१	०.०२	१००	४५०००	१००
९७	जोगिमारे कुमालटोला गोरेटोबाटो निर्माण	११	१	०.०२	४५०००	१	०.०२	१००	४५०००	१००
९८	मथुरा आधारभुत स्वास्थ्य केन्द्र फिल्ड स्तउन्नती	५	१	०.०२	४८०००	१	०.०२	१००	४८०००	१००
९९	आदर्श नमुनाटोलमा ट्रस संरक्षण	१	१	०.०२	५००००	१	०.०२	१००	५००००	१००
१००	पटुबाथुम पसल देखि टाकुरा जाने गोरेटोबाटो स्तरोन्नति	१	१	०.०२	५००००	१	०.०२	१००	५००००	१००
१०१	तुम्कोट काफ्लारूख गोरेटोबाटो	१	१	०.०२	५००००	०	०.००	०	०	०
१०२	प्राथमिकताका आधारमा बडाभरीका पँधेरी मर्मत	२	१	०.०२	५००००	१	०.०२	१००	५००००	१००
१०३	भद्रीखोला खा.पा.तथा चिल्लीका खा.पा. मर्मत	२	१	०.०२	५००००	०	०.००	०	०	०
१०४	मञ्जरी आधारभुत विद्यालय औसिक सामग्री खरीद	२	१	०.०२	५००००	१	०.०२	१००	५००००	१००
१०५	रून्दी लाकुरटारी सिँडी निर्माण	२	१	०.०२	५००००	१	०.०२	१००	५००००	१००
१०६	आधारभुत कम्प्युटर तालिम	३	१	०.०२	५००००	०	०.००	०	०	०
१०७	डाँडापाटा गोरेटोबाटो निर्माण तथा व्यवस्थापन	४	१	०.०२	५००००	०	०.००	०	०	०
१०८	पुङ्गु चौपारी निर्माण तथा व्यवस्थापन	४	१	०.०२	५००००	१	०.०२	१००	५००००	१००
१०९	पुखेंका खोल्सी खानेपानी	५	१	०.०२	५००००	०	०.००	०	०	०
११०	कालापाल्ला प्रतिकालय मर्मत	६	१	०.०२	५००००	१	०.०२	१००	५००००	१००
१११	अमराई मुखेटोल गोरेटोबाटो निर्माण सन्धिखर्क-६	६	१	०.०२	५००००	०	०.००	०	०	०
११२	किलारा आधारभूत विद्यालय,मा ट्वाइलेट मर्मत	८	१	०.०२	५००००	१	०.०२	१००	५००००	१००
११३	नित्यानन्द आचार्यको घरमुनि घर संरक्षण बाल निर्माण	११	१	०.०२	५००००	१	०.०२	१००	५००००	१००
११४	ढाकनडाँडा कुमाल बस्ती गोरेटोबाटो	१२	१	०.०२	५००००	१	०.०२	१००	५००००	१००
११५	जिमरथु चौपारी मर्मत	१२	१	०.०२	५००००	०	०.००	०	०	०
११६	खर्कमुनी कुमाल बस्ती गोरेटोबाटो	१२	१	०.०२	५००००	१	०.०२	१००	५००००	१००
११७	सिमलारूख देखि झेडीखोला गोरेटोबाटो	१२	१	०.०२	५००००	०	०.००	०	०	०
११८	पिताम्बर आचार्यको घरमुनि घर संरक्षण बाल र गोरेटो बाटो निर्माण	११	१	०.०२	५१०००	०	०.००	०	०	०
११९	फिरका चौर बाटुला वि.क.को घर नजिकै पहिरो नियन्त्रण	१०	१	०.०२	५४०००	१	०.०२	१००	५४०००	१००
१२०	गरिवसँग विशेषर कार्यक्रम अन्तर्गत सालडाँडामा प्रतिकालय निर्माण	५	१	०.०३	६७५००	१	०.०३	१००	६७५००	१००
१२१	कल्छेटारी डाडे पोखरी उप्रेती टोला प्रतिकालय निर्माण	७	१	०.०३	६७५००	१	०.०३	१००	६७५००	१००
१२२	दशैं घर देखि खरिखोलासम्म पदमार्ग निर्माण	७	१	०.०३	६७५००	१	०.०३	१००	६७५००	१००
१२३	ठाकुर खनालको घरदेखि नाम बहादुर भाटघरसम्म सडक स्तरोन्नति सन्धिखर्क,१	१	१	०.०३	७००००	१	०.०३	१००	७००००	१००
१२४	झिन्केडाँडा कुलबहादुर कुमालको घरदेखि शिवालय मन्दिरसम्म जाने मोटरबाटो सन्धिखर्क,१	१	१	०.०३	७००००	०	०.००	०	०	०
१२५	म्यालपोखरी प्रतिकालय पूर्णता	१	१	०.०३	७००००	१	०.०३	१००	७००००	१००
१२६	तुम्कोट सित नेपालीको घर देखि गिर बहादुरको घर सम्म गोरेटोबाटो	१	१	०.०३	७००००	१	०.०३	१००	७००००	१००
१२७	तुम्कोट होली पर्व व्यवस्थापन कार्यक्रम सन्धिखर्क, १	१	१	०.०३	७००००	१	०.०३	१००	७००००	१००
१२८	समाजकल्याण स्कुलनिको बाटो स्तरोन्नति सन्धिखर्क-१	१	१	०.०३	७००००	१	०.०३	१००	७००००	१००
१२९	बहखोर टोलको पँधेरोमा ट्रस निर्माण सन्धिखर्क,१	१	१	०.०३	७००००	०	०.००	०	०	०
१३०	सन्धिखर्क लदाम सु-समाचार चर्च व्यवस्थापन सन्धिखर्क,१	१	१	०.०३	७००००	१	०.०३	१००	७००००	१००
१३१	मोती मिश्रको घरदेखि ठाडो बाटो नाली तथा सडक स्तरोन्नति सन्धिखर्क-१	१	१	०.०३	७००००	१	०.०३	१००	७००००	१००

सि. न.	योजना/कार्यक्रमको नाम	वडा न.	वार्षिक कार्यलक्ष्य			वार्षिक भौतिक प्रगति			वार्षिक खर्च तथा प्रगति %	
			परिमाण	भार	बजेट रु.	परिमाण	भार	प्रतिशत	रकम रु.	प्रतिशत
१३२	लदाम, कमला वि.क.को आसपास बस्ती संरक्षण सन्धिखर्क,१	१	१	०.०३	७००००	१	०.०३	१००	७००००	१००
१३३	कालीमाटी बौगोखोला बाल निर्माण सन्धिखर्क,१	१	१	०.०३	७००००	१	०.०३	१००	७००००	१००
१३४	म्यालपोखरी पधेरोमा ट्रेस निर्माण सन्धिखर्क,१	१	१	०.०३	७००००	०	०.००	०	०	०
१३५	पटुबाथुम प्रतिशालय देखि बगैँचासम्म जाने बाटो स्तरोन्नति	१	१	०.०३	७००००	१	०.०३	१००	७००००	१००
१३६	गुन बहादुर चिदीमगरको घर नजिकको खोल्सीको पँधेरो निर्माण सन्धिखर्क, १	१	१	०.०३	७००००	१	०.०३	१००	७००००	१००
१३७	म्यालपोखरी शिवालय मन्दिर व्यवस्थापन सन्धिखर्क,१	१	१	०.०३	७००००	१	०.०३	१००	७००००	१००
१३८	तुम्कोट जैसिटोला अधुरो प्रतिशालय सन्धिखर्क,१	१	१	०.०३	७००००	१	०.०३	१००	७००००	१००
१३९	देउराली यातायात गुण्टी खोला असोक गहतराजको घरसम्म बाटो मर्मत सन्धिखर्क,१	१	१	०.०३	७००००	१	०.०३	१००	७००००	१००
१४०	रिपाहा गोरेटोबाटो स्तरोन्नति	१	१	०.०३	७००००	०	०.००	०	०	०
१४१	हटारी नरेन्द्र पराजुलीको घरसुनिबाट फर्स बहादुर कुमालको घरहुँदै भेटेनरी पक्की बाटोसम्म मोटरबाटो सुधार सन्धिखर्क,१	१	१	०.०३	७००००	१	०.०३	१००	७००००	१००
१४२	इन्द्र नेपाली र मनु वि.क.को घर अगाडी तटबन्ध सन्धिखर्क,२	२	१	०.०३	७००००	०	०.००	०	०	०
१४३	नारायण बहादुर खड्काको घरसम्म जानेबाटो सन्धिखर्क,२	२	१	०.०३	७००००	१	०.०३	१००	७००००	१००
१४४	राम प्रसाद भट्टराईको घरदेखि विद्युत अफिस जाने मोटरबाटो सन्धिखर्क,२	२	१	०.०३	७००००	०	०.००	०	०	०
१४५	भद्रिखोला स्थित कलबारी चर्च व्यवस्थापन सन्धिखर्क,२	२	१	०.०३	७००००	१	०.०३	१००	७००००	१००
१४६	डाँडा पिपलका रूख मुनि प्रतिशालय सन्धिखर्क,३	३	१	०.०३	७००००	१	०.०३	१००	६११५५	८७
१४७	टेक बहादुर नेपाली र छुबिलाल श्रेष्ठको घरपछाडी जोखिम ठाउँमा पर्खाल निर्माण सन्धिखर्क,३	३	१	०.०३	७००००	१	०.०३	१००	७००००	१००
१४८	सालघारी पधेरोमा अधुरो प्रतिशालय निर्माण सन्धिखर्क,३	३	१	०.०३	७००००	०	०.००	०	०	०
१४९	भद्रिखोला चुमा दमासेको घरदेखि सुकदेव पौडेलको घरसम्म ग्याविनबाल सन्धिखर्क,२	३	१	०.०३	७००००	१	०.०३	१००	७००००	१००
१५०	राजनभाटको घरमुनी जोखिम ठाउँमा पर्खाल निर्माण सपना,३	३	१	०.०३	७००००	१	०.०३	१००	७००००	१००
१५१	जीवन सुधार आधारभूत विद्यालय कम्पाउण्डबाल तथा व्यवस्थापन सन्धिखर्क,४	४	१	०.०३	७००००	०	०.००	०	०	०
१५२	हिमा नेपालीको घरमाथि बाल निर्माण सन्धिखर्क,४	४	१	०.०३	७००००	१	०.०३	१००	७००००	१००
१५३	मण्डली पोखरा स्वामीकारूख हुँदै मुखिया टोल काभ्रेसम्म मोटरबाटो स्तरोन्नति सन्धिखर्क,४	४	१	०.०३	७००००	१	०.०३	१००	७००००	१००
१५४	देउरालीडाँडा रायमाझी कुलदेवता मन्दिर निर्माण सन्धिखर्क,४	४	१	०.०३	७००००	१	०.०३	१००	७००००	१००
१५५	थामपाटामुनी कटरकारूख मन्दिर संरक्षण सन्धिखर्क,४	४	१	०.०३	७००००	०	०.००	०	०	०
१५६	देउरालीडाँडा मालिका मन्दिर सन्धिखर्क,४	४	१	०.०३	७००००	०	०.००	०	०	०
१५७	स्वास्थ्य चौकी रडरोगन सन्धिखर्क,४	४	१	०.०३	७००००	०	०.००	०	०	०
१५८	भगवती आ.वि.को सरस्वती मन्दिरको बाल व्यवस्थापन सन्धिखर्क,४	४	१	०.०३	७००००	१	०.०३	१००	७००००	१००
१५९	भगवती आधारभूत विद्यालय बालमैत्री शौचालय व्यवस्थापन सन्धिखर्क,४	४	१	०.०३	७००००	१	०.०३	१००	७००००	१००
१६०	सन्यासथुम शिव खनालको घरदेखि ओरालो पुरानो गोरेटोबाटो सन्धिखर्क,४	४	१	०.०३	७००००	१	०.०३	१००	७००००	१००
१६१	किरिया आँप गैराटोल सिडी निर्माण सन्धिखर्क,४	४	१	०.०३	७००००	१	०.०३	१००	७००००	१००
१६२	किरिया आँप पुरेनि पोखरी जाने सिडी सन्धिखर्क,४	४	१	०.०३	७००००	१	०.०३	१००	७००००	१००
१६३	काठेका गैर किरिया आँप मोटरबाटो स्तरोन्नति सन्धिखर्क,४	४	१	०.०३	७००००	१	०.०३	१००	७००००	१००
१६४	बुकिथान झाकिथान पदमार्ग निर्माण, सन्धिखर्क,४	४	१	०.०३	७००००	१	०.०३	१००	७००००	१००
१६५	भूमिकास्थान सेउलीपोखरी मोटरबाटो स्तरोन्नति सन्धिखर्क,४	४	१	०.०३	७००००	१	०.०३	१००	७००००	१००
१६६	भ्यागुतेपानी शिव मन्दिर भुईँ ढलाई सन्धिखर्क,४	४	१	०.०३	७००००	१	०.०३	१००	७००००	१००
१६७	काफ्लाखोला देउराली मन्दिर सतल निर्माण सन्धिखर्क,४	४	१	०.०३	७००००	०	०.००	०	०	०
१६८	टुनिपोखरा र माझहटिया विच ट्रेस निर्माण सन्धिखर्क,४	४	१	०.०३	७००००	१	०.०३	१००	७००००	१००
१६९	कोलगाडे कोकने आँप मोटरबाटो स्तरोन्नति सन्धिखर्क,४	४	१	०.०३	७००००	१	०.०३	१००	७००००	१००
१७०	सिउडेनी तिक्रपानी ट्रेस तथा सामुदायिक भवन मर्मत	५	१	०.०३	७००००	१	०.०३	१००	७००००	१००
१७१	तुन्सा भुसालको घरदेखि कृष्ण भुसाल, शिव अधिकारीको घरसम्म गोरेटो निर्माण सन्धिखर्क,५	५	१	०.०३	७००००	१	०.०३	१००	७००००	१००
१७२	जिम्मालटोला दिपक भुसालको घरदेखि हुमान्त धिमिरेको घर हुँदै जाने मोटरबाटो सन्धिखर्क,५	५	१	०.०३	७००००	१	०.०३	१००	७००००	१००
१७३	तिल्केपानी पँधेरादेखि बुद्धिराम अधिकारीको घरसम्म मोटरबाटो सन्धिखर्क,५	५	१	०.०३	७००००	१	०.०३	१००	७००००	१००
१७४	साम्याचौर मन्दिर कम्पाउण्ड तारजाली सन्धिखर्क,५	५	१	०.०३	७००००	१	०.०३	१००	७००००	१००
१७५	आम्बोटेदेखि खोल्टी जाने मोटरबाटो स्तरोन्नति सन्धिखर्क,५	५	१	०.०३	७००००	१	०.०३	१००	७००००	१००

सि. न.	योजना/कार्यक्रमको नाम	बडा न.	वार्षिक कार्यलक्ष्य			वार्षिक भौतिक प्रगति			वार्षिक खर्च तथा प्रगति %	
			परिमाण	भार	बजेट रु.	परिमाण	भार	प्रतिशत	रकम रु.	प्रतिशत
१७६	बदपोखरी देखि सालडाँडा हुँदै ढोरपाटन जोड्ने सडक सन्धिखर्क,५	५	१	०.०३	७००००	१	०.०३	१००	७००००	१००
१७७	साम्पाचौर तिलहरने पाटाहुँदै खोला जोड्ने मोटरबाटो सन्धिखर्क,५	५	१	०.०३	७००००	१	०.०३	१००	७००००	१००
१७८	सतिनेटादेखि गौलाशा जाने बाटोमा प्रतिभालय सन्धिखर्क,६	६	१	०.०३	७००००	१	०.०३	१००	७००००	१००
१७९	फुदवाङ्ग डाडेपोखरी उपेतटोला मोटरबाटो सन्धिखर्क,७	७	१	०.०३	७००००	१	०.०३	१००	७००००	१००
१८०	खाल आँपकारूख भर्लाकारूख मोटरबाटो सन्धिखर्क,८	८	१	०.०३	७००००	१	०.०३	१००	७००००	१००
१८१	विरौटा र जौरा खोला कुलो सन्धिखर्क,८	८	१	०.०३	७००००	१	०.०३	१००	७००००	१००
१८२	धेन्चनवास ट्रेस निर्माण सन्धिखर्क,८	८	१	०.०३	७००००	१	०.०३	१००	७००००	१००
१८३	गर्लाम राउत कुलायन मन्दिरमा ट्रेस निर्माण सन्धिखर्क,९	९	१	०.०३	७००००	१	०.०३	१००	७००००	१००
१८४	राजुपोखरी पोखेडाँडा गोरैटोबाटो सन्धिखर्क,१०	१०	१	०.०३	७००००	१	०.०३	१००	७००००	१००
१८५	खहरेका चौर ट्रेस व्यवस्थापन सन्धिखर्क,१०	१०	१	०.०३	७००००	०	०.००	०	०	०
१८६	खोलापाटा खानेपानी व्यवस्थापन सन्धिखर्क,१०	१०	१	०.०३	७००००	०	०.००	०	०	०
१८७	अधुरो ट्रेस निर्माण खहराकाचौर सन्धिखर्क,१०	१०	१	०.०३	७००००	१	०.०३	१००	७००००	१००
१८८	माझीका चौर ट्रेस निर्माण सन्धिखर्क,१०	१०	१	०.०३	७००००	०	०.००	०	०	०
१८९	ढोरपाटन सडक ठाटी देखि बाँगी खोला, रनुवा लदाम जाने सडक व्यवस्थापन सन्धिखर्क,१०	१०	१	०.०३	७००००	०	०.००	०	०	०
१९०	उपल्ला उजल्टी खरीका रूख ट्रेस निर्माण सन्धिखर्क,१०	१०	१	०.०३	७००००	०	०.००	०	०	०
१९१	डोडखोला जलजले गोरैटोबाटो सन्धिखर्क,१०	१०	१	०.०३	७००००	१	०.०३	१००	७००००	१००
१९२	राधाकृष्ण मन्दिर हल निर्माण सन्धिखर्क,११	११	१	०.०३	७००००	१	०.०३	१००	७००००	१००
१९३	भैसीथला पल्लार कोला हुँदै रोटेपानी पधराजाने गोरैटोबाटो सन्धिखर्क,११	११	१	०.०३	७००००	१	०.०३	१००	७००००	१००
१९४	जोगिमारे जि.सी. परिवार कुलदेवता मन्दिर संरक्षण सन्धिखर्क,११	११	१	०.०३	७००००	१	०.०३	१००	७००००	१००
१९५	चेत बहादुरको घरदेखि बन्जाडे टोला बिष्णु बन्जाडेको घरसम्म गोरैटोबाटो सन्धिखर्क,११	११	१	०.०३	७००००	१	०.०३	१००	७००००	१००
१९६	पाण्डेहरूको गौरो निर्माण सन्धिखर्क,११	११	१	०.०३	७००००	०	०.००	०	०	०
१९७	प्रोखा गैराको घरदेखि चुरेडाँडा जाने गोरैटो सन्धिखर्क,११	११	१	०.०३	७००००	०	०.००	०	०	०
१९८	सुजी टोला गौरो निर्माण सन्धिखर्क,११	११	१	०.०३	७००००	१	०.०३	१००	७००००	१००
१९९	खगेश्वर के.सी.को घरमुनी बाल निर्माण सन्धिखर्क,११	११	१	०.०५	१४००००	१	०.०५	१००	१४००००	१००
२००	पधरा गहने, किरियापुत्री ट्रेस र चौपारी निर्माण सन्धिखर्क,११	११	१	०.०३	७००००	०	०.००	०	०	०
२०१	रोटेपानी देखि भस्यार जाने गोरैटोबाटो सन्धिखर्क,११	११	१	०.०३	७००००	१	०.०३	१००	७००००	१००
२०२	बुढाघरेदेखि धाराटोलजाने गोरैटोबाटो स्तरोन्नति सन्धिखर्क-११	११	१	०.०३	७००००	१	०.०३	१००	७००००	१००
२०३	गाड्पोखरी ट्रेस निर्माण सन्धिखर्क,११	११	१	०.०३	७००००	०	०.००	०	०	०
२०४	जोगिमारे आधारभूत विद्यालय पुष्प बगैचा निर्माण सन्धिखर्क,११	११	१	०.०३	७००००	१	०.०३	१००	७००००	१००
२०५	रामपथ गोविन्द मुखियाको घरहुँदै पिपलनेटा जाने गोरैटोबाटो सन्धिखर्क,११	११	१	०.०३	७००००	१	०.०३	१००	७००००	१००
२०६	जोगिमारे मगरटोला पोखरी संरक्षण सन्धिखर्क,११	११	१	०.०३	७००००	१	०.०३	१००	७००००	१००
२०७	गोविन्द आचार्यको घरनिर्वाहको निर्माण गहने सन्धिखर्क-११	११	१	०.०३	७००००	१	०.०३	१००	७००००	१००
२०८	लिलाम्बरको घर र जुद्ध बहादुर पाण्डेको घरमुनि बालमा रेलिङ्ग निर्माण सन्धिखर्क,११	११	१	०.०३	७००००	०	०.००	०	०	०
२०९	काशीराम भट्टराईको घरदेखि माथिपट्टी बाल निर्माण र पल्लो जोगिमारे पोखरी संरक्षण सन्धिखर्क,११	११	१	०.०३	७००००	१	०.०३	१००	७००००	१००
२१०	बडाखोलादेखि विरौटा जाने मोटरबाटो सन्धिखर्क,११	११	१	०.०३	७००००	०	०.००	०	०	०
२११	आपाकगौरा बगैचा देखि गोकर्ण भुसालको घरसम्म गोरैटोबाटो सन्धिखर्क,११	११	१	०.०३	७००००	१	०.०३	१००	७००००	१००
२१२	गायत्रीटोला दलित बस्ती उपल्लो पधरो र कुन्जरो गोठको पधरो सन्धिखर्क,१२	१२	१	०.०३	७००००	१	०.०३	१००	७००००	१००
२१३	नरबहादुर नेपालीको घर तल गोरैटोबाटो सन्धिखर्क,१२	१२	१	०.०३	७००००	१	०.०३	१००	७००००	१००
२१४	खर्कमुनी अधुरो मन्दिर सन्धिखर्क,१२	१२	१	०.०३	७००००	०	०.००	०	०	०
२१५	चिल्याथुम ट्रेस्ट निर्माण सन्धिखर्क-१२	१२	१	०.०३	७००००	१	०.०३	१००	७००००	१००
२१६	भिमसेनथानदेखि माझघर सडक स्तरोन्नति सन्धिखर्क,१२	१२	१	०.०३	७००००	०	०.००	०	०	०
२१७	डाँडा ठुटीपिपल पदमार्ग सन्धिखर्क,१२	१२	१	०.०३	७००००	१	०.०३	१००	७००००	१००
२१८	बस्यालटोला तालडाँडा ट्रेस निर्माण सन्धिखर्क,१२	१२	१	०.०३	७००००	१	०.०३	१००	७००००	१००
२१९	सेरा जरेखोला खानेपानी सन्धिखर्क,१२	१२	१	०.०३	७००००	१	०.०३	१००	७००००	१००
२२०	मनहरपानी ट्रेस निर्माण सन्धिखर्क,१२	१२	१	०.०३	७००००	१	०.०३	१००	७००००	१००
२२१	स्थानडाँडा दुर्गा मन्दिरमा प्रतिभालय निर्माण	३	१	०.०३	७२०००	१	०.०३	१००	७२०००	१००
२२२	सिमलपानी पधरो मर्मत सुधार	१०	१	०.०३	७२०००	१	०.०३	१००	७२०००	१००
२२३	खरिखोला खानेपानी मर्मत सुधार	१०	१	०.०३	७२०००	१	०.०३	१००	७२०००	१००

सि. न.	योजना/कार्यक्रमको नाम	बडा न.	वार्षिक कार्यलक्ष्य			वार्षिक भौतिक प्रगति			वार्षिक खर्च तथा प्रगति %	
			परिमाण	भार	बजेट रु.	परिमाण	भार	प्रतिशत	रकम रु.	प्रतिशत
२२४	फुदवाङ्ग शिवालय मन्दिर शौचालय निर्माण	७	१	०.०३	७५०००	१	०.०३	१००	७५०००	१००
२२५	तल्लो लाटागौडा घाट मर्मत तथा व्यवस्थापन	७	१	०.०३	७५०००	१	०.०३	१००	७५०००	१००
२२६	नौलापानी बानडाँडा डिलापाटा गोरेटोबाटो स्तरोन्नति,	९	१	०.०३	७५०००	०	०.००	०	०	०
२२७	गोर बहादुर नेपालीको घर मुनी जोखिम ठाउँमा पर्खाल निर्माण	३	१	०.०३	७६५००	०	०.००	०	०	०
२२८	कैना खोला खा.पा मुल संरक्षण तथा झाडी सफाई	९	१	०.०३	७८८५५	०	०.००	०	०	०
२२९	मंगलबारे हाटबजार चौकमा प्रतिशालय निर्माण	१	१	०.०३	८००००	१	०.०३	१००	८००००	१००
२३०	शान्तिबगैचा तल्लोलाईन सत्कार होटल देखि तारा होटलसम्म नाली	१	१	०.०३	८००००	१	०.०३	१००	८००००	१००
२३१	बसपार्क गोपाल श्रेष्ठको घरदेखि मोहन श्रेष्ठको घर सम्म बाटो स्तरोन्नति	१	१	०.०३	८००००	१	०.०३	१००	८००००	१००
२३२	रतहले झेडीखोला देखि खनालको घर हुँदै शारदा अधिकारीको घर सम्म नाली निर्माण	१	१	०.०३	८००००	१	०.०३	१००	८००००	१००
२३३	पोखेडाँडाखहरादेखि डाँडासम्म गोरेटोबाटो स्तरोन्नति	१०	१	०.०३	८१०००	१	०.०३	१००	८१०००	१००
२३४	बाल आधारभूत विद्यालय भान्सा घरको छाना मर्मत	१	१	०.०३	८२७००	०	०.००	०	०	०
२३५	सन्तोष सोमैको घर अगाडी होमपाइप,जाली र दुम्की बेलचौर जाने बाटो स्तरोन्नति	३	१	०.०३	९००००	१	०.०३	१००	९००००	१००
२३६	कुल्यानथान पधेरापारी मो.ब स्तउन्नती	३	१	०.०३	९००००	०	०.००	०	०	०
२३७	देउरालीडाँडा प्रतिशालय तथा सत्तल निर्माण	४	१	०.०३	९००००	०	०.००	०	०	०
२३८	मन्दली पोखरा देखि डाँडा गोरेटोबाटो सुधार बिस्तार	४	१	०.०३	९००००	१	०.०३	१००	९००००	१००
२३९	खाल चिदिथार मोटरबाटो	५	१	०.०३	९००००	०	०.००	०	०	०
२४०	साविक ३ मा अधुरो सडक बत्ती जडान तथा मर्मत	९	१	०.०३	९००००	१	०.०३	१००	९००००	१००
२४१	साविक ८ मा खानेपानी, घर्तिखोर वेविको घर तर्फ जाने गोरेटोबाटो निर्माण	९	१	०.०३	९००००	०	०.००	०	०	०
२४२	साउने पानी देखि साना मैदानसम्म गोरेटोबाटो मर्मत	९	१	०.०३	९००००	०	०.००	०	०	०
२४३	रून्दी क्रियापुत्री टूसमा कोठा निर्माण तथा संरक्षण	१०	१	०.०३	९००००	१	०.०३	१००	९००००	१००
२४४	आटीघर जाने मोटरबाटो, स्कुल निर बाटो संरक्षण	१०	१	०.०३	९००००	१	०.०३	१००	९००००	१००
२४५	रानाटोला जाने घोडेटोबाटो	१०	१	०.०३	९००००	१	०.०३	१००	९००००	१००
२४६	बिहार थुम्कामुनी सिँचाई कुलो	१०	१	०.०३	९००००	१	०.०३	१००	९००००	१००
२४७	अर्लिवाङ्ग कुल्यानथान देखिसम्म हुँदै खहरासम्म गोरेटोबाटो स्तरोन्नति	१०	१	०.०३	९००००	१	०.०३	१००	९००००	१००
२४८	स्वामीकारूख उपल्ला पधेरा धाराखोला गैरा गोरेटोबाटो	१०	१	०.०३	९००००	१	०.०३	१००	९००००	१००
२४९	काक्रे-प्रतिशालय- बोरेखोला कृषि सडक स्तरोन्नति	११	१	०.०३	९००००	१	०.०३	१००	९००००	१००
२५०	स.न.पा. ११ अमिलेका २ बाटो आरन व्यवस्थापन	११	१	०.०३	९००००	१	०.०३	१००	९००००	१००
२५१	पाकुरीकारूख देखि काउलाकारूख कुडार गोरेटोबाटो	११	१	०.०३	९००००	१	०.०३	१००	९००००	१००
२५२	चोपलाल पोखेलको घरबाट पहिरे खोला स्वामीका रूख झर्ने गोरेटोबाटो	११	१	०.०३	९००००	१	०.०३	१००	९००००	१००
२५३	चौपारीको प्रतिशालयमा बाल र पुन पोखरा पोखरी निर्माण	११	१	०.०३	९००००	१	०.०३	१००	९००००	१००
२५४	प्रकास खनालको घरदेखि बराकारूख भिरकुलो जाने गोरेटोबाटो	११	१	०.०३	९००००	१	०.०३	१००	९००००	१००
२५५	लक्ष्मी आचार्यको घर मुनि घर संरक्षण बाल तथा संगम आ.वि. देखि खरिकाकारूख गोरेटोबाटो निर्माण	११	१	०.०३	९००००	०	०.००	०	०	०
२५६	छापडाँडा जाने मोटर बाटो स्तउन्नती सन्धिखर्क-३	३	१	०.०४	९४५००	०	०.००	०	०	०
२५७	सिमलपानीदेखि ढकालको घर हुँदै गन्धेगैरा जोड्ने मोटरबाटो	१०	१	०.०४	९६८००	१	०.०४	१००	८८९४६	९२
२५८	गुण्टीखोला पार्क व्यवस्थापन सन्धिखर्क, १	१	१	०.०४	१०००००	१	०.०४	१००	१०००००	१००
२५९	टुडिखेल जिल्ला हुलाक कार्यालय संरक्षण सन्धिखर्क, १	१	१	०.०४	१०००००	१	०.०४	१००	९७००९	९७
२६०	प्रवेश रेस्टुरेन्ट देखि स्नेहा व्यूटीपार्लरसम्म बाटो स्तरोन्नति	१	१	०.०४	१०००००	१	०.०४	१००	१०००००	१००
२६१	शान्ति होटल अगाडी र शान्ति बगैचा टोल विकास संस्थामा नाली स्तरोन्नति	१	१	०.०४	१०००००	१	०.०४	१००	१०००००	१००
२६२	लदाम रतहले चौकको प्रतिशालय मर्मत	१	१	०.०४	१०००००	१	०.०४	१००	१०००००	१००
२६३	रोशनको घरदेखि फर्निचरसम्म बाटो स्तरोन्नति	१	१	०.०४	१०००००	१	०.०४	१००	१०००००	१००
२६४	कान्नाबोट कालीमाटी सिँचाई कुलो मर्मत	१	१	०.०४	१०००००	१	०.०४	१००	१०००००	१००
२६५	डाँडागाउँ देखि मन्नरी स्कुल हुँदै सिरानासम्म मोटरबाटो स्तरोन्नति	२	१	०.०४	१०००००	१	०.०४	१००	१०००००	१००
२६६	शंखेटारी गेट देखि माथि बाटोसम्म सिढी निर्माण	२	१	०.०४	१०००००	१	०.०४	१००	१०००००	१००
२६७	गैरनी पँधेरीमा क्रियापुत्री टूस निर्माण	२	१	०.०४	१०००००	१	०.०४	१००	१०००००	१००
२६८	मोलीपोखरा अधुरो टूस निर्माण	५	१	०.०४	१०००००	१	०.०४	१००	१०००००	१००
२६९	तिल्केपोखरा बुद्धिराम भुवालको घरनिर बाल निर्माण सन्धिखर्क-५	५	१	०.०४	१०००००	१	०.०४	१००	१०००००	१००
२७०	भुडुभुडे अर्लादी टूस निर्माण सन्धिखर्क,५	५	१	०.०४	१०००००	१	०.०४	१००	१०००००	१००
२७१	रैनीपानी साङ्गखोला खानेपानी मर्मत	६	१	०.०४	१०००००	०	०.००	०	०	०
२७२	जौनिपोखरा प्रतिशालय निर्माण	६	१	०.०४	१०००००	१	०.०४	१००	१०००००	१००
२७३	होरनडाँडा गोरेटोबाटो निर्माण	६	१	०.०४	१०००००	१	०.०४	१००	१०००००	१००
२७४	चिदिरी र रानाटोला खानेपानी मर्मत	६	१	०.०४	१०००००	१	०.०४	१००	१०००००	१००

सि. न.	योजना/कार्यक्रमको नाम	बडा न.	वार्षिक कार्यलक्ष्य			वार्षिक भौतिक प्रगति			वार्षिक खर्च तथा प्रगति %	
			परिमाण	भार	बजेट रु.	परिमाण	भार	प्रतिशत	रकम रु.	प्रतिशत
२७५	पोखेडाँडा खेलकुद मैदान स्तरोन्नति	६	१	०.०४	१०००००	१	०.०४	१००	१०००००	१००
२७६	वरलाय हलगाडे रिबिडटोला गोरेटोबाटो निर्माण	६	१	०.०४	१०००००	०	०.००	०	०	०
२७७	भेडाबारी सार्वजनिक शौचालय निर्माण	६	१	०.०४	१०००००	१	०.०४	१००	१०००००	१००
२७८	वर्तन खोला र रानी पधेरा इन्टेक र खत्रीका टोला हुमपाइप	८	१	०.०४	१०००००	१	०.०४	१००	१०००००	१००
२७९	ऐरेनी र साउनेखोलामा हुम पाइप र सोनु आचार्यको टोलमा सिदि निर्माण	८	१	०.०४	१०००००	१	०.०४	१००	१०००००	१००
२८०	सिमलपाटा देखि मडुग्राह जोड्ने मोटरबाटो स्तरोन्नति	८	१	०.०४	१०००००	१	०.०४	१००	१०००००	१००
२८१	पल्लोखाल धर्मको घरदेखि ठाँटीसम्म मोटरबाटो स्तरोन्नति	८	१	०.०४	१०००००	१	०.०४	१००	१०००००	१००
२८२	औपका रूख देखि टाकुरसम्म मोटरबाटो र बिरौटा जाने मोटरबाटो स्तरोन्नति	८	१	०.०४	१०००००	०	०.००	०	०	०
२८३	पराजुली टोला मोटरबाटो रनेवारटोला मोटरबाटो स्तरोन्नति	८	१	०.०४	१०००००	०	०.००	०	०	०
२८४	बाझाखर्कमा नयाँ ट्रस र खोलेडाँडा अथुरो ट्रस निर्माण	८	१	०.०४	१०००००	१	०.०४	१००	१०००००	१००
२८५	छिचिमे सामुदायिक लिफ्ट खानेपानी योजना सन्धिखर्क,८	८	१	०.०४	१०००००	०	०.००	०	०	०
२८६	अर्घा भगवती मन्दिर परिसर तथा पार्किङ क्षेत्रको आसपासमा CCTV क्यामेरा जडान	९	१	०.०४	१०००००	१	०.०४	१००	९९२५९	९९
२८७	बदेल नियन्त्रण काँडे तार व्यवस्थापन	९	१	०.०४	१०००००	१	०.०४	१००	१०००००	१००
२८८	खड्का टोल भगवती मन्दिर स्केटी सन्धिखर्क,९	९	१	०.०४	१०००००	१	०.०४	१००	१०००००	१००
२८९	त्रिशुलपार्क स्तरोन्नति घोडाखोला	१०	१	०.०४	१०००००	१	०.०४	१००	१०००००	१००
२९०	भद्राचौर गोरेटोबाटो	१२	१	०.०४	१०००००	१	०.०४	१००	१०००००	१००
२९१	छाप हर्के चियान नयाँ ट्याक	१२	१	०.०४	१०००००	१	०.०४	१००	१०००००	१००
२९२	टाकुरा २ सतल मर्मत र पाण्डेखोला पँधेरो मर्मत	१२	१	०.०४	१०००००	१	०.०४	१००	१०००००	१००
२९३	कुन्जरे गायत्री टोल मोटरबाटो स्तरोन्नति	१२	१	०.०४	१०००००	१	०.०४	१००	१०००००	१००
२९४	बराड्दी झोलुङ्गे पुलदेखि सल्लिकोट जाने मोटरबाटो निर्माण सन्धिखर्क,१२	१२	१	०.०४	१०००००	०	०.००	०	०	०
२९५	आटीकापाटा सिँचाई लिफ्ट योजना सन्धिखर्क,१	१	१	०.०४	१०५०००	०	०.००	०	०	०
२९६	जिखौँदीखर्क खोला शिव मन्दिर निर्माण सन्धिखर्क,४	४	१	०.०४	१०५०००	१	०.०४	१००	१०५०००	१००
२९७	माझहटिया राधाकृष्ण मन्दिर सन्धिखर्क,४	४	१	०.०४	१०५०००	०	०.००	०	०	०
२९८	कमलनयन आधारभूत विद्यालय व्यवस्थापन तथा शैक्षिक अनुदान	४	१	०.०४	१०५०००	०	०.००	०	०	०
२९९	खरिपाटा पिडालुचौर टाकुरा मोटरबाटो सन्धिखर्क,४	४	१	०.०४	१०५०००	०	०.००	०	०	०
३००	भुमेकाथान मन्दिर व्यवस्थापन निर्माण सन्धिखर्क-४	४	१	०.०४	१०५०००	१	०.०४	१००	१०५०००	१००
३०१	रिटेखोला-आमडाँडा-मण्डली पोखरी सडक बिचमा ट्रस निर्माण सन्धिखर्क,४	४	१	०.०४	१०५०००	१	०.०४	१००	१०५०००	१००
३०२	भण्डारी पोखरी निर्माण तथा सुधार सन्धिखर्क,४	४	१	०.०४	१०५०००	०	०.००	०	०	०
३०३	जिवनोद्वार माध्यमिक विद्यालय. सिकाइ केन्द्र कार्यलय मर्मत तथा व्यवस्थापन सन्धिखर्क,५	५	१	०.०४	१०५०००	१	०.०४	१००	१०५०००	१००
३०४	जगत सुधारपाटा फलेदाका रूख बाटो स्तरोन्नति सन्धिखर्क,६	६	१	०.०४	१०५०००	१	०.०४	१००	१०५०००	१००
३०५	टिमुरे खोला नजिक तटबन्धन सन्धिखर्क,७	७	१	०.०४	१०५०००	१	०.०४	१००	१०५०००	१००
३०६	उप्रेतटोल हुँदै डिहिडाँडा नेटाजाने सडक स्तरोन्नति सन्धिखर्क,७	७	१	०.०४	१०५०००	१	०.०४	१००	१०५०००	१००
३०७	गुरासिनी बुढाघर मोटरबाटो सन्धिखर्क-७	७	१	०.०४	१०५०००	१	०.०४	१००	१०५०००	१००
३०८	गाँजरी मेनबाटो देखि बन्जाडे टोल, मगरटोल जाने बाटो स्तरोन्नति सन्धिखर्क,८	८	१	०.०४	१०५०००	१	०.०४	१००	१०५०००	१००
३०९	थामकाचौर उपल्लार सडक स्तउन्नती सन्धिखर्क,८	८	१	०.०४	१०५०००	०	०.००	०	०	०
३१०	गाँजरी पलासपाटा खेल मैदान स्तरोन्नति सन्धिखर्क,८	८	१	०.०४	१०५०००	१	०.०४	१००	१०५०००	१००
३११	गोपाल परियारको घरमुनि पैरो रोकथाम सन्धिखर्क,८	८	१	०.०४	१०५०००	१	०.०४	१००	१०५०००	१००
३१२	शिवालय मन्दिरदेखि दारिम खोला सडक स्तरोन्नति सन्धिखर्क,८	८	१	०.०४	१०५०००	१	०.०४	१००	१०५०००	१००
३१३	साउने खोला हुमपाइप र ग्याविन वाल सन्धिखर्क,९	९	१	०.०४	१०५०००	१	०.०४	१००	१०५०००	१००
३१४	आचार्य परिवार अलिबाड ढाकाचिना माथि पुरानो मन्दिरमा ट्रस निर्माण सन्धिखर्क,१०	१०	१	०.०४	१०५०००	१	०.०४	१००	१०५०००	१००
३१५	काँडाखोलादेखि सिम्लाकारूखसम्म कृषि सडक सन्धिखर्क,१०	१०	१	०.०४	१०५०००	१	०.०४	१००	१०५०००	१००
३१६	गहते विष्णु बहादुर शाहको घर नजिकको बाल निर्माण सन्धिखर्क,११	११	१	०.०४	१०५०००	१	०.०४	१००	१०५०००	१००
३१७	बिहार कविता पक्की सडकदेखि हेमनाथ मरासिनीको घरहुँदै रनुवा जाने गोरेटोबाटो सन्धिखर्क,११	११	१	०.०४	१०५०००	१	०.०४	१००	१०५०००	१००
३१८	जाविनथुम पोखरी स्तरोन्नति सन्धिखर्क,११	११	१	०.०४	१०५०००	१	०.०४	१००	१०५०००	१००
३१९	पुरनपोखरा पोखरीमा रेलिड निर्माण र नयरचौर गोरेटोबाटो स्तरउन्नती सन्धिखर्क,११	११	१	०.०४	१०५०००	०	०.००	०	०	०

सि. न.	योजना/कार्यक्रमको नाम	बडा न.	वार्षिक कार्यलक्ष्य			वार्षिक भौतिक प्रगति			वार्षिक खर्च तथा प्रगति %	
			परिमाण	भार	बजेट रु.	परिमाण	भार	प्रतिशत	रकम रु.	प्रतिशत
३२०	विद्या प्रकाश आ.वि. देखि इन्द्रबहादुर क्षेत्रीको घरसम्म गोरेटोबाटो निर्माण सन्धिखर्क,११	११	१	०.०४	१०५०००	१	०.०४	१००	१०५०००	१००
३२१	पिताम्बर आचार्यको घरमुनि घर संरक्षण बाल निर्माण सन्धिखर्क,११	११	१	०.०४	१०५०००	१	०.०४	१००	१०५०००	१००
३२२	हरि उँठ भजन कृतन समूह वाद्यवादन तथा पोसाक सन्धिखर्क,११	११	१	०.०४	१०५०००	०	०.००	०	०	०
३२३	कविरा सिमलका रूख जुँरे ढुङ्गा कुलो मर्मत सन्धिखर्क,११	११	१	०.०४	१०५०००	१	०.०४	१००	१०५०००	१००
३२४	हड दामकीला खानेपानी मुल संरक्षण तथा पाइप सन्धिखर्क,११	११	१	०.०४	१०५०००	१	०.०४	१००	१०५०००	१००
३२५	भद्राचौर लामापोखरा ट्रस निर्माण सन्धिखर्क,१२	१२	१	०.०४	१०५०००	१	०.०४	१००	१०५०००	१००
३२६	सल्लिकोट मनरपानी मोटरबाटो स्तरोन्नति सन्धिखर्क,१२	१२	१	०.०४	१०५०००	१	०.०४	१००	१०५०००	१००
३२७	चुदालीटोला ट्रस निर्माण सन्धिखर्क-१२	१२	१	०.०४	१०५०००	१	०.०४	१००	१०५०००	१००
३२८	जिल्ला अस्पताल गेट देखि राम प्रसादको घर हुँदै जगत आचार्यको घरसम्म नाली निर्माण सन्धिखर्क,१	१	१	०.०४	११००००	०	०.००	०	०	०
३२९	सरस्वती आधारभूत विद्यालय व्यवस्थापन तथा शैक्षिक अनुदान	४	१	०.०४	११५०००	१	०.०४	१००	१५००००	१३०
३३०	भगवती आधारभूत विद्यालय व्यवस्थापन तथा शैक्षिक अनुदान	४	१	०.०४	११५०००	०	०.००	०	०	०
३३१	टुनिपोखरा आधारभूत विद्यालय व्यवस्थापन तथा शैक्षिक अनुदान	४	१	०.०४	११५०००	०	०.००	०	०	०
३३२	गंगा आधारभूत विद्यालय शैक्षिक अनुदान र गंगा आधारभूत विद्यालय फिन्ड मर्मत	२	१	०.०५	१२००००	१	०.०५	१००	१२००००	१००
३३३	सानागाउँ ठाडाखोला खा.पा. मर्मत तथा सिरनामुनी पेंधरा ट्रस निर्माण	२	१	०.०५	१२५०००	१	०.०५	१००	१२५०००	१००
३३४	गहते लामडाँडा एवम अन्य मोटरबाटो स्तरोन्नति	४	१	०.०५	१२५०००	०	०.००	०	०	०
३३५	पौदिखोला सिँदि निर्माण	६	१	०.०५	१२५०००	०	०.००	०	०	०
३३६	पोखेडाँडा थामपाटादेखि बाटुनीसम्म अथुरो बाटो पूर्णता सन्धिखर्क,१०	१०	१	०.०५	१२५०००	१	०.०५	१००	१२५०००	१००
३३७	युवा विशेष कार्यक्रम (भलिबल तथा क्रिकेट ७०+६०)	१०	१	०.०५	१३००००	१	०.०५	१००	१३००००	१००
३३८	हाडफोर्ने सुपादेउराली मन्दिर निर्माण	११	१	०.०५	१३००००	०	०.००	०	०	०
३३९	सोमैको घर जाने बाटो स्तरोन्नति, खेलमैदान र थापा टोल जाने मोटरबाटो स्तरोन्नति	३	१	०.०५	१३५०००	१	०.०५	१००	१३५०००	१००
३४०	अथुरो रैनादेवि मन्दिर निर्माण तथा सेराभिवस भवनमा कोठा निर्माण	५	१	०.०५	१३५०००	०	०.००	०	०	०
३४१	भगवती आधारभूत विद्यालय जाने बाटोमा बाल तथा रेलिङ्ग र नेपाली टोल जाने बाटोमा ढल निर्माण	७	१	०.०५	१३५०००	१	०.०५	१००	१३५०००	१००
३४२	थापाडाँडा पिप्लारूख अथुरो मन्दिर निर्माण	१०	१	०.०५	१३५०००	१	०.०५	१००	१३५०००	१००
३४३	गुनबहादुर नेपालीको घरमुनीबाट कुडुलेजाने बाटो स्तरोन्नति सन्धिखर्क,१	१	१	०.०५	१४००००	१	०.०३	५०	०	०
३४४	भडखरी निर्मलाको घरदेखि पुष्पा भुसालको घर जोड्ने सडक निर्माण सन्धिखर्क,१	१	१	०.०५	१४००००	१	०.०५	१००	१४००००	१००
३४५	च्यानडाँडा कवरस्थान संरक्षण सन्धिखर्क, १	१	१	०.०५	१४००००	१	०.०५	१००	१४००००	१००
३४६	बाल मन्दिर तारबार र कम्पाउण्ड बाल सन्धिखर्क, १	१	१	०.०५	१४००००	१	०.०५	१००	१४००००	१००
३४७	फडेन पधेरा जाने सडक मर्मत र किरियापुत्री भवन ट्रस निर्माण सन्धिखर्क,१	१	१	०.०५	१४००००	१	०.०५	१००	१४००००	१००
३४८	ओमशान्ती इधरीय विज्ञविद्यालयको व्यवस्थापन सन्धिखर्क, १	१	१	०.०५	१४००००	१	०.०५	१००	१४००००	१००
३४९	कृष्ण कुँवरको घर पछाडी अगाडिको सडक स्तरोन्नति सन्धिखर्क,१	१	१	०.०५	१४००००	१	०.०५	१००	१४००००	१००
३५०	दुर्गा भगवती मन्दिर पटुवाथुप मन्दिर व्यवस्थापन सन्धिखर्क, १	१	१	०.०५	१४००००	१	०.०५	१००	१४००००	१००
३५१	देउरालीडाँडा रेखा खड्का टोलमा सडक बत्ती जडान सन्धिखर्क-४	४	१	०.०५	१४००००	०	०.००	०	०	०
३५२	मालिका मन्दिर बाउण्डी निर्माण सन्धिखर्क,५	५	१	०.०५	१४००००	१	०.०५	१००	१४००००	१००
३५३	चिदिखोरिया मुहान संरक्षण सन्धिखर्क,६	६	१	०.०५	१४००००	१	०.०५	१००	१४००००	१००
३५४	ढाडखोला विश्रामस्थल निर्माण सन्धिखर्क,६	६	१	०.०५	१४००००	१	०.०५	१००	१४००००	१००
३५५	गहतेडाँडा मर्काखोला मोटरबाटो स्तरोन्नति तथा ट्रस निर्माण सन्धिखर्क,७	७	१	०.०५	१४००००	१	०.०५	१००	१४००००	१००
३५६	खौचीमैदान करचापे मोटरबाटो सन्धिखर्क,७	७	१	०.०५	१४००००	१	०.०५	१००	१४००००	१००
३५७	गच्छे दुवार मूलबाटोदेखि माझगाउँ सन्तबहादुर खत्रीको घरजानेबाटो स्तरोन्नति सन्धिखर्क,७	७	१	०.०५	१४००००	१	०.०५	१००	१४००००	१००
३५८	रिठिपोखरी शिवालय मन्दिर र भगवती मन्दिर स्तउन्ती सन्धिखर्क,१०	१०	१	०.०५	१४००००	०	०.००	०	०	०
३५९	पाँकुरीका रूख र काउलाकारूख अमिले हाडफोर्ने बुद्धि बहादुरको पसल माथी मोटरबाटो र हाडफोर्ने इन्द्राचौर सडक स्तरोन्नति सन्धिखर्क,११	११	१	०.०५	१४००००	१	०.०५	१००	१३२५५५	९५
३६०	बराहदी झोलुङ्गे पुलको सन्धिखर्क,११ मा प्रतिशालय निर्माण सन्धिखर्क,११	११	१	०.०५	१४००००	०	०.००	०	०	०
३६१	मद्राचौर गोरेटोबाटो ढलान सन्धिखर्क,१२	१२	१	०.०५	१४००००	१	०.०५	१००	१४००००	१००
३६२	झाप भिमसेनमन्दिर स्तरोन्नति सन्धिखर्क,१२	१२	१	०.०५	१४००००	१	०.०५	१००	१४००००	१००
३६३	सल्लिकोट पोखराचौर मनरपानी काब्रारूख मोटरबाटो सन्धिखर्क,१२	१२	१	०.०५	१४००००	१	०.०५	१००	१४००००	१००
३६४	जोगीमारे इबिन्द्र घतिमगरको घरहुँदै सिरान गैरा मोटरबाटो निर्माण सनपा-११	११	१	०.०५	१४२२००	१	०.०५	१००	१४१७०५	१००

सि. न.	योजना/कार्यक्रमको नाम	वडा न.	वार्षिक कार्यलक्ष्य			वार्षिक भौतिक प्रगति			वार्षिक खर्च तथा प्रगति %	
			परिमाण	भार	बजेट रु.	परिमाण	भार	प्रतिशत	रकम रु.	प्रतिशत
३६५	हललाईन NIC Asia बैक पञ्जाडी ठाडो बाटो सन्धिखर्क,१	१	१	०.०६	१५००००	१	०.०६	१००	१५००००	१००
३६६	नारायण पौडेल र विर बहादुरको घर निर सपोर्ट वाल तथा चौतारदेखि टाकुरा खानेपानी टङ्की सम्म मोटरबाटो निर्माण	२	१	०.०६	१५००००	१	०.०६	१००	१५००००	१००
३६७	बाई कार्यालय र CT Tower पुष्प बगैँचा निर्माण सन्धिखर्क,२	२	१	०.०६	१५००००	१	०.०६	१००	१५००००	१००
३६८	फलेपाटा प्रतिशालय निर्माण सन्धिखर्क,६	६	१	०.०६	१५००००	१	०.०६	१००	०	०
३६९	डाँडाका चौरदेखि भद्रिखोला जोड्ने मोटरबाटो नयाँ	८	१	०.०६	१५००००	१	०.०६	१००	१४५१२९	९७
३७०	राजुपानी देखि अर्घा भगवती मन्दिरसम्म पर्यटन पूर्वाधार निर्माण	९	१	०.०६	१५००००	१	०.०६	१००	१५००००	१००
३७१	हरि प्रसादको घरको डोहा देखि धनेश्वर भुसालको घर सम्म जाने बाटो व्यवस्थापन सन्धिखर्क,१०	१०	१	०.०६	१५००००	१	०.०६	१००	१५००००	१००
३७२	भूमेकाथान शिवालय मन्दिर निर्माण सन्धिखर्क,४	४	१	०.०७	१७५०००	०	०.००	०	०	०
३७३	भेडाबारी चौडिला चिदेरी सडक स्तरोन्नति सन्धिखर्क,६	६	१	०.०७	१७५०००	१	०.०७	१००	१७५०००	१००
३७४	विहार ठाटीपरी ढोरपाटन सडक किनारामा क्रियापुत्री ट्रस निर्माण सन्धिखर्क,१०	१०	१	०.०७	१७५०००	०	०.००	०	०	०
३७५	छाप गुँरासे मोटरबाटो स्तरोन्नति सन्धिखर्क,१२	१२	१	०.०७	१७५०००	०	०.००	०	०	०
३७६	अधुरो खोप केन्द्र सम्पन्न सन्धिखर्क, १	१	१	०.०८	२०००००	१	०.०८	१००	२०००००	१००
३७७	मिश्र हार्डवेयरदेखि सुनिता वस्नेतको घरसम्म सडक स्तरोन्नति सन्धिखर्क,१	१	१	०.०८	२०००००	१	०.०८	१००	२०००००	१००
३७८	स.न.पा. २ का कच्ची बाटाहरू मर्मत सम्भार तथा स्तरोन्नति	२	१	०.०८	२०००००	१	०.०८	१००	२०००००	१००
३७९	राजुपानी देखि पात्रावाङ्गसम्म पाइप रेलिङ्ग निर्माण सन्धिखर्क,९	९	१	०.०८	२०००००	१	०.०८	१००	२०००००	१००
३८०	डम्पिङ साइड गेट मर्मत	१	१	०.०८	२०७०००	१	०.०८	१००	१९९९०३	९७
३८१	निर्मल नवज्योती सुस्तमनस्थिती फर्निचर तथा तारवार सन्धिखर्क, १	१	१	०.०८	२१००००	०	०.००	०	०	०
३८२	अलुवाखोला देखि पुरीटोलसम्म सिँडी निर्माण सन्धिखर्क,३	३	१	०.०८	२१००००	०	०.००	०	०	०
३८३	गौशाला घाँस तथा दाना व्यवस्थापन सन्धिखर्क,६	६	१	०.०८	२१००००	१	०.०८	१००	२१००००	१००
३८४	बहखोर पिपलकाबोट प्रतिशालय र फिल्ड निर्माण सन्धिखर्क,६	६	१	०.०८	२१००००	०	०.००	०	०	०
३८५	बागमारा पँधेरामाथि पिपलडाँडा मोटरबाटो स्तरोन्नति सन्धिखर्क,७	७	१	०.०८	२१००००	०	०.००	०	०	०
३८६	इनारको प्रतिशालय निरको सिडी निर्माण तथा खानेपानी टङ्की व्यवस्थापन सन्धिखर्क,१०	१०	१	०.०८	२१००००	१	०.०८	१००	२१००००	१००
३८७	कुडहर काफ्लारुख गोरेटोबाटो मर्मत तथा स्तरउन्नति	११	१	०.०८	२१००००	०	०.००	०	०	०
३८८	सल्लिकोट बराडडी सामुदायिक लिफ्ट खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाई योजना मर्मत सन्धिखर्क-१२	१२	१	०.०८	२२००००	०	०.००	०	०	०
३८९	बेलघारटोलमा टङ्की निर्माण तथा बन्जाडे टोलको सेरोफेरोमा हिलटङ्की अनुदान	२	१	०.०९	२२५०००	१	०.०९	१००	२२५०००	१००
३९०	वडा भित्रका खानेपानी योजना मर्मत तथा पाईप खरिद	७	१	०.०९	२२५०००	०	०.००	०	०	०
३९१	स न पा १ उज्यालो सन्धिखर्क	१	१	०.०९	२३००००	०	०.००	०	०	०
३९२	विहार थुम्पा पुरानो बजारको गल्ली स्तरोन्नति सन्धिखर्क,१०	९	१	०.०९	२४५०००	१	०.०९	१००	२४५०००	१००
३९३	ज्ञानप्रकाश माध्यमिक विद्यालय सल्लिकोट पूर्वाधार निर्माण सन्धिखर्क,१२	१२	१	०.०९	२४५०००	१	०.०९	१००	२४५०००	१००
३९४	दिगो विकासशिल युवाक्लव सामुदायिक भवन सन्धिखर्क,५	५	१	०.१०	२५००००	१	०.१०	१००	२५००००	१००
३९५	सडक लाईट विस्तार कार्यक्रम	१०	१	०.११	२७५०००	०	०.००	०	०	०
३९६	झेडी नारायण श्रेष्ठको घरदेखि भद्राचौर हुँदै आफ्रजाने सडक सन्धिखर्क,१२	१२	१	०.११	२८००००	१	०.११	१००	२८००००	१००
३९७	स.न.पा. १ का कच्ची बाटाहरू मर्मत सम्भार तथा स्तरोन्नति	१	१	०.११	३०००००	१	०.११	१००	२७३३१४	९१
३९८	पतञ्जलि योग समिति नेपाल अर्घाखाँची विभिन्न योग शिविर सञ्चालन	१	१	०.११	३०००००	०	०.००	०	०	०
३९९	पार्वती आधारभूत विद्यालय भवन प्लाष्टर तथा रँडरोपन सन्धिखर्क, १	१	१	०.११	३०००००	१	०.११	१००	३०००००	१००
४००	मेनलाईन प्रभु बैक देखि उपल्लो लाईन निस्कने ठाडो बाटोसम्म नाली निर्माण सन्धिखर्क,१	१	१	०.११	३०००००	१	०.११	१००	३०००००	१००
४०१	सन्धिखर्क-४ का सम्पूर्ण मोटरबाटोहरू मर्मत सम्भार तथा स्तरोन्नति	४	१	०.११	३०००००	१	०.११	१००	३०००००	१००
४०२	सन्धिखर्क-९ का सम्पूर्ण मोटरबाटो मर्मत सम्भार तथा स्तरोन्नति	९	१	०.११	३०००००	१	०.११	१००	२७४२०९	९१
४०३	स.न.पा.३ का कच्ची बाटाहरू मर्मत सम्भार तथा स्तरोन्नति	३	१	०.१३	३५००००	१	०.१३	१००	३२१९५६	९२
४०४	चौतारीपाटा लुतेबारी खानेपानी मर्मत तथा टङ्की निर्माण सन्धिखर्क,५	५	१	०.१३	३५००००	१	०.१३	१००	३५००००	१००
४०५	साना बराप बाटो निर्माण सन्धिखर्क-१०	१०	१	०.१३	३५००००	१	०.१३	१००	३५००००	१००
४०६	जैरामसेरा ठाटी निर सिँचाइ कुलो मर्मत	१०	१	०.१३	३५००००	०	०.००	०	०	०
४०७	बाघमारा कालेका रूख मोटरबाटो स्तरोन्नति सन्धिखर्क,७	७	१	०.१६	४२००००	१	०.१६	१००	४२००००	१००
४०८	सन्धिखर्क-१० का सम्पूर्ण मोटरबाटोहरू मर्मत सम्भार तथा स्तरोन्नति	१०	१	०.१७	४५००००	१	०.१७	१००	४११६३२	९२
४०९	विजय मा.वि. पार्किङ स्थल र प्रवेद्वार स्तरोन्नति सन्धिखर्क,११	११	१	०.१९	४९००००	१	०.१९	१००	४९००००	१००
४१०	तारामार्गको नाली पूर्णता र पचासे टोलमा नाली निर्माण	१	१	०.१९	५०००००	१	०.१९	१००	५०००००	१००
४११	तुम्केट फेदीदेखि बाँगी खोलासम्म नाली निर्माण	१	१	०.१९	५०००००	१	०.१९	१००	५०००००	१००

सि. न.	योजना/कार्यक्रमको नाम	बडा न.	वार्षिक कार्यलक्ष्य			वार्षिक भौतिक प्रगति			वार्षिक खर्च तथा प्रगति %	
			परिमाण	भार	बजेट रु.	परिमाण	भार	प्रतिशत	रकम रु.	प्रतिशत
४१२	निर्माणधिन भिमसेन मन्दिर सन्धिखर्क,२	२	१	०.१९	५०००००	१	०.१९	१००	४८५०८३	९७
४१३	बागी खोला पक्की पुल माथि मनकामना मन्दिर निर्माण सन्धिखर्क,२	२	१	०.१९	५०००००	१	०.१९	१००	५०००००	१००
४१४	स्यानडाँडा जाने गोरैटोबाटो, शिवालय मन्दिर पहिरो व्यवस्थापन र कुल्यानथान बाल निर्माण	३	१	०.१९	५०००००	१	०.१९	१००	५०००००	१००
४१५	दोरपाटनबाट छापडाँडा जाने बाटो ढलान	३	१	०.१९	५०००००	१	०.१९	१००	४९७४८५	९९
४१६	माझहटिया कवर्डहल जलुके पँधेरो नाङ्गेठाटी मोटरबाटो तथा गोरैटोबाटो, सिँडी तारजाली शौचालय निर्माण	४	१	०.१९	५०००००	१	०.१९	१००	५०००००	१००
४१७	छाप मोटरबाटो, भगवती आधारभूत विद्यालय, टुनिपोखरा आधारभूत विद्यालय, सभाहल बस्नेत टोल माझहरा कसुमडाडा कोलेआप कन्दारटोल ढलाई सिँडी निर्माण शौचालय रेलिङ्ग प्लाष्टर	४	१	०.१९	५०००००	१	०.१९	१००	५०००००	१००
४१८	सालडाँडा टूस निर्माण र बलेबाड माझगाँउ चौपारी टूस, पोखरी, आम्बोट तथा बाटो निर्माण	५	१	०.१९	५०००००	१	०.१९	१००	५०००००	१००
४१९	कलाधरको घरदेखि बाटो ढलान, बाल निर्माण र टुलसारे पोखरी आरनहुँदै अर्लादी भल संरक्षण र बाटो छेकवार र मालिका पोखरी निर्माण	५	१	०.१९	५०००००	१	०.१९	१००	५०००००	१००
४२०	चिदिखोरिया, दमार, बन्दारटोला, मजुवाटारी, खा.पा. हडाहाघाट खा.पा. तथा राट्टारी जुकेखोला पोखरी प्रतिशालय निर्माण तथा स्तरोन्नती	६	१	०.१९	५०००००	१	०.१९	१००	५०००००	१००
४२१	नेटाकापोखरा दमार र पौदिखोला बहखोर स्वामीकारूख बहखोर घाटखोला मोटरबाटो स्तरोन्नति	६	१	०.१९	५०००००	१	०.१९	१००	४९७०४९	९९
४२२	जनशान्ति आधारभूत विद्यालय जाने बाटोमा ढलान थापाटोला जाने बाटोमा ढलान, भेडिखोरा टङ्की निर्माण, सिता शाहीको घरमाथि मोटरबाटोमा बाल निर्माण, जनता कृष्ण माध्यमिक विद्यालयको खेलमैदानमा तारजाली	८	१	०.१९	५०००००	१	०.१९	१००	५०००००	१००
४२३	शिवनेटा मसानघाट अपुरो सिँडी लाईट र आँपखोला मसानघाट व्यवस्थापन र किमडाँडा परियारटोला बाल निर्माण र गुनाथुम जाने अधुरो सिँडी	८	१	०.१९	५०००००	१	०.१९	१००	४५७९००	९२
४२४	भगवती मन्दिरदेखि पाटशालासम्म पर्यटन पूर्वाधार टूस तथा रेलिङ्ग निर्माण	९	१	०.१९	५०००००	१	०.१९	१००	४६७०७२	९३
४२५	टारी टूस, खोपडाँडा तारबार, गर्लाम फलेपत खा.पा. र पार्क स्तरोन्नति, हुलाक स्तरोन्नति	९	१	०.१९	५०००००	१	०.१९	१००	४४५१५८	८९
४२६	बाँसडाँडा उचल्दी टूस क्रोकलसारे पानी टङ्की, खरिखोला गोरैटोबाटो	१०	१	०.१९	५०००००	१	०.१९	१००	४९९२७७	१००
४२७	धनुबाँस रूख पोखरी, अरनिको आधारभूत विद्यालय गेट मर्मत, धाराखोला सिराना पँधेरो, हरठाणा अधुरो बाल, वराप मोटरबाटो	१०	१	०.१९	५०००००	१	०.१९	१००	५०००००	१००
४२८	रोहोटेपानी मोटरबाटो देखि भैसिथला टाकुराजाने मोटरबाटोसम्म गोरैटोबाटो मर्मत, ओखार आचार्य र बस्यालटोल पल्लार जाने गोरैटोबाटो र भैसिथला तथा ओखार गोरैटोबाटो मर्मत तथा स्तरोन्नति	११	१	०.१९	५०००००	१	०.१९	१००	४८१९२०	९६
४२९	हडाहाटी कात्रारूख र जिमिरौरा टुलार गो.बा., चिपचिपे मोटरबाटोदेखि पूर्ण बहादुर खत्रीको घरसम्म जाने गोरैटोबाटो, डाडा जाने गोरैटोबाटो मर्मत, सरस्वती आचार्यको घरमाथि गोरैटोबाटो मर्मत तथा स्तरोन्नति अमिले जोगीमारे	११	१	०.१९	५०००००	१	०.१९	१००	४९१९०९	९८
४३०	स.न.पा.-१२ का सम्पूर्ण मोटरबाटोहरू मर्मतसम्भार तथा स्तरोन्नति	१२	१	०.१९	५०००००	१	०.१९	१००	४६५०७४	९३
४३१	स्वास्थ्य भवन मर्मत तथा बडा कार्यालयमा टूस निर्माण	१२	१	०.१९	५०००००	१	०.१९	१००	४८९४१५	९८
४३२	स.न.पा.७ भित्रका सम्पूर्ण मोटरबाटो मर्मत सम्भार तथा स्तरोन्नति	७	१	०.२३	६०००००	१	०.२३	१००	५५४८६४	९२
४३३	सन्धिखर्क-५ का सम्पूर्ण मोटरबाटोहरू मर्मत सम्भार तथा स्तरोन्नति	५	१	०.२५	६५००००	१	०.२५	१००	५३१४१०	८२
४३४	माझको कुलो दारिमखोला कुलो बिरौटा खोला जौराखोला कुलो र चिदिखोला देखि गाजरी खोला कुलो निर्माण	८	१	०.२७	७०००००	१	०.२७	१००	७०००००	१००
४३५	सन्धिखर्क-११ का सम्पूर्ण मोटरबाटोहरू मर्मत सम्भार तथा स्तरोन्नति	११	१	०.२७	७०००००	१	०.२७	१००	५५७८९७	८०
४३६	स.न.पा. ८ का सम्पूर्ण मोटरबाटो मर्मत सम्भार तथा स्तरोन्नति	८	१	०.३१	८०००००	१	०.३१	१००	६४५३७२	८१
४३७	सन्धिखर्क-६ का सम्पूर्ण मोटरबाटो मर्मत संभार तथा स्तरोन्नति	६	१	०.३४	९०००००	१	०.३४	१००	८२८६२८	९२
४३८	शान्तिटोल मोटरबाटो स्तरोन्नति तथा छाप टूस निर्माण र टूलापोखरादेखि भूमिकास्थान जाने मोटरबाटो स्तरोन्नति	१२	१	०.३४	९०००००	१	०.३४	१००	९०००००	१००
४३९	सानागाउँ गहतेडाँडा मोटरबाटो स्तरोन्नति	७	१	०.३८	१००००००	१	०.३८	१००	१००००००	१००
४४०	बेलखोला तटबन्धन, उद्यमशिल नयाँ बजार जोड्ने पुल, सिटी टावर परिसर स्तरोन्नति, बेलघार सिँडी तथा नाली, प्युँडालुपाटा फिल्ड टङ्की निर्माण, सुनारटोलको पँधेरो मर्मत र जनज्योती घुम्टि ओरालो मोटरबाटो स्तरोन्नति	२	१	०.५४	१४०००००	१	०.५४	१००	१३८६९५९	९९
४४१	बलेबाड पिक्निक स्पार्ट	५	१	०.५७	१५०००००	१	०.५७	१००	१४०००००	९३
४४२	पानी फ्याट्टी नजिक र मसाल बजार फड्के टूस वृज निर्माण	०	१	०.१३	३५००००	१	०.१३	१००	३३८९६७	९७

सि. न.	योजना/कार्यक्रमको नाम	बडा न.	वार्षिक कार्यलक्ष्य			वार्षिक भौतिक प्रगति			वार्षिक खर्च तथा प्रगति %	
			परिमाण	भार	बजेट रु.	परिमाण	भार	प्रतिशत	रकम रु.	प्रतिशत
४४३	डम्पिङ साइड गेट मर्मत	१	१	०.०८	२०६०००	१	०.०८	१००	१९९९०३	९७
४४४	जेरामसरा ठाटी निर सिंचाइ कुलो मर्मत सनपा-१०	१०	१	०.१३	३५००००	१	०.१३	१००	०	०
४४५	सनपा-१ वस पार्क मुनिको भेन बाटोको नाली स्तरोन्नति	१	१	०.०३	८००००	१	०.०३	१००	०	०
४४६	बडा नं. १ मोडर्नटाउन र सन्धिखर्क प्रिन इङ्गलिस बोर्डिङ स्कुल बडा नं. २ जोड्ने फलामे पुल निर्माण		१	०.०८	२०००००	१	०.०८	१००	०	०
४४७	भगवती आधारभूत विद्यालयको बाल निर्माण सनपा-४		१	०.०४	१०००००	१	०.०४	१००	०	०
४४८	छन्द बहादुर श्रेष्ठको घरदेखि नारायण श्रेष्ठको घरसम्म ढलान कार्या सनपा १२		१	०.०४	१०००००	१	०.०४	१००	०	०
४४९	खाल शहरनेटना टोलमा खानेपानी मिटर जडान सनपा ८		१	०.०२	५००००	१	०.०२	१००	०	०
४५०	आदर्शटोल हेमराजको घर अगाडी नाली निर्माण सनपा २		१	०.०२	६००००	१	०.०२	१००	०	०
४५१	रामपतटारीको मोटरबाटोनेर भाजलय तिरको भल नियन्त्रण सनपा ११		१	०.०२	५००००	१	०.०२	१००	०	०
४५२	भवन मर्मत नगरपालिका र बडा नं.१ र २		१	०.२७	७०००००	१	०.२७	१००	०	०
४५३	गहते पिपलनेटा लिफ्ट खानेपानी व्यवस्थापन सनपा ४		१	०.०४	१०००००	१	०.०४	१००	०	०
	कुल जम्मा		१००		२६१११६१०४		७८	७८	१४५२१८६७५	५६

भौतिक प्रगति प्रतिशत

७८

वित्तीय प्रगति प्रतिशत

५६

तेस्रो त्रैमासिक सम्मको प्रगति समीक्षा आ.व. २०८२ । ०८३

मिति: २०८३ । ०१ । ३१ गते

बिहान ११:०० बजे

शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखा

प्रस्तोता
मञ्जु आचार्य
शिक्षा अधिकृत

त्रैमासिक प्रगति २०८२ । ८३ श्रावण देखि चैत्रसम्म

- शिक्षकहरूको आ.व.२०८१।८२ को सम्पति विवरण दर्ता गरी शिक्षक किताबखाना पठाइएको,
- शैक्षिक सत्र २०८२ को स्थायी शिक्षकहरूको बार्षिक तलबी प्रतिवेदन राष्ट्रिय किताबखाना शिक्षकबाट पारित गराइएको,
- विद्यार्थी प्रतिभा प्रष्फुटन कार्यक्रम अन्तर्गत माध्यमिक तहस्तरीय वक्तृत्वकला प्रतियोगिता सम्पन्न भएको

क्रमशः

- आधारभूत तहमा अध्यानरत शिक्षकहरूका लागि सूचना प्रविधिमा आधारित कार्यशाला सम्पन्न(५ दिन)
- आधारभूत तह (कक्षा १-३) मा अध्यापनरत शिक्षकहरूका लागि एकीकृत पाठ्यक्रम सम्बन्धी कष्टमाइज्ड तालिम २०८३।१।१४-१६ सम्म सञ्चालन गरिएको
- आधारभूत तह कक्षा ३ र ५ को उपलब्धी परीक्षा सञ्चालन, उत्तरपुस्तिका परीक्षण र नतिजा विश्लेषणको कार्य सम्पन्न

क्रमशः

- आधारभूत तह उत्तीर्ण परीक्षा कक्षा-द २०८२ को परीक्षा सञ्चालन परीक्षण र नतिजा विश्लेषणको कार्य सम्पन्न भएको
- त्रैमासिक प्रधानाध्यापक बैठक तथा नतिजा समीक्षा गरिएको कक्षा ३, ५ र ८ को
- नवौं नगर स्तरीय राष्ट्रपति रनिङ्गशिल्ड प्रतियोगिता २०८२।१०।०६-९ सम्म सम्पन्न साथै जिल्ला स्तरीय राष्ट्रपति रनिङ्ग शिल्ड प्रतियोगितामा सहभागी भई द्वितीय स्थान प्राप्त भएको,

क्रमशः

- शिक्षक दरबन्दी मिलान तथा व्यवस्थापन र विद्यालय समायोजनका लागि विद्यालय अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण भएको,
- विद्यालयमा शिक्षक/कर्मचारीहरूको प्रथम, दोस्रो र तेस्रो त्रैमासिक तलब भत्ता/दिवा खाजा, विद्यालय सञ्चालन व्यवस्थापन/प्रति विद्यार्थी सिकाइ लागत र छात्रवृत्ति लगायतका शीर्षकमा निकासा कार्य गरिएको,

क्रमशः

- ▶ शिक्षक मेन्टरिङ्ग अन्तर्गत सन्धिखर्क नगरपालिकामा शैक्षिक सत्र २०८१ सालमा स्थायी नियुक्ति भएका नवप्रवेशी शिक्षकहरूका लागि शिक्षक मेन्टरिङ्ग कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेको, आठ जना मेन्टी शिक्षकका लागि दुई जना मेन्टरबाट मेन्टरीङ्ग कार्य भएको
- ▶ नमुना विद्यालयमा अन्तर्गत श्री जनताकृष्ण माध्यमिक विद्यालयमा शैक्षिक व्यवस्थापकीय अनुदान अन्तर्गत र श्री जनज्योति माध्यमिक विद्यालयमा विज्ञान शिक्षा प्रवर्द्धन कार्यक्रम अन्तर्गत कार्यालयसँग योजना सम्झौता भइ कार्यान्वयनको प्रकृत्यामा रहेको,
- ▶ विज्ञान प्रवर्द्धन कार्यक्रम अन्तर्गत जिल्लास्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी कार्यक्रम सम्पन्न भएको। उक्त प्रतियोगितामा २४ विद्यालय सहभागी भएपनि सन्धिखर्क नगरपालिका अन्तर्गतका विद्यालयले प्रथम दोस्रो र तेस्रो स्थान प्राप्त भएको।

क्रमशः

- सामुदायिक विद्यालयहरूमा रिक्त रहेका शिक्षक/कर्मचारीहरूको पदपूर्तिको कार्य भएको
- शैक्षिक सत्र २०८२ को विद्यालय शिक्षा क्षेत्रको तथ्याङ्क सत्यपान गरिएको,
- वार्षिक शैक्षिक स्थिति प्रतिवेदन तयार गरी शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रमा पठाइएको,
- माध्यमिक तथा आधारभूत तह ६-८ सञ्चालित विद्यालयमा डिस्पोजल मेसिन जडान गरिएको
- ६-१२ मा अध्ययनरत छात्राहरूका लागि निःशुल्क सेनिटरी प्याड विद्युतीय बोलपत्र मार्फत खरिद प्रकृत्यामा रहेको

क्रमशः

- शैक्षिक सत्र २०८१ को स्थायी शिक्षकहरूको कार्य सम्पादन मुल्याङ्कन फारमको सम्पूर्ण कार्य सम्पन्न गरी शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ अर्घाखाँची र प्रदेशमा पठाइएको,
- २०८२ को कासमु दर्ताको चरणमा रहेको

विद्यालय अनुगमन नेरा सरस्वति आ वि सनपा - ६



vivo V60 | ZEISS

23mm f/1.88 1/994s ISO50
05/04/2026, 11:40

विद्यालय अनुगमन मञ्जरी आ वि



vivo V60 | ZEISS

23mm f/1.88 1/1908s ISO50
05/04/2026, 10:34

विद्यालय व्यवस्थापन टीम संग छलफल



vivo V60 | ZEISS

23mm f/1.88 1/50s ISO753
05/06/2026, 14:56

आधारभूत तहका शिक्षकका लागि iemis तथा ict सम्बन्धि तालिम



नबौं सन्धिखर्क नगरपालिका स्तरीय राष्ट्रपति रनिशङ्ग शिल्ड प्रतियोगिता १४ मा वि सहभागी



SEE 2082

शैक्षिक सत्र २०८२ माध्यमिक शिक्षा परीक्षा SEE-सुदूरपश्चिम जिल्ला नगरपालिकाको समग्र नतिजा

क्र.स	विद्यालयको नाम	परीक्षामा सम्मिलित विद्यार्थी संख्या	उत्तीर्ण संख्या	उच्चतम GPA	उत्तीर्ण प्रतिशत
१	श्री युवा वर्ष जनता रविचित्र मा.वि	८७	६९	३.७९	७९.३१
२	श्री जनज्योति मा.वि	१११	६३	४	५६.७६
३	श्री भगवती मा.वि	६८	३३	३.९६	४८.५३
४	श्री जीवनोद्धार मा.वि	५०	२८	३.६८	५६.००
५	श्री आदर्श मा.वि	२६	१०	३.०५	३८.४६
६	श्री चन्द्रप्रभा मा.वि	३३	१६	३.४४	४८.४८
७	श्री जनताकृष्ण मा.वि	३५	१७	३.२२	४८.५७
८	श्री अर्घारजस्थल मा.वि	२७	१४	३.७८	५१.८५
९	श्री ज्ञानप्रकाश मा.वि	३७	२९	४	७८.३८
१०	श्री विजय मा.वि	२५	४	३.२७	१६
११	श्री पाणिनि वेद विद्याश्रम	६	६	३.६७	१००
सामुदायिक तर्फ		५०५	२८९		५७
१२	श्री अर्घाखाँची आवासीय मा.वि.	१८	१८	४	१००
१३	श्री सन्धिखर्क ग्रीन इ.बो.	४१	४०	४	९७.५६
१४	श्री मदरल्याण्ड इ.बो	१३	१३	३.७३	१००
१५	श्री गौरीशंकर इ.बो	५६	५५	४	९८
संस्थागत तर्फ		१२८	१२६		९८.४४

BLE 2082

संस्कृत विश्वविद्यालय का
 वार्षिक सत्र २०८२ का अंतिम वर्षीय परीक्षाको नतिजा

क्र.स	विद्यालयको नाम	परीक्षामा सहभागी विद्यार्थी संख्या	ग्रेडेड विद्यार्थी संख्या	ग्रेडेड प्रतिशत
१	श्री पाणिनि वेद विद्यालय स.न.पा. १	६	४	६६.६७
२	श्री समाजकल्याण आ.वि स.न.पा. १	११	१	९.०९
३	श्री युवावर्ष जनता रविचित्र मा.वि स.न.पा. १	७६	३७	४८.६८
४	श्री पार्वती आ.वि स.न.पा. १	८	६	७५
५	श्री भगवती मा.वि स.न.पा. २	५०	१५	३०
६	श्री जनज्योति मा.वि स.न.पा. २	९०	३७	४१.११
७	श्री गंगा आ.वि स.न.पा. २	१९	२	१०.५३
८	श्री बरहनेटा आ.वि स.न.पा. ३	१२	१	८.३३
९	श्री सरस्वती आ.वि स.न.पा. ४	२८	७	२५
१०	श्री जीवनोद्धार मा.वि स.न.पा. ५	१४	४	२८.५७
११	श्री मयुरा नन्दराम आ.वि स.न.पा. ५	३२	५	१५.६३
१२	श्री भुकुटी आ.वि स.न.पा. ६	१४	७	५०
१३	श्री विद्याविनय आ.वि स.न.पा. ६	१०	१	१०
१४	श्री आदर्श मा.वि स.न.पा. ७	१६	५	३१.२५
१५	श्री चन्द्रप्रभा मा.वि स.न.पा. ७	२४	३	१२.५
१६	श्री जनताकृष्ण मा.वि स.न.पा. ८	३०	४	१३.३३
१७	श्री अर्धरजस्थल मा.वि स.न.पा. ९	२२	४	१८.१८
१८	श्री अरनिको आ.वि स.न.पा. १०	१०	०	०
१९	श्री आदर्श आ.वि स.न.पा. १०	६	०	०
२०	श्री विजय मा.वि स.न.पा. ११	४०	७	१७.५
२१	श्री ज्ञान प्रकाश मा.वि स.न.पा. १२	३६	१६	४४.४४
२२	श्री गौरीशंकर इ.बो स.न.पा. १	६७	६२	९२.५४
२३	श्री मदनलयाण्ड इ.बो स.न.पा. १	१८	१२	६६.६७
२४	श्री सन्धिखर्क इ.बो स.न.पा. १	११	९	८१.८२
२५	श्री अर्घाखाँची आवासीय मा.वि स.न.पा. २	३२	२४	७५
२६	श्री सन्धिखर्क डीन इ.बो स.न.पा. २	७२	५५	७६.३९
२७	श्री सनराइज इ.बो स.न.पा. १२	९	९	१००
		७६३	३३७	४४.१७

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
 २०८१/१२/१५
 प्रमोद खनाक

उपलब्धी परीक्षा २०८२ कक्षा ३ र ५

- ▶ कक्षा ३ र ५ का सबै विषयको प्रश्न समावेश गरी परीक्षा सञ्चालन गरीएको
- ▶ कक्षा पाँचको उत्तीर्ण प्रतिशत ४७.६९% रहेको
- ▶ गणित र अंग्रेजीको औषत सिकाई उपलब्धी न्युन रहेको
- ▶ कक्षा तीन गणित ४५.१% र अंग्रेजीमा ५४.८%
- ▶ कक्षा पाँचको गणित ५३.८% र अंग्रेजीमा ५२.१%

कक्षा १-३ मा अध्यापनरत शिक्षकका लागि तालिम



vivo V60 | ZEISS

26mm f/1.88 1/50s ISO803
04/28/2026, 10:50

एकीकृत पाठ्यक्रम सम्बन्धि तालिम



vivo V60 | ZEISS

45mm f/1.88 1/20s ISO327
04/29/2026, 15:47

नतिजा समिक्षा सहितको प्रअ बैठक


स्वास्थ्य कार्यक्रमहरुको
तेस्रो त्रैमासिक समिक्षा
आ.ब. ०८२।८३

प्रस्तुतकर्ता: पूर्ण प्रसाद पराजुली
स्वास्थ्य अधिकृत
मिति २०८३।०१।३१


■ मासिक समिक्षा बैठक

■ वार्षिक समिक्षा

■ अर्ध वार्षिक समिक्षा



समिक्षा गोष्ठी



औषधी खरिद तथा वितरण सम्पन्न भएको


औषधी खरिदमा जम्मा रकम रु २९७४०००
बिद्युतिय बोलपत्र मार्फत रकम रु ६००००००
बोलपत्र स्विकृत भएको रकम रु १८२९०००




- पूर्ण सुस्थागत प्रसुती सेवायुक्त वडा घोषणावडा नम्बर ३, ८ र १०, मा घोषणा सम्पन्न भएको



पूर्ण संस्थागत प्रसुती सेवायुक्त वडा घोषणा कार्यक्रम
आ.ब. ०८२।८३



स्वास्थ्य शिविर




- सेवा लिने बिरामी संख्या
- इन्डोस्कस्कोपी संख्या




सम्पन्न भएका कार्यक्रमहरू

- पूर्णखोपको घरधुरी सर्वेक्षण सम्पन्न गरि वडाहरू सुनिश्चितता र दिगोपना कायम भएको ।
- खोप कार्यक्रमको सूक्ष्मयोजना सम्पन्न भएको ।
- क्षयरोगको समिक्षा
- स्वास्थ्य संस्थाको न्यूनतम सेवा मापदण्ड मूल्याङ्कन सम्पन्न भएको ।
- IMNCI Onsite Coaching सम्पन्न भएको ।
- महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयम सेविकाहरूलाई नसर्ने रोगहरूको अभिमुखिकरण सम्पन्न भएको ।
- ३८४ जना किशोरीहरूलाई HPV खोप सेवा दिईएको ।
- कोभिड १९ विरुद्धको खोप

विद्यालयमा जुकाको औषधी २०८२ मंसिर




गर्भवती सुत्केरीको तथ्याङ्क आ ब ०८२।८३ श्रावणदेखि चैत्रसम्म




जिवित जन्ममा
आ ब ०८२।८३ श्रावणदेखि चैत्रसम्म


छोरा



जातजाती अनुसारको जन्म विवरण



जिवित जन्म (आ. ब. ०८२।८३ चैत्रसम्मको)



स्वास्थ्य संस्था अनुगमन



हामी सबैको स्वास्थ्य सुधारका लागि हातेमालो गरौ ।



Adobe Stock | #144582104

धन्यवाद

नमस्कार तथा स्वागत



सन्धिखर्क नगरपालिका कृषि विकास शाखाको तेस्रो
त्रैमासिक प्रगति तथा समिक्षा कार्यक्रम
आ.व. २०८२/०८३



सन्धिखर्क नगरपालिका
नगर कार्यापालिकाको कार्यालय
सन्धिखर्क , अर्घाखाँची
कृषि विकास शाखा

कृषि विकास शाखा कार्यरत कर्मचारी विवरण

- कृषि विकास अधिकृत - १ जना
- कृषि प्राविधिक पाँचौ २ जना

विनियोजित बजेट एव वित्तीय प्रगति

सि.न.	विवरण	स्वीकृत बजेट	बजेटको श्रोत	खर्च	वित्तीय प्रगति प्रतिशत
क)	निशर्त	२७०००००० ।-	सशर्त, आन्तरिक तर्फ र प्रदेश विशेष अनुदानतर्फ	९९५५७५ ।-	३७ %
ख)	संघिय सशर्त	४६८००००० ।-		७१४४७०	२ %
ग)	प्रदेश विशेष	१७०००००० ।-		०	० %
जम्मा		९०८००००० ।-			

कृषि विकास शाखाको हाल सम्मको प्रगति तथा समिक्षा

आ.व.२०८२/८३

क्र.स	कार्यक्रमको नाम	ईकाइ	हाल सम्मको प्रगति	विनियोजित बजेट रु.	खर्च बजेट रु.	वित्तिय प्रगति प्रतिशत	लाभान्वित सङ्ख्या
१	मौरीघार तथा मौरी जन्य सामग्री ५० प्रतिशत अनुदानमा वितरण कार्यक्रम	सङ्ख्या	मौरीघार-४३२ क्विनगेट-२४४ घुम्टी-१७६	७०००००	७०००००	१०० %	५ वटा समूह, ७ सहकारी तथा १३५ व्यक्तिगत कृषक/फर्म
२	आकषमिक बाली संरक्षण कार्यक्रम	पटक	०	१५००००	०	० %	०
३	हिउँदे तथा बर्षे फलफुल र जडिबुटी तथा धार्मिक महत्वका बिरुवा (५०% अनुदानमा) वितरण कार्यक्रम	पटक	सूचना प्रकाशन गरी माग सङ्कलन भएको ।	३०००००	०	० %	०
४	बाली विशेष कृषि उत्पादन कार्यक्रम (अदुवा,बेसार ५०% अनुदानमा)	के.जी	अदुवा- ३००० बेसार- १२५०	२०००००	२०००००	१०० %	१ समूह, ३ सहकारी तथा १५३ व्यक्तिगत कृषक/फर्म
५	रैथाने बालीमा (कोदो, फापर, जुनेलो, झिलिडी, कालो काउली, गहत, लट्टे) को बीउ ५०% अनुदानमा वितरण कार्यक्रम	पटक	सूचना प्रकाशन गरी माग सङ्कलन भएको ।	१०००००	०	० %	०

क्र. स	कार्यक्रमको नाम	ईकाइ	हाल सम्मको प्रगति	विनियोजित बजेट रु.	खर्च बजेट रु.	वित्तिय प्रगति प्रतिशत	लाभान्वित सङ्ख्या
६	प्राङ्गारिक मलमा जोड दिई रासायनिक मल एवं विषादी न्युनिकरण कार्यक्रम	पटक	०	१०००००	०	० %	०
७	मागमा आधारित घुम्ती स्थलगत तालिम	पटक	१	१०००००	९५५७५	९५.५ %	३० जना एकल महिला कृषक
८	वन्यजन्तुबाट बाली संरक्षण गर्न मागमा आधारित सामग्री वितरण (५० % अनुदानमा)	पटक	माग सङ्कलन गरेर लाभग्राही छनौट भईसकेको ।	५०००००	०	० %	४ वटा सहकारी तथा ११ कृषि फर्म
९	अकबरे खेती प्रवर्द्धन कार्यक्रम(५० % अनुदानमा)	पटक	माग सङ्कलन गरेर लाभग्राही छनौट भई सम्झौता भएको ।	२५००००	५००००	२० %	
	कृषि बिमा सचेतना कार्यक्रम	पटक	०	१०००००	०	० %	०
११	नविनतम प्रविधिसहितको धान मकै बाली प्रवर्द्धन कार्यक्रम	पटक	१२०० के.जि मकैको उन्नत बीउ वितरण तथा मिनिटिलर खरिद प्रक्रियामा	१७०००००	०	० %	३ वटा समूह, १ सहकारी तथा ११० कृषक/फर्म

क्र.स	कार्यक्रमको नाम	ईकाइ	हाल सम्मको प्रगति	विनियोजित बजेट रु.	खर्च बजेट रु.	वित्तिय प्रगति प्रतिशत	लाभान्वित सङ्ख्या
१२	होमस्टे/सुपादेउराली क्षेत्रमा पुष्प खेती कार्यक्रम	पटक	माग सङ्कलन गरेर लाभग्राही छनौट तथा सम्झौता अनुसारको काम सम्पन्न भएको भुक्तानि हुन बाँकी ।	१५००००	०	० %	१ समूह
१३	राष्ट्रिय धान दिवस कार्यक्रम	पटक	०	५००००	०	० %	०
१४	मध्य पहाडी मकै बाली प्रवर्द्धन कार्यक्रम	पटक	माग सङ्कलन गरेर लाभग्राही छनौट तथा सम्झौता अनुसारको काम भईरहेको ।	७०००००	०	० %	२ वटा सहकारी
१५	राष्ट्रिय फल सुन्तला विशेष कार्यक्रम	पटक	सूचना प्रकाशन गरी माग सङ्कलन तथा लाभग्राही छनौट भएको । र खाडल खन्ने काम भएको ।	९०००००	०	० %	१ वटा समूह तथा १४ कृषक
१६	उन्नत बीउ वितरकलाई प्रोत्साहन अनुदान	पटक	०	१५००००	०	० %	०

क्र. स	कार्यक्रमको नाम	ईका इ	हाल सम्मको प्रगति	विनियोजित बजेट रु.	खर्च बजेट रु.	वित्तिय प्रगति प्रतिशत	लाभान्वित सङ्ख्या
१७	सूचना प्रकाशन तथा उन्नत बीउ उपयोग अनुगमन निरीक्षण	पटक		१५००००			
१८	खाद्यान्न बालीको उन्नत बीउ उपयोगमा अनुदान (धान,गहुँ,मकै)	के.जि	गहुँ - १७३०० मकै - ८०० धान - ४००	१२०००००	६७३८१८	५६ %	४ वटा समूह, १० वटा सहकारी तथा ४८२ व्यक्तिगत कृषक/फर्म
१९	किसान सूचिकरण कार्यक्रम	पटक	काम शुरु भएको ।	३०००००	०	० %	०
२०	कृषि,पशुपन्छी तथा मत्स्य तथ्याङ्क अध्यावधिक कार्यक्रम	पटक	१०६६ कृषक घरधुरीको तथ्याङ्क सङ्कलन भएको ।	८००००	४०६५०	५०.८%	१०६६ कृषक घरधुरी
२१	आ.व.२०८२/८३ मा तरकारी बालीको नयाँ पकेट विकास कार्यक्रम सञ्चालन	पटक	माग सङ्कलन गरेर लाभग्राही छनौट तथा सम्झौता अनुसारको काम भईरहेको ।	१२०००००	०	० %	१ वटा समूह

क्र. स	रासायनिक मल आपूर्ति तथा कोटा वितरण	ईकाइ	हाल सम्मको आपूर्ति परिमाण
१	यूरिया	मे.टन.	१८.२६
२	डि.ए.पि.	मे.टन.	२९.६९

कार्यक्रमको मुख्य उपलब्धीहरू:

- खाद्यान्न बालीको उन्नत बीउ उपयोगमा अनुदान कार्यक्रम अन्तर्गत गहुँ धान मकैको उन्नत बीउ वितरण भई उत्पादन तथा उत्पादकत्वमा वृद्धि भएको ।
- मध्य पहाडी मकै बाली प्रवर्द्धन कार्यक्रम अन्तर्गत कृषि मेशिनरी तथा मकैको उन्नत तथा स्वदेशी हाईब्रिड बीउ वितरण भएको ।
- सफल कृषि फर्महरूलाई अनुदान रकमबाट उत्पादन तथा उत्पादकत्व बृद्धि गरी जिवनस्तर माथि उठेको ।
- पकेट विकास कार्यक्रमबाट वाली विशेषमा क्षेत्रफल बढनुका साथै उत्पादन तथा आयआर्जनमा वृद्धि भएको ।
- कृषि क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तन प्राकृतिक दैवि प्रकोप /महामारी रोग वा दुर्घटनाबाट कृषि/पशु व्यवसायमा हुन जाने क्षतिको यथार्थ मूल्यांकन गरी विपद व्यवस्थापन रकम वितरण गरिएको ।
- बाली विशेष कृषि उत्पादन कार्यक्रम अन्तर्गत अदुवा तथा बेसारको बीउ वितरण भई क्षेत्र विस्तार हुनुका साथै जङ्गली जनावरको आतङ्क कम हुने ।
- विभिन्न घुम्ती स्थलगत तालिम बाट खेती गर्ने उन्नत प्रविधि तथा रोग/किरा सम्बन्धी जानकारी पाएको ।

क्रमश....

- नविनतम प्रविधिसहित धान मकै बाली प्रवर्द्धन कार्यक्रम अन्तर्गत उन्नत मकैको बीउ वितरण भएको ।

कार्यक्रम कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या र चुनौतीहरू:

- कृषि क्षेत्रमा ईच्छा शक्ति हुनेको प्रयास जग्गा एवं लगानी लगाउन नसक्नु ।
- बजेट पर्याप्त नहुँदा सबै कृषकको माग एवं आकाक्षां पुरा गर्न नसकिएको ।
- धेरै जस्तो कृषकहरूले आधुनिकीकरण र व्यवसायिकरण नगरी निर्वाहमुखी खेती गर्नु ।
- बन्यजन्तुको समस्याले खेती योग्य जमिन बाझिदै जानु ।
- आवश्यक औजार उपकरण, मल, गुणस्तरीय बीउ प्रयाप्त रूपमा उपलब्ध नहुनु ।
- अधिकांस खेती बर्षाको भरमा निर्भर भएकाले सिँचाईको दिगो समाधान नहुनु ।
- सबै कृषकमा सूचना, कृषि प्रविधि बारेमा अझै प्रयाप्त ज्ञान नहुनु ।
- केहि अनुदानग्राहिमा ईमानदारीता तथा सकारात्मक सोचको कमी,
- जलवायु परिवर्तनको असर ।

कार्यक्रमका केहे झलकहरु:

मौरीघार तथा मौरीजन्य सामग्री वितरण कार्यक्रम



घुम्टी स्थलगत तालिम कार्यक्रम अन्तर्गत एकल महिलाका कृषकहरुलाई उन्नत तरकारी खेती प्रविधि सम्बन्धी तालिम, बीउ तथा अन्य कृषिजन्य सामग्री वितरण गरिदै ।



बाली विशेष कृषि उत्पादन कार्यक्रम अन्तर्गत अदुवा तथा बेसारको बीउ वितरण गरिदै ।



धान मकै तथा गहुँको बीउ वितरण गरिदै ।



मध्य पहाडि मके बाली प्रवद्धन कार्यक्रममा औजार उपकरण वितरण कार्यक्रम



मध्य पहाडि मके बाली प्रवद्धन कार्यक्रममा औजार उपकरण वितरण कार्यक्रम



तरकारी पकेट कार्यक्रममा औजार उपकरण वितरण कार्यक्रम



केही जिज्ञासा ?

धन्यवाद

नमस्कार तथा स्वागत



पशु विकास शाखाको प्रगति
तथा तेस्रो त्रैमासिक समिक्षा
आ.व. २०८२/०८३

प्रस्तुतकर्ता:
नारायण खनाल
पशु विकास शाखा

सन्धिखर्क नगरपालिका पशु सेवामा कार्यरत कर्मचारी विवरण

कार्यरत कर्मचारी - कुल ६ जना

स्थायी कर्मचारी - ४ जना

पशु चिकित्क- १-संघीय सःससर्त

करार कर्मचारी - ३ (OVOT)

अधिकृत छैटौं नेपाल कृषि सेवा(भेट) - २ जना

सहायक पाचौं नेपाल कृषि सेवा(भेट)- १ जना अध्ययन विदा

सहायक पाचौं नेपाल कृषि सेवा(ला.पो.डे.डे.) - १ जना

सन्धिखर्क नगरपालिकाको पशुपन्ध्री तथ्यांक

क्र. स.	पशुपन्ध्री विवरण	संख्या	कैफियत
१.	गाई	१६२५	
२.	भैँसी	१०४५६	
३.	भेडा	-	
४.	बाख्रा	१८१९३	
५.	बंगुर	११४९	
६.	कुखुरा	३६७३९	
७.	हाँस	९१	

सन्धिखर्क नगरपालिकाको पशुपन्ध्री तथ्यांक

क्र.स	पशुपन्ध्री विवरण	संख्या	कैफियत
८.	दुध दिने गाई	५२१	
९.	बाच्छा/बाच्छी	९०४	
१०.	दुध दिने भैंसी	६५४०	
११.	पाडा/पाडी	१९१६	
१२.	फुल पार्ने कुखुरा	१९८२९	

सन्धिखर्क नगरपालिकाको अन्य तथ्यांक

क्र.स.	पशुपन्छी विवरण	संख्या	कैफियत
१	गाईभैँसी पालन फार्म	७१	
२	बाख्रा पालन फार्म	४५	
३	भेडा पालन फार्म	०	
४	बंगुर पालन फार्म	६	
५	ब्रोइलर फार्म	९	
६	लेयर्स फार्म	७	
७	माछा फार्म	१	

सन्धिखर्क नगरपालिकाको अन्य तथ्यांक

क्र.स.	पशुपन्थी विवरण	संख्या	कैफियत
८	दर्ता मासु पसल	४२	
९	दर्ता डेरी पसल	१४	
१०	दुग्ध सहकारी	१	
११	एग्रोभेट सेन्टर	१८	
१२	दुध संकलन केन्द्र	६	
१३	दाना पसल	६	

विनियोजित बजेट एव वित्तिय प्रगति

सि.न.	विवरण	स्वीकृत बजेट	बजेटको श्रोत	खर्च	वित्तिय प्रगति प्रतिशत
क)	निशर्त	३१३००००० ।-	सशर्त, आन्तरिक तर्फ	२२१४०००० ।-	७०.७ %
ख)	संघिय सशर्त	११०००००० ।-		० ।-	० %
ग)	जम्मा	४२३००००० ।-		२२१४०००० ।-	५२.३ %

सन्धिखर्क नगरपालिकाको आ.व. ०८२/८३ मा पशु विकास तर्फ स्वीकृत कार्यक्रम तथा प्रगति

क्र.सं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	बजेट रु.	खर्च रकम	वित्तीय प्रगति %	भौतिक प्रगति	लाभान्वित संख्या
१.	एन्टिरेविज भ्याक्सिनेशन खरिद कार्यक्रम	१०००००	१०००००	१००%	४३४ भ्याक्सिन	२८९ कृषक
२	हिउँदे घास (बर्षिम)को बीउ खरिद र वितरण ७५% अनुदान	२५००००	२५००००	१००%	८३३ के.जि	२१२ कृषक
३	पशुपन्छी औषधी खरिद कार्यक्रम	१०५००००	६५२८१७	६२.१७%	४३ प्रकारका औषधिहरु	३९१४ कृषक
४	सामुदायिक कुकुरहरुमा बन्ध्याकरण रेविज भ्याक्सिनेसन शिविर तथा अन्य कार्यक्रम	८०००००	७९७५००	९९.६८%	१०८ कुकुर बन्ध्याकरण तथा ५०० सामुदायिक कुकुरमा भ्याक्सिनेसन	६०८ कुकुर

सन्धिखर्क नगरपालिकाको आ.व. ०८२/८३ मा पशु विकास तर्फ स्वीकृत कार्यक्रम तथा प्रगति

क्र.स	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	बजेट रु.	खर्च रकम	वित्तीय प्रगति %	भौतिक प्रगति	लाभान्वित संख्या
५	भ्यागुते चरचरे तथा खोरेत भ्याक्सिन कार्यक्रमको लागि लोजिष्टिक सामान खरिद	५०००००	५०००००	१००%	सिरिन्ज निडिल ग्लोभ्स तथा मास्क खरिद	११२२ कृषक
६.	व्यवसायिक फर्ममा गाई/भैसीमा निवारण शिविर (डोर टु डोर) कार्यक्रम	३००००००	०	०%	०	०
७	कृत्रिम गर्भाधानका मिसन कार्यक्रमको लागि सिमेन नाईट्रोजन तथा लजिष्टिक सामान खरिद कार्यक्रम	१५०००००	६५००००	४३.३%	२६७१ गाई/भैसी	१७६७ कृषक
८	खनिज मिश्रण/मिनिरल ब्लक वितरण	३००००००	३००००००	१००%	१४२८ के.जि	१९४ कृषक
९	मासु/डेरी पसल अनुगमन	१५०००००	०	०	०	०
१०	कृत्रिम गर्भाधान मिसन कार्यक्रम	५०००००	०	०	०	०

सन्धिखर्क नगरपालिकाको आ.व. ०८२/८३ मा पशु विकास तर्फ स्वीकृत कार्यक्रम तथा प्रगति

क्र.स.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	बजेट रु.	खर्च रकम	वित्तीय प्रगति %	भौतिक प्रगति	लाभान्वित संख्या
११	बाखा प्रवर्द्धन कार्यक्रम	५०००००	०	०	सूचना प्रकाशित भएको तथा कुनै पनि आवेदकको प्रस्ताव नआएको।	०
१२.	गाई/भैसी प्रवर्द्धन कार्यक्रम	५०००००	०	०	सूचना प्रकाशन गरी माग सङ्कलन तथा लाभग्राही छनौट भईसकेको।	०
१३	पशुपन्ध्रीमा महामारी/आकस्मिक रोग नियन्त्रण कार्यक्रम	५००००	०	०		०

कार्यक्रमको मुख्य उपलब्धीहरू

- पशुपन्ध्रीमा लाग्ने महामारी रोगहरू जस्तै: भ्यागते, चरचरे, खोरेत, पटके आदिको रोगहरूको नियन्त्रण तथा रोकथामको लागि भ्याक्सिनेसन कार्यक्रम संचालन गरिएको जसबाट महामारी रोगहरू धेरै हदसम्म नियन्त्रणमा रहेकोछ ।
- पशुपन्ध्री उपचार ल्याबबाट कृषकहरूको पशुपन्ध्रीमा लागेको रोगहरू पहिचान गरि समयमै उपचारको लागि कृषकलाई परामर्श गर्ने गरेको हुदा पशुपालक कृषकले राहतको अनुभूति गरेका छन् ।
- घाँसमा आधारित पशुपालन व्यवसायलाई बढवा दिनको लागि नगरपालिकाबाट उन्नत घाँसको बीउहरू निःशुल्क वितरण गरिएकोमा कृषकहरूले प्रशस्तमात्रामा घाँसको उत्पादन गरेकोले दाना खरिदमा लगानी घटी कृषकहरूले बढी मुनाफा गर्न सफल भएकाछन् ।

क्रमशः

- कृत्रिम गर्भाधानकर्ता, अगुवा कृषक तथा सरोकारवाला बीच समन्वय गरि कृत्रिम गर्भाधान कार्यलाई सहज, सुलभ र प्रभावकारी बनाइएको छ।
- सामुदायिक कुकुरहरुमा बन्ध्याकरण तथा रेविज भ्याक्सिनेशन शिविर मार्फत कुकुरहरुमा रेविज रोग नियन्त्रण तथा सन्तान उत्पादनमा कमिहुने देखिएको।
- अनुदान कार्यक्रमहरुबाट इच्छाशक्ति भएका तर लगानी नभएका कृषकहरुलाई लाभ मिलेको छ।
- नगरभित्रका मासु तथा डेरीपसलहरुको अनुगमन गरि स्वच्छ र स्वस्थ मासु तथा दुध सेवन गर्न पाउनेको नागरिकको अधिकारको सुनिश्चितता गरिएको छ।
- सुक्ष्मपोषक तत्वको कमीले पशु गर्भाधान नहुने समस्यालाई न्युनिकरण गर्न खनिज मिश्रण वितरण गरि प्रभावकारी नतिजा प्राप्त भएको छ।

सामुदायिक कुकुरहरुमा स्थायी बन्ध्याकरण भ्याक्सिनेसन कार्यक्रमका झलक



धन्यवाद
नमस्कार



शुभ दिन



सन्धिखर्क नगरपालिका

महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक शाखाको
आ.व २०८२/०८३ तेस्रो त्रैमासिक प्रगति समीक्षा

प्रस्तुतकर्ता श्री बेलकुमारी परियार

महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक शाखा

शाखा प्रमुख

कार्यक्रम वजेट

निसर्त	१६,७००००।-
खर्च रकम रु.	रु.६२८६००।-
बाँकी	१०४१४००।-
शशर्त तर्फ	२४०००००।-
खर्च	-
बाँकी	२४०००००।-
कुल जम्मा बाँकी	३४३०६००।-

महिला विशेष तर्फ

सि.नं.	कार्यक्रमको नाम	स्थान	बजेट	खर्च	बाँकी	प्रगती प्रतिशत	लाभान्वीत संख्या	महिला	पुरुष
१	अनुगमन भ्रमण, कार्यविधिहरु तयारी तथा विविध खर्च	स.न.पा.	५००००	१५८००	३४२००	३०.४	-		
२	विभिन्न दिवस,समारोह कार्यक्रम ईत्यादी	स.न.पा.	३२००००	१२०८००	१७९२००	३७.७५	६३७	३४७	२९०
३	अपाङ्गता परिचय पत्र वितरण कार्यक्रमको बैठक भत्ता	स.न.पा.	१५००००	५२८००	-९७२००	३५.२	२९	८	२१
४	लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण परिक्षण	स.न.पा.	१०००००	१०००००	-	१००	८	८	१८
५	हिंसा पिडित महिला तथा किशोरीका लागि अल्पकालिन सेवा केन्द्र संचालन कार्यक्रम	स.न.पा.	५०००००	संझौता भएको	५०००००	-	-	-	-
७	एच आई भि एड्स संक्रमित लक्षित कार्यक्रम	स.न.पा.	१०००००	१०००००	-	१००	१५	१२	३
८	वडास्तरीय ज्येष्ठ नागरिक समन्वय समिति र नगरस्तरीय ज्येष्ठ नागरिक मञ्चका पदाधिकारीहरुलाई ज्येष्ठ नागरिकहरुका कानुनी हक अधिकार सम्बन्धि अभिमुखिकरण कार्यक्रम	स.न.पा.	१०००००	८९२००	१०८००	८९.२	५९	२१	३८
९	जनजाति सशक्तिकरण कार्यक्रम	स.न.पा.	५००००	५००००	-	१००	४०	१७	२३
१०	एकल महिला समुह सञ्जाल क्षमता अभिवृद्धि तालिम (१२ वटै वडामा एकल महिला सञ्जाल गठन)	१२ वटै वडामा	१०००००	१०००००	-	१००	३२६	२८६	४०
११	सबै जिल्लाका कम्तिमा २ स्थानिय तह रहने गरी मानव विकास सूचाङ्कमा पछाडी परेका जम्मा १११ स्थानिय तहमा जिविकोपार्जन सुधार कार्यक्रम संचालन	स.न.पा. ७	९०००००	सम्झौता भएको	९०००००	-	-	-	-
१२	ज्येष्ठ नागरिक तथा बाल उद्धान	स.न.पा.	१००००००	सम्झौता भएको	१००००००	-	-	-	-









“धन्यवाद”





नेपाल सरकार

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय



लुम्बिनी प्रदेश सरकार



सन्धिखर्क नगरपालिका

"स्वदेशमा नै रोजगारी गरौ, बैदेशिक रोजगारीमा जानै नै भए, सही सूचना लिएर र सीप सिकेर मात्र जाऔ"

सुरक्षित आप्रवासन (सामी) कार्यक्रम चालु आ.व. २०८२/०८३ को तेस्रो त्रैमासिक प्रगति समिक्षा कार्यक्रम

सन्धिखर्क नगरपालिका

बसन्त श्रेष्ठ

जिल्ला कार्यक्रम संयोजक

प्रस्तुतकर्ता:

मिति:- २०८३/०१/३१ गते




सुरक्षित आप्रवासन (सामी) कार्यक्रम- बारे संक्षिप्त जानकारी

सामी कार्यक्रम-

तीनै तहका सरकार (संघ, प्रदेश र स्थानीय) को समन्वय, सहकार्य र लागत साझेदारीमा कार्यक्रम सञ्चालन ।

- स्वीस सरकार विकास सहयोग एसडीसीले कार्यक्रमको गुणस्तरीयता र क्षमता अभिवृद्धिको निम्ति प्राविधिक सहयोग प्रदान ।
- हेल्भेटास नेपालले स्वीस सरकारको तर्फबाट प्राविधिक सहयोग प्रदान ।


नेपाली आप्रवासी कामदार र तिनका परिवारलाई राज्य संयन्त्रबाट संरक्षण गरी सुरक्षित तथा मर्यादित कार्य वातावरणबाट लाभन्वित बनाउने ।



वैदेशिक रोजगारीका सबै चरणमा आप्रवासी कामदार र उनीहरूका परिवारको अवस्था सुधार गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सम्बन्धित निकायहरूलाई सक्षम बनाउन सहयोग गर्ने ।

१. वैदेशिक रोजगारीमा रहेका महिला तथा पुरुष आप्रवासी कामदार र उनीहरूका परिवारको वैदेशिक रोजगारीबाट सिर्जित सामाजिक लागत न्यूनिकरण भई सामाजिक/आर्थिक लाभ अभिवृद्धि भएको हुनेछ ।
२. राज्यका तीनै तह (संघ, प्रदेश र स्थानीय) का संयन्त्रहरूको सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाई वैदेशिक रोजगारीमा रहेका कामदार र उनीहरूका परिवारको उचित संरक्षण भएको हुनेछ ।

कार्यक्रमको मुख्य सेवाहरु:-



सुरक्षित आप्रवासन (सामी) कार्यक्रमका सेवाग्राहीहरू

कार्यक्रमको लागि सेवाग्राही

```
graph LR; A[कार्यक्रमको लागि सेवाग्राही] --> B[वैदेशिक रोजगारीमा जाने सम्भावित कामदार]; A --> C[वैदेशिक रोजगारीमा रहेका कामदार]; A --> D[वैदेशिक रोजगारीवाट फर्केका कामदार]; A --> E[वैदेशिक रोजगारीमा रहेका कामदारका परिवारका सदस्यहरू];
```

वैदेशिक रोजगारीमा जाने सम्भावित कामदार

वैदेशिक रोजगारीमा रहेका कामदार

वैदेशिक रोजगारीवाट फर्केका कामदार

वैदेशिक रोजगारीमा रहेका कामदारका परिवारका सदस्यहरू

नेपालसँग दोहोरो श्रम सम्झौता तथा समझदारी भएका देशहरु

क्र.सं.	श्रम सम्झौता भएका देशहरु	श्रम सम्झौता भएको मिति	कैफियत
१	कतार	२००५ मार्च २१	<p>नोट:-व्यक्तिगत रुपमा श्रमस्वीकृति लिएर १ सय ७८ मुलुकमा नेपालीहरु वैदेशिक रोजगारीमा जान पाउँछन भने संस्थागत रुपमा श्रमस्वीकृति लिएर १ सय ११ मुलुकमा वैदेशिक रोजगारीमा जान पाउँछन्।</p>
२	दक्षिण कोरिया	२००६ जुलाई २३	
३	बहराईन	२००८ अप्रिल २९	
४	जोर्डन	२०१७ अक्टोबर १७	
५	मलेसिया	२०१८ अक्टोबर २९	
६	जापान	२०१९ मार्च २५	
७	मौरिसस	२०१९ जुन ११	
८	यूएई	२०१९ जुन १४	
९	ईजरायल	२०२० सेप्टेम्बर ३०	
१०	बेलायत	२०२२ अगस्ट २२	
११	रोमानिया	२०२३ अक्टोबर ६	
१२	जर्मनी	२०२३ अक्टोबर १०	

वैदेशिक रोजगारीको समग्र अवस्था

- नेपालमा सरदर प्रतिवर्ष करिब ५ लाख भन्दा बढि श्रमशक्ति श्रम बजारमा प्रवेश गर्छन ।
- नेपालबाट श्रम स्वीकृत लिएर बैदेशिक रोजगारमा जानेको संख्या ८६ लाख नाघिसकेको छ । हाल दैनिक सरदर २३०० जना वैदेशिक रोजगार जाने गरेको,
- आ.ब. २०८१/८२ मा श्रम स्वीकृति (पुनः श्रम स्वीकृति समेत) प्रदान गरिएको संख्या: ८,३९,२६६ (पु. ७,४४,८११ (८८.८४%), म. ९४,४५५ (११.२५%) श्रम स्वीकृती नलिई वैदेशिक रोजगारमा जानेको संख्या पनि उल्लेख्य रहेको
- मुख्य गन्तव्य (१० देश): संयुक्त अरब इमिरेट्स, साउदी अरेविया, कतार, मलेसिया, कुवेत, क्रोसिया, रोमानीया, जापान, द.कोरिया, बहराइन ।

(स्रोत:- वैदेशिक रोजगार विभाग)

अरबमा डेढ दशक बिताउँदा पनि मसँग सपना बोकेको रिती झोला मात्र छ

साउन १७, २०८० बुधबार १३:४२:३९ | मेरो कक्षा मेरो भोगाई

2

Share



सरकार तिमी दर्शै मनाऊ, म त हिउँ परदेश

असोज ३०, २०८० मंगलबार १७:५७:३५ | उज्यालो सहकर्मी

15

Share



वैदेशिक रोजगारीको समग्र अवस्था वैदेशिक रोजगारीको परिवेश:-

- वैदेशिक रोजगारको लागि खुल्ला गरिएका देशहरु १११ वटा (लामो समय देखि रोक्का गरिएका देशहरु अफगानिस्तान, लिविया र ईराक)
- द्विपक्षीय सम्झौता (BLA) भएका राष्ट्रहरुको संख्या : २ (कतार र जोर्डन)
- समझदारी पत्र (MoU) भएका राष्ट्रहरुको संख्या : ८ (यूएइ, रिपब्लिक अफ कोरीया, वहराइन, इजरायल, मलेशिया, मौरीसस, वेलायत, रोमानीया)
- सहयोज सम्झौता पत्र (MoC) भएका राष्ट्रको संख्या : १ (जापान)
- संयुक्त घोषणापत्र (Joint Declaration) भएका राष्ट्रको संख्या : १ (जर्मन)
- आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १७ खर्ब २३ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स मुलुक भित्रिएको छ (२८.६% कुल GDP मा योगदान) जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा १९.२ प्रतिशतले बढेको हो। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १६.५ प्रतिशतले रेमिट्यान्स आप्रवाह वृद्धि भई १४ खर्ब ४५ अर्ब भित्रिएको थियो। नेपाल राष्ट्र बैंक
- आ.व.२०८०/८१ मा बैदेशिक रोजगारीमा मृत्युभएका कामदारका हकवालालाई अर्थिक सहायता: पुरुष १३०५, महिला ४१, जम्मा १३४६

अर्थ / वाणिज्य

वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या हालसम्मकै उच्च

यो वर्ष साढे ७ लाखले लिए श्रम स्वीकृति

असार २०, २०८० | रासस




श्रम/रोजगार

१५ वर्षमा वैदेशिक रोजगारीमा गएका १२ हजार ३५७ ले गुमाए ज्यान


आ.ब. ०८१।८२ मा प्रदेशगत श्रम स्विकृतीको विवरण

आ.ब. ८१/८२ मा श्रम स्विकृति (पुनः श्रम स्विकृति समेत) प्रदान गरिएको संख्या: ८,३९,२६६ जना (महिला ९४,४५५ (११%) र पुरुष ७,४४,८११ (८९%))



वैदेशिक रोजगारीको परिवेश जिल्लागत

श्रम स्वीकृति (पुनः श्रम स्वीकृति समेत) प्रदान गरिएको संख्या: १,५०,१११ जना (आ.व. ०८१/८२ मा) महिला ११८१९ जना ७.८७ प्रतिशत




नेपालमा वैदेशिक रोजगारको सकारात्मक प्रभाव

सकारात्मक प्रभाव

- देश भित्र पर्याप्त रोजगारीको अवसर उपलब्ध नभएको अवस्थामा धेरै युवाहरूको लागि अल्पकालीन रूपमा रोजगारीको विकल्पको रूपमा रहेको ।
- २०८१/८२ मा १७ खर्ब २३ अर्ब २७ करोड विप्रेषण भित्रिएको (GDP सँग तुलना गर्दा करिब २८.२२ प्रतिशत हिस्सा हुन आउछ ।)
- विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने प्रमुख श्रोत रहेको,
- ७६.८ % परिवारले विप्रेषण प्राप्त गर्ने गरेको र लुम्बिनी प्रदेश ८९.६ %
- गरिबी न्यूनिकरणमा महत्वपूर्ण योगदान,
- शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतको क्षेत्रमा पहुँच वृद्धि, भूमिकामा परिवर्तन (घर व्यवहारमा महिलाको नेतृत्व विकास)

रेमिट्यान्स (विप्रेषण) को उपयोग

कहाँ उपयोग हुन्छ रेमिट्यान्स ?



आप्रवासी श्रोतकेन्द्र, अर्घाखाँची

सुचना तथा परामर्श र न्यायमा पहुच सम्बन्धी विवरण

क्र.स	सेवाग्राहीको किसिम	गत बर्ष २०८१/८२ सम्म	आ.ब २०८२/८३ मा	कैफियत
१	आप्रवासी श्रोतकेन्द्रमा राहदानी सेवा तथा परामर्श सेवा लिनेहरुको संख्या	९१४६	३७९७	१२९४३
२	फोन फलोअपको संख्या	७१५	३८८	११०३
३	बितीय साक्षरता सेवा प्रवाह २१/२१ शेसन सनपा १ र २	०	५० जना	१७ र १४ शेसन
४	रिटर्नी स्वयम सेवक परिचालन तथा सूचना प्रवाह		८९१	जनालाई

आप्रवासी श्रोत केन्द्र निःशुल्क कानुनी सहायता (न्यायमा पहुँच) २०८२।०८३

गतिविधि	इकाई	हाल सम्मको अवस्था			
		पहिचान	समाधान भएका	प्रकृत्यामा	कैफियत
समस्याका प्रकार					
ठगी सम्बन्धि समस्या	वटा	२२	१०	१०	२ विभागमा
मृत्यू	वटा	१	१	०	समाधान
जेल	संख्या	२	२	०	समाधान
स्वास्थ्य सम्बन्धि समस्या	संख्या	३	०	३	बोर्डमा रिफर क्यान्सर पिडित
हराएका (Missing)	संख्या	१	१	०	समाधान
गन्तव्य मूलुकमा काम, कम्पनी र सुविधा फरेक	संख्या	०	०	०	
अन्य	संख्या	१	१		परिवारको सम्पर्कमा नरहेको पछि आएका
जम्मा	संख्या	३०	१५	१३	२

न्यायमा पहुँच (ठगी सम्बन्धी केशहरुको प्रगती विवरण)

क्र.स	ठगी केशहरुको प्रकृति	गत बर्ष २०८१/८२ सम्मका केशहरु	आ.ब वर्ष २०८२/८३ का केशहरु	कै
१	गत बर्ष सम्मका केशहरु	३४ वटा	२२ वटा	
२	समस्याको समाधान भएका	१५ वटा	१० वटा	
३	विभागमा पठाएका केशहरु	५ वटा	२ वटा	
४	केहि रकम फिर्ता भएका केशहरु	४ वटा	१ वटा	
५	प्रकृत्यामा रहेका केशहरु	१० वटा	१२ वटा	
६	फिर्ता रकम (गत आ.व को २ वटा केशको यो वर्ष ७१९००० फिर्ता भएको)	४०३५०००/-	१३६५००००/- ९७९०००/- २३३४०००कुल /-	गतको बाँकी सहित

वार्षिक लक्ष्य र हाल क्रियाकलापगत उपलब्धीहरु

गतिविधि	इकाई	कार्यक्रमको लक्ष्य तथा प्रगति		अन्य
		लक्ष्य	प्रगती	
जिल्ला प्रशासन कार्यालय, आप्रवासी स्रोत केन्द्र रहेको स्थानीय तह, रोजगार सेवा केन्द्र, आप्रवासी स्रोत केन्द्र/उपकेन्द्र व्यवस्थापन समिति र नेपाल प्रहरीबीच अन्तरक्रिया कार्यक्रम	पटक	२	१	2 event/MRC & Sub MRC LG
स्थानीय तह कार्यक्रम कार्यान्वयन समितिको बैठक व्यवस्थापन बैठक	पटक	२	१	2 event/MRC & Sub MRC LG
स्थानीय तहका न्यायिक समिति, मेलमिलापकर्ताहरूसँग सुरक्षित वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी अन्तर्क्रिया कार्यक्रम	पटक	१	१	1 Event MRC LG
जिल्लातहमा वैदेशिक रोजगारी विषयवस्तु सम्बन्धमा सञ्चार माध्यम परिचालन	पटक	नियमित	नियमित	नियमित
अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी दिवसको उपलक्ष्यमा सचेतनामूलक तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम	पटक	१	१	1 event/LG
जिल्लातहमा जिल्ला प्रहरी र प्रहरी चौकीका इन्चार्जहरू लक्षित सुरक्षित वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रम	पटक	१	०	1 event/ MRC LG
सुरक्षित वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी अभिमुखीकरण तथा सूचना प्रवाह कार्यक्रम	पटक	२१	२१	12 event/LG old 21 event/LG New

वार्षिक लक्ष्य र हाल सम्मका उपलब्धीहरु

गतिविधि	इकाई	कार्यक्रमको लक्ष्य तथा प्रगति		अन्य
		लक्ष्य	प्रगती	
स्थानीय तहमा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका व्यक्तिहरूसँग वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रम	पटक	१	१	1 Event / LG New
स्थानीय तहको विषयगत समिति/शाखा प्रमुखहरूसँग सुरक्षित बैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी अन्तरकृया	पटक	१	१	1 Event / LG New
जिल्लास्तरमा सामी कार्यक्रमको वार्षिक समीक्षा गोष्ठी	पटक	१	०	
सामी कर्मचारीहरूको मासिक बैठक जिल्ला स्तरीय	पटक	१२	७	
जिल्ला तहमा सामी कार्यक्रमको समीक्षा तथा कार्ययोजना निर्माण	पटक	१	१	
आप्रवासी श्रमिक सञ्जाल बैठक	पटक	१	०	
सुरक्षित बैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी पत्रकारसँगको अन्तरकृया	पटक	१	०	

संघीय बजेट र कार्यान्वयनको अवस्था पौष मसान्तसम्म २०८२/०८३

स्थानीय तह	कुल बजेट	खर्च	प्रतिशत	बाँकी
भूमिकास्थान नगरपालिका, अर्घाखाँची	५,००,०००.००	२,०९,६६०.००	४१.८६	२,९०,३४०.००
शितगंगा नगरपालिका, अर्घाखाँची	५,००,०००.००	०	०	५,००,०००.००
सन्धिखर्क नगरपालिका, अर्घाखाँची	२४,००,०००.००	९,७८,७९३.००	४०.७८	१४,२१,२०७.००
छत्रदेव गाउँपालिका, अर्घाखाँची	५,००,०००.००	०	०	५,००,०००.००
पाणिनी गाउँपालिका, अर्घाखाँची	५,००,०००.००	१,९९,२५४.००	३९.८५	३,००,७४६.००
मालारानी गाउँपालिका, अर्घाखाँची	५,००,०००.००	६९,३६०.००	१३.८७	४,३०,६४०.००
	४९०००००	१४५७०६७	२९.७३	३४४२९३३

स्थानीय तहहरूको आ.व. ०८२।०८३ विनियोजित बजेट तथा कर्मचारी नियुक्ती अवस्था

क्र.सं.	स्थानीय तह	विनियोजित बजेट आ.व. ०८२।०८३	Vacancy Announce भएको	कैफियत
१	सन्धिखर्क नगरपालिका	७,०००००/-	नियुक्ती भएको	नियुक्ती भएको
२	भुमिकास्थान नगरपालिका	२,४३,११०/-	नियुक्ती भएको	नियुक्ती भएको
३	शितगंगा नगरपालिका	२,५५,१२६/-	नियुक्ती भएको	नियुक्ती भएको
४	पाणिनी गाउँपालिका	२,२५,७४५/-	नियुक्ती भएको	नियुक्ती भएको
५	मालारानी गाउँपालिका	३,०००००/-	नियुक्ती भएको	नियुक्ती भएको
६	छत्रदेब गाउँपालिका	२,५५,१२६/-	नियुक्ती भएको	नियुक्ती भएको
	जम्मा	१९,७७,९८१/-		

कार्यक्रम सञ्चालनका क्रममा आएका समस्या तथा समाधानका लागि गरिएका प्रयासहरू

समस्या तथा चुनौतीहरू	समस्या समाधानका लागि गरिएका प्रयासहरू
समयमै कर्मचारी नियुक्ती नहुँदा मनोसामाजिक परामर्श सेवामा कमजोर प्रतिफल रहेको ।	हाल सबै पदमा पदपूर्ती भएको ।
ठगी सम्बन्धी समस्या सहजीकरणमा पिडित पक्षद्वारा तत्काल परिणामको अपेक्षा रहनु ।	नियमित फलोअपबाट समस्या समाधानको प्रयास गरिएको ।
केश पहिचानको अवस्था पूर्व र पश्चात सेवाग्राहीबाट दैनिक जीवन यापनका लागि आर्थिक सहयोगको अपेक्षा रहनु ।	केशको अवस्था हेरी आवश्यक सहयोग प्रदान गरिएको ।

सफलताका कथा

कथा:- एक

कथाको प्रकृति:- **“माया मारेको पैसा पायौ”**

सेवाग्राहीको पृष्ठभुमी तथा समस्या:- **बैदेशिक रोजगारीका लागि छोरालाई बिदेश पठाउन छिमेकीसँग**

सयकडा २ का दरले ऋण लिएर पैसा बुझाएका थिए ।

सामी सँग कसरी जोडिन पुग्यो: **सामाजिक सञ्जालमा देखेर**

परिवर्तन के भयो ?

अर्घाखाँची जिल्ला भूमिकास्थान वडा नं.६ निवासी रमेश वि.क वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा दुवई जान भनी

ऋण धन **गरी २ लाख ६० हजार रुपैया** चिनजानेको साथीलाई बुझाए । सामान्य परिवारका रमेशले सय कडा २ का

दरले व्याज तिर्नेगरी ऋण खोजेको पैसा बुझाएपछि पनि बिदेश जान नपाउदा

उनको दिनको भोक रातको निन्द्रा समेत खोसिएको थियो।

कुराकानी गर्दै जाँदा साथीको भिनाजु पर्ने मालारानी गाउँपालीका वडा नं. ५ बस्नेले धेरै साथीहरुलाई पठाई

राम्रो काममा लगाइदिन्छन भन्ने सुनेको भरमा पैसा बुझाएका रमेशले २ वर्ष बितिसकदा पनि बिदेश पठाउने छाट

नदेखाएपछ तनाबमा थिए । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बैदेशिक रोजगारी ठगी बापदको पैसा उठाइदिने सामाजिक

सञ्जालमा थाहा पाएपछि उनी दिदीसँगै जिल्ला प्रशासन कार्यालय अर्घाखाँचीमा निवेदन दिन पुगेका थिए । **जिल्ला**

प्रशासन कार्यालय र आप्रवासी श्रोतकेन्द्रको पहल पछि पिडक परिवारलाई बोलाई लेनदेनको कागज गरेका थिए ।

त्यस पश्चात उनले भाखा नागेपछि भएपनि आफुले पाउनुपर्ने २ लाख ६० हजार पिडकबाट फिर्ता पाएका छन ।

लिखितमा दादै, जिल्ला मालारानी गाउँपालिका वडा नं ५ आरुखोर बस्ने प्रेमबहादुर कामीको नाती, तुलबहादुर सुनाखेछोरा वर्ष २७ को रमेश वि.क. र दरबारदेवीस्थान गाउँपालिका वडा ६ उपल्लो हटिया, गुल्मी निवासी हिमलाल सुनारको नाती, रामबहादुर सुनारको छोरा वर्ष २७ को मोहन सुनारबीच बीच वैदेशिक रोजगारीको प्रयोजनको लागि फरक फरक मितिमा नगद र बैंक मार्फत गरी रु १०००००/- (अक्षर रुपी रु एक लाख रुपैया मात्र) दिएकोमा उक्त कार्य नभएपछि आजको मितिले २०८२/०३/१६ गते भित्र एकमुष्ट लिने/दिने कुरामा दुवै सहमत छौं । साथै उक्त मिति सम्म रकम नदिएमा प्रचलित नियमानुसारको सावा ब्याज बुझाउने कुरामा हामी पिडित र पिडक पक्ष सहमत छौं ।

पिडक पक्ष
जिल्ला गुल्मी दरबारदेवीस्थान गाउँपालिका वडा ६ उपल्लो हटिया निवासी वर्ष २७ को मोहन सुनार
(१९६०४०)

पिडित पक्ष
जिल्ला मालारानी गाउँपालिका वडा नं ५ आरुखोर निवासी वर्ष २७ को रमेश वि.क.
(१९६७२३७४१)

बिहोद
जिल्ला गुल्मी दरबारदेवीस्थान गाउँपालिका वडा ६ बस्ने वर्ष २२ की सिमा वि.क. (मोहन सुनारको धीमती) (१९६७८८५१८)

जिल्ला अर्घाखाँची सन्धिखर्क नगरपालिका वडा नं ४ बाङ्गला बस्ने वर्ष २७ को अनुप परियार
(१९८४००७०३३१)

आप्रवासी श्रोतकेन्द्र अर्घाखाँची

इति सम्बत २०८२ साल ०२ महिना १६ गते रोज ६ शुभम् ।

कार्यक्रमका केही झलकहरू आप्रवासी श्रमिक सञ्जाल गठन



अन्तराष्ट्रिय आप्रवासन दिवशको अवसरमा बैदेशिक रोजगारीको क्रममा ज्यान गुमाएका परिवारको सम्झनामा दिप प्रज्वलन तथा सन्ततीलाई शैक्षिक सामग्री हस्तान्तरण



जिल्ला प्रशासन, आप्रवासी स्रोतकेन्द्र, प्रहरी तथा रोजगार सेवाकेन्द्रसँगको समन्वय बैठक



सरकार तथा बिभिन्न निकायहरुबाट हुने MRC अनुगमन तथा समन्वय



आप्रवासी श्रमिक सञ्जाल गठन तथा सुरक्षित बैदेशिक रोजगारी अभिमुखीकरण



सामी टिम अर्घाखाँचीको नियमित बैठक एवं स्वागतका झलकहरु



आप्रवासी श्रोतकेन्द्र, अर्घाखाँची (सुरक्षित बैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी परामर्श सेवा दिदै)



सुरक्षित बैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी समुदाय अभिमुखीकरण







वैदेशिक रोजगारीका सिलसिलामा ठगिएका १३ जनाले पाए रकम

अर्घाखाँची जेट ३१

वैदेशिक रोजगारीका सिलसिलामा ठगिएका सर्वसाधारणको २३ लाखभन्दा बढी रकम फिर्ता गरिएको छ। वैदेशिक रोजगारीमा पठाउँछु भन्दै पैसा लगेर फिर्ता नगरे अर्घाखाँचीका १३ जना सर्वसाधारणको २३ लाख २४ हजार ७६५ रूपैयाँ फिर्ता गरिएको हो। जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा रहेको सुरक्षित आप्रवासन केन्द्र (सामी) को पहलमा जिल्लाका विभिन्न स्थानका १३ जनाको रकम फिर्ता गराइएको छ।

चालु आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्म आप्रवासी स्रोत केन्द्रमा ३४ वटा ठगीका उजुरी परेकोमा १३ जनाको उजुरी फर्ख्यौट गरी रकम फिर्ता भएको हो। पाँचजनाको आशिक रकम फिर्ता भएको, तीनवटा उजुरी विभागमा पठाइएको, पाँचजनाको लेनदेनको कागज गरिएको र अन्यको फलोअपमा रहेको आप्रवासी स्रोत केन्द्र अर्घाखाँचीका कार्यक्रम संयोजक वसन्त श्रेष्ठले जानकारी दिए।

केन्द्रले सात हजार आठ सय ८१ जनालाई वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी परामर्श प्रदान गरेको छ। संयोजक श्रेष्ठका अनुसार वैदेशिक रोजगारीका क्रममा मृत्यु भएका, अंगभंग भएका तथा दुर्घटनामा

परेकाहरूको ६८ लाख ६९ हजार चार सय ३१ रूपैयाँ विमावापतको रकम उपलब्ध गराएको छ। सुरक्षित तवरले श्रम सम्भौता गरेर मात्र वैदेशिक रोजगारीमा जान तथा बाहिर जाने क्रममा कोही ठगिएको भए जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा रहेको आप्रवासी स्रोत केन्द्रमा उजुरी गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारी वेदप्रसाद खरेलले आह्वान गरेका छन्।

चालु आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्म आप्रवासी स्रोत केन्द्रमा ३४ वटा ठगीका उजुरी परेकोमा १३ जनाको उजुरी फर्ख्यौट गरी रकम फिर्ता भएको हो।

सात वर्षमा ५८ जनाले विदेशमै गुमाए ज्यान

अर्घाखाँचीबाट वैदेशिक रोजगारीमा गएकामध्ये विगत सात वर्षमा ५८ जनाले ज्यान गुमाएका छन्। रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएका अर्घाखाँचीका ५८ जनाले ज्यान गुमाएका हुन्। हालसम्म अर्घाखाँचीबाट ५७ हजार १२ जना वैदेशिक रोजगारीमा गएकामा ५८ जनाले ज्यान गुमाएको र ७४ जना अंगभंग तथा गम्भीर बिरामी परेको तथ्यांकमा उल्लेख छ।

यो संख्या श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूको मात्र हो। गैरकानुनी ढंगले जाने, प्रक्रिया पूरा नगरी वा पर्यटन भिसामा जाने तथा अध्ययन भिसामा जानेहरूको तथ्यांक भने फरक पर्न सक्ने स्रोत केन्द्रले जनाएको छ। अर्घाखाँचीबाट गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा आठ हजार आठ सय ५५ जना रोजगारीका लागि विदेश गएका थिए। कुल संख्याको आठ प्रतिशत महिलासमेत जिल्ला छडेर रोजगारीका लागि विदेश गएका छन्।

यसैगरी विदेशमा आर्जन गरेको पैसा विलासितामै खर्च हुने गरेको पाइएको छ। विदेशबाट पठाएको अधिकांश रकम दैनिक उपभोग्य सामान खरिदमै खर्च भएको तथ्यांकले देखाएको छ। विदेशबाट भित्रिएको पैसाको ७२.४० प्रतिशत रकम दैनिक घर खर्चमै गएको राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले जनाएको छ। यस्तै ऋण तिर्न १५.८ प्रतिशत, अध्ययनका लागि ४.६ प्रतिशत, घरजग्गामा १.९ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ। देराका ५६ प्रतिशत घरपरिवारले रेमिट्यान्स प्राप्त गर्छन्, जसमध्ये भविष्यका लागि सञ्चित गर्ने प्रतिशत दर १.९ प्रतिशत मात्र रहेको छ। नेपालमा आएको पैसाको अधिकांश रकम घर खर्च र विलासिता सामानमै खर्चिएको देखिन्छ।

रेमिट्यान्स विलासितामा बढी खर्च



प्रमनारायण आचार्य | अर्घाखाँची

नेपालबाट श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा जाने आप्रवासी कामदारको संख्या ७८ लाखभन्दा बढी छ। देशमा सीमित रोजगारीका अवसर, गरिबीलगायतका कारण वैदेशिक रोजगारीप्रति आकर्षित बढ्दो छ।

रोजगारीका लागि विभिन्न देशमा जाने मानिसको संख्या अझ बढी भए पनि श्रम स्वीकृतिविने भिजिट भिसा तथा अन्य इलिगल बाटो भएर जाने गरेका छन्। प्रतिवर्ष पाँच लाखभन्दा बढी मानिस श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेको लुम्बिनी प्रदेश सरकारका उद्योग पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालयका अधिकृत प्रदीप खनालले बताए। नेपालबाट दैनिक दुई हजारभन्दा बढी मानिस श्रम स्वीकृति लिएर विदेशिने गरेका छन्।

विदेशिने क्रम बढेसँगै आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १६.५ प्रतिशतले वृद्धि भई १४ खर्ब, ४५ अर्ब, ३२ करोड रूपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको छ। जुन जीडीपीको २५.३ प्रतिशत हो। नेपालबाट श्रम गर्न जाने मुख्य देहरू संयुक्त अरब इमिरेट्स, साउदी अरेबिया, कतार, मलेसिया, कुवेत, क्रोएसिया, रोमानिया, जापान, दक्षिण कोरिया र बहराइनलगायतका रहेको सामी कार्यक्रमका अधिकृत विष्णु अर्यालले जानकारी दिए। नेपालबाट १ सय ११ देशमा श्रम गर्न जान सकिने कानुनी मान्यता छ।

युवाको श्रमशक्ति विदेशिएसँगै नेपालमा पारिवारिक तथा सामाजिक रूपमा विभिन्न समस्याहरू पनि सिर्जना भएका छन्। स्वदेशमा नै रोजगारी गरी, वैदेशिक रोजगारीमा जाने भए सही सूचना लिएर र सीप सिक्ने मात्र जाडो भन्ने नाराका साथ सुरक्षित आप्रवासन (सामी) कार्यक्रमको आयोजनामा अन्तरसरकार समन्वय बैठक तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरूले रेमिट्यान्ससँगै समाजमा विभिन्न समस्या सिर्जना भएको बताएका छन्।

वर्षौं विदेशमा पसिना बगाएर घरमा आउँदा न त सम्पत्ति, न त श्रीमती हुने गरेको, अर्कोले कमाएको रकम खाइदिएपछि मानिसहरू डिप्रेसनमा जाने, घरमा भै-भगडा सुरु हुने, जसका कारण सम्बन्धविच्छेद गर्ने र केहीले आत्महत्यासमेत गर्ने गरेका घटनाहरू बढेको जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख

श्रम स्वीकृति लिएर विदेशिनेको संख्या ७८ लाख बढी

जीवनारायण कोइरालाले बताए। यस्ता घटना न्यूनीकरण गर्न सबै सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन्।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने मानिसको संख्या बढेसँगै विदेशमै मृत्यु हुने नेपाली कामदारको संख्यामा पनि वृद्धि भएको छ। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा वैदेशिक रोजगारीमा मृत्यु भएका १३ सय ४६ जना कामदारका हकवालालाई आर्थिक सहायता प्रदान गरेको तथ्यांक रहेको छ। बिरामी एवं अंगभंग भएका ६ सय ५३ कामदारलाई उपचार खर्च पनि प्रदान गरिएको थियो।

विदेशिने क्रममा दलालहरूबाट ठगिएको, एउटा काम भनेर लैजाने र अर्को काममा लगाउनेलगायतका विभिन्न घटनाहरू बढी रहेकोले सुरक्षित र लिगल प्रक्रियाबाट मात्र विदेश जान गाउँगाउँमा सचेतना अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारी बाबुराम अर्यालले बताए। कतै ठगिएको वा सोही प्रकृतिको समस्या परेका जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी गर्न आग्रह गरेका छन्।

विदेशबाट पठाएको रकम विलासितामा बढी खर्च भएको तथा सही सदुपयोग नभएकोले यस तर्फ सबैले ध्यान दिनुपर्ने सन्धिखर्क नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खिमामन्द भुसालले बताए। समाजमा आउने समस्यालाई पनि समाधान गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने सबैको कर्तव्य भएको उनको भनाइ छ। वैदेशिक रोजगारीबाट कमाएको रकम विलासिता र फजुल खर्चमा बढी बर्च भएकाले सदुपयोगका लागि वित्तीय साक्षरता तथा यससँग सम्बन्धित जानकारी गाउँगाउँमा सञ्चालन गर्नु पर्ने छत्रदेव गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजन पाण्डेले बताए।

अर्भै पनि अधिकांश मानिसहरूलाई श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारको घर फर्किएपछि निश्चित समयभित्र मृत्यु भएमा, जटिल रोग लागेमा वा अंगभंग भएको खण्डमा पनि केही राहत तथा उपचार खर्च पाइन्छ भन्ने थाहा छैन।

रेमिट्यान्सले फेरियो दैनिकी

वैदेशिक रोजगारीमा युवाहरूले कमाएको पैसा बढीजसो विलासिता र दैनिक उपभोग्य सामग्रीमा खर्च



प्रेमनारायण आचार्य

अर्घाखाँचीका अधिकांश गाउँमा विदेशबाट पठाएको रकमले मानिसहरूको दैनिकी फेरिएको छ। अधिकांश घरका मानिसहरू विदेश गएपछि कमाएको पैसाले गाउँका घरहरू पनि चिचिक्क पारिएका छन्। केही घरहरू आरसीसी गरेर बनाइएका छन्। अधिकांश घरहरू ढुंगा र टिनले छाएका देख्न सकिन्छ। खरले छाएका घरहरू फाट्टफुट्ट मात्र देखिन्छन्।

गाउँगाउँमा सडक खुलेसँगै अधिकांश सामग्री गाउँमा पाइन्छ। महिला, बृद्धबृद्धाहरूको हातमा समेत अधिकांशमा एन्ड्रोइड मोबाइल देखिन्छ। सबै घरमा बिजुली बत्ती पुगेको छ। घरघरे नेटको सुविधा छ। विदेशमा रहेका आफन्तसँग भिडियो कलमा कुरा हुन्छ। छोराछोरीहरूलाई बौडिङ स्कूलमा पठाएका छन्। खानपानमा मात्र हेन, उनीहरूको दैनिकी पनि फेरिएर सहरिया बनेको छ। अहिले गाउँगाउँमा पुगेका ट्याक्सी चढेर मानिसहरू सदरमुकाम तथा काम परेको स्थानमा पुग्ने गर्छन्। मोटरसाइकल नभएका घर कमे छन्। पहिले आफन्तले पैसा पठाएको खबर गरेपछि बिहानै फिससिमैसा उठेर गाडी चढेर सदरमुकाम जानुपर्छ तर अहिले आफ्नै गाँउमा खुलेका बैंक र सहकारीले सजिलै दिन्छन्। विदेशबाट पठाएको पैसाले अहिले गाउँको दैनिकी फेरिएको छ। रोजगारीका लागि विदेशमा गएका आफन्तले पठाएको विप्रेषणको रकमले उनीहरूको दैनिकी फेरिएको हो। गाउँगाउँमा पसलहरू खुलेका छन्। अर्घाखाँचीबाट मात्रै ५५ हजारको हाराहारीमा युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन्। वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवा तथा भारतमा काम गरेर कमाएको पैसाले स्थानीय स्तरमै स्वरोजगार पनि बनेका छन्। युरोप, अमेरिका, अष्ट्रेलिया, जापान लगायतका देशमा जाने युवायुवतीको संख्या यसमा समावेश गरिएको छैन। गैरकानुनी ढंगले जाने, प्रक्रिया पूरा नगरी वा पर्यटन भिसामा जाने तथा अध्ययन भिसामा जानेहरूको तथ्यांक कतै भेटिँदैन। अर्घाखाँचीबाट आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा ६ सय ३३ महिलासहित ९ हजार ५५ सय २६ जना रोजगारीका लागि विदेश गएका थिए। नेपालबाट श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा जाने आप्रवासी कामदारको संख्या ७८ लाखभन्दा बढी छ। देशमा सीमित रोजगारीका अवसर, गरिवी लगायतका कारण वैदेशिक रोजगारीप्रति आकर्षित बढी रहेको सन्धिखर्क नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय



अधिकृत खिमनन्द भुसालले बताए। गत आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा ७ लाख ७२ हजार ३ सय २७ रोजगारीका लागि विदेश गएका थिए। यो संख्या भएको १७ वर्षयताको उच्च संख्या हो। चालु आर्थिक वर्षको ज्येष्ठ मसान्तसम्म ६ लाख ९ हजार ६९९ जना कामका लागि विदेश गएका थिए। अहिलेसम्म विदेश जानेहरूमध्ये ९३ प्रतिशत जनसंख्या मलेसिया तथा खाडीमुलुकमा गएका छन्। बाँकी ७ प्रतिशत नागरिक जापान, बहराइन, कोरिया, ओएसिसिया लगायतका देशमा छन्। विदेशबाट पठाएको पैसामा ७२ प्रतिशत रकम घर खर्चमा भएको राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले जनाएको छ। यस्तै १५.८० प्रतिशत रकम ऋण तिर्न, ४.६० प्रतिशत छोराछोरीको अध्ययन र १.९० प्रतिशत रकम घरजग्गामा खर्च भएको छ। यसको १.९ प्रतिशत रकम बचत गरिएको छ। नेपालभरका ५६ प्रतिशत घरपरिवार र लुम्बिनी प्रदेशका ८९.६ प्रतिशत घरपरिवारले रेमिट्यान्स प्राप्त गर्छन्।

अर्घाखाँची विदेशबाट पैसा आउने जिल्लामध्ये अग्रपंक्तिमा पर्छ। तर, त्यो पैसा उत्पादनशील क्षेत्रमा लगाउने बलात्करण नहुँदा श्रम बेच्ने मानिस उत्पादन गर्ने काम मात्र भइरहेको छ। साथै बचत तथा ऋण सहकारी र अर्घाखाँची जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी सस्थाले दुई वर्ष अघि गरेको अनौपचारिक समझौताअनुसार जिल्लामा भित्रिएको रेमिट्यान्सको ८० प्रतिशत रकम विलासिता र अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च हुने गरेको छ। स्थानीय सरकारले व्यवसाय र स्वरोजगारमुखी कार्यक्रम ल्याउन नसक्दा पनि रेमिट्यान्सको पैसा बाहिर जाने गरेको छ। वार्षिक भन्डै साढे ७ अर्ब रुपैयाँ अर्घाखाँची भित्रने गरेको छ। त्यसमध्ये तीन ३ अर्ब ४० प्रतिशत रकम दैनिक उपभोग्य सामग्री, खानपान, मोटर साइकल, कार, इन्धन, लसाकपडा, मोबाइल, सञ्चार तथा टेलिफोनमा खर्च हुने गरेको छ। ४० प्रतिशत रकम अर्थात् ३ अर्ब रुपैयाँ उत्पादन हुने क्षेत्र अर्थात् घडैरी र घरमा खर्च हुने गरेको अर्घाखाँची जिल्ला बचत सहकारी सस्थाले अध्यक्ष तथा साथी सहकारीका अध्यक्ष प्रकाश भुसालले बताए। उनकाअनुसार जिल्ला सदरमुकाम, काँपलवस्तुका विभिन्न भाग तथा

रुपन्देहीको बटवल, भैरहवा, दाङ, चितवन र काठमाडौंमा घरघडैरी किन्नेमा खर्च भएको छ। विदेशबाट आएको रकमको २० प्रतिशत मात्र कृषिफर्म, सानाहोटल, किराना पसल र ट्याक्सी तथा बस जस्ता उत्पादनशील क्षेत्रमा खर्च भइरहेको छ। तर यस्तो व्यवसाय गर्नेहरूले पनि बौध्दमा व्यवसाय छाड्ने गरेका छन्।

वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवाहरूले कमाएको पैसा विलासिता र दैनिक उपभोग्य सामग्रीमा खर्च भएकोले उक्त रकम उत्पादनमूलक कार्यमा खर्च गर्नुपर्ने खालको नियम बनाएर अगाडि बढ्न सकेमा मात्र उत्पादनशील क्षेत्रमा खर्च भएकोले पनि काम गरिरहेका छन्। विदेशबाट फर्किएर गाउँमा कृषि र पशुपालन गर्ने युवाहरूलाई नगरपालिकाले प्राविधिक सहायताका साथै विभिन्न अनुदानका कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरिरहेको सन्धिखर्कका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भुसालले बताए। परम्परागत कृषि पेसालाई आधुनिक र प्रविधियुक्त बनाउन मिनी टिलर, कुटानी पिसानी मिल लगायतका सामग्रीहरू कृषकलाई हस्तान्तरण गरेको छ। विभिन्न तरकारीका विड मल आदि पनि प्रदान गर्दै आएको शीतगंगा नगरपालिकाका नगर प्रमुख छविदाल पोडेलले बताए।

प्रतिवर्ष ५ लाखभन्दा बढी मानिस श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेको लुम्बिनी प्रदेश सरकारका उद्योग पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालयका अधिकृत प्रदीप खनालले बताए। नेपालबाट दैनिक २ हजारभन्दा बढी मानिस श्रम स्वीकृति लिएर विदेश जाने गरेका छन्। यातायात मन्त्रालयका अधिकृत प्रदीप खनालले बताए। नेपालबाट दैनिक २ हजारभन्दा बढी मानिस श्रम स्वीकृति लिएर विदेश जाने गरेका छन्। विदेशिने क्रम बढेसँगै आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा १६.५ प्रतिशतले वृद्धि भई १४ खर्ब, ४५ अर्ब, ३२ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको छ। जुन जीडीपीको २५.३ प्रतिशत हो। नेपालबाट श्रम गर्न जाने मुख्य देसहरू संयुक्त अरब इमिरेट्स, साउदी अरेबिया, काता, मलेसिया, कुवैत, ओएसिसिया, रोमानिया, जापान, दक्षिण कोरिया र बहराइन लगायतका देश छन्। नेपालबाट १ सय ११ देशमा श्रम गर्न जान सकिने कानुनी मान्यता छ।

विदेशको सीपलाई स्वदेशी उत्पादनमा जोड्ने प्रयास

प्रेमनारायण आचार्य | अर्घाखाँची

वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका व्यक्तिहरूको जिल्लास्तरीय भेला सन्धिखर्कमा सम्पन्न भएको छ। सुरक्षित आप्रवासन (सामी) कार्यक्रमअन्तर्गत सन्धिखर्क नगरपालिकाद्वारा आयोजित स्थानीय तहमा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका व्यक्तिहरूसँग वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी अभिमुखीकरण तथा जिल्लास्तरीय भेला सन्धिखर्कमा सम्पन्न भएको हो। कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सन्धिखर्क नगर प्रमुख कृष्णप्रसाद श्रेष्ठले आप्रवासी कामदारले विदेशमा सिकेको सीपलाई स्वदेशमा आयआर्जन तथा उत्पादनको क्षेत्रमा जोड्नुपर्ने बताए। वैदेशिक रोजगारीको क्रममा सामी कार्यक्रम लागू हुनुभन्दा पहिला सूचना तथा परामर्श सेवा बिना जाँदा ठाँगेने जस्ता समस्याहरू भोग्नु परेको भन्दै एकपटक विदेश जाने व्यक्तिले आप्रवासी स्रोतकेन्द्रमा बुभेरेमा मात्र जान सुझाव दिए। वैदेशिक रोजगारीको क्रममा ठागीमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय र सहायता कक्षमा सम्पर्क राख्नुपर्ने बताउँदै आप्रवासी सञ्जालले पीडित



तथा जिल्लाका दूरदराजमा रहेका श्रमिकका समस्यालाई उजागर गरी काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए। सन्धिखर्क नगर उपप्रमुख मि श्रा आचार्यले सामी कार्यक्रमले वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन महत्त्वपूर्ण योगदान दिएको बताइन्। रेमिट्यान्सले नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिँदै आएको भन्दै वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र व्यवस्थित रहेको उनको भनाइ छ। निमित्त प्रशासकीय अधिकृत तथा सामी फोकल पर्सन मञ्जु खनालले वैदेशिक रोजगारीमा

देखिने समस्याहरू नेपाल सरकारले स्थानीय तहबाटै समाधान गर्ने र ठागीसम्बन्धी समस्याहरू जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट समाधान गर्ने व्यवस्थाले आप्रवासी परिवारलाई सहज हुँदै गएको बताइन्। खनालले आप्रवासी सञ्जाल र आप्रवासी कामदारले विदेशमा सिकेको प्रविधिलाई नेपालमा पनि स्थानान्तरण गर्नुपर्ने बताएकी छिन्। कार्यक्रममा सामी हेल्मटास नेपालका लुम्बिनी प्रदेश कार्यक्रम व्यवस्थापक विजय ठाकुर, कार्यक्रम अधिकृत जियाउल हक, आप्रवासी श्रमिक सञ्जालका प्रदेश अध्यक्ष रोशन गिरी, सामी जिल्ला कार्यक्रम

संयोजक वसन्त श्रेष्ठलगायतले आप्रवासी श्रमिक सञ्जालको अवस्था, सम्भावना तथा जिल्लामा भएका प्रमुख उपलब्धिहरूको बारेमा प्रकाश पारेका थिए। सोही भेलाले रामप्रसाद ढुंगानाको अध्यक्षतामा सात सदस्यीय आप्रवासी श्रमिक सञ्जाल जिल्ला समितिको गठन गरेको छ। जसको उपाध्यक्ष शीतगंगा नगरपालिकाबाट गणेश पोडेल, सचिवमा सन्धिखर्क-४ का कृष्णप्रसाद भुसाल र कोषाध्यक्षमा मालारानी गाउँपालिकाबाट रेनु भुसाल खनाल रहेका छन्। यस्तै, सदस्यहरूमा भूमिकास्थान नगरपालिकाबाट राजु श्रेष्ठ र पाणिनि गाउँपालिकाबाट दीपक बेल्लासे रहेका छन्। यस्तै, सन्धिखर्क नगरपालिकामा दानबहादुर रायमाझीको अध्यक्षतामा १३ सदस्यीय नगर आप्रवासी सञ्जालको गठन गरिएको छ। जसको उपाध्यक्षमा हरिबहादुर कुमाल, सचिवमा नारायण भुसाल, सहसचिवमा दामोदर श्रेष्ठ र कोषाध्यक्षमा मुमप्रसाद श्रेष्ठ रहेका छन्। सदस्यहरूमा बेलबहादुर कुमाल, भवीश्वर विश्वकर्मा र विष्णुप्रसाद श्रेष्ठलगायतका रहेका छन्।

आप्रवासी स्रोत केन्द्र, अर्घाखाँची



“स्वदेशमा नै रोजगारी गरौं वैदेशिक रोजगारीमा जाने भए, सही सूचना लिएर र सीप सिकेर मात्र जाऔं”

आप्रवासी स्रोत केन्द्र (सहायता कक्ष)

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सन्धिखर्क, अर्घाखाँची

सम्पर्क नं. ०७७-५५०१०७

Email: mrcarghakhanchi@gmail.com



५७४८८३५७६३



आप्रवासी स्रोत केन्द्र अर्घाखाँची



धन्यवाद !

कुनै जिज्ञाशा छ कि ?



सन्धिखर्क नगरपालिका
उद्योग तथा प्रवर्द्धन शाखाको
आ.व. २०८२/०८३ तेस्रो त्रैमासिक प्रगति समिक्षा

प्रस्तुतकर्ता:- पुष्पा भुसाल
उद्योग प्रवर्द्धन शाखा प्रमुख

सन्धिखर्क नगरपालिकाद्वारा प्रवर्द्धन गरिएका प्राइभेट तथा साझेदारी फर्महरू

फर्मको विवरण

संख्या

घरेलु तथा साना उधोग कार्यालयबाट हस्तान्तरण गरिएका जम्मा फर्म संख्या

२१२२

बाणिज्य तर्फ

१२७३

उधोग तर्फ

८४९

सन्धिखर्क न.पा.बाट दर्ता भएका जम्मा फर्म संख्या

६२९

बाणिज्य तर्फ

२६४

उधोग तर्फ

३६५

कुल जम्मा फर्म संख्या

२७५१

पुँजी वृद्धि फर्म संख्या

११८

आ.व. २०८२/०८३ श्रावण देखि बैशाख मसान्त सम्म नयाँ दर्ता तथा नविकरण भएका फर्म



सि. नं.	फर्मको विवरण	बाणिज्य तर्फ	उद्योग तर्फ	कुल जम्मा
१	नयाँ दर्ता फर्म संख्या	२९	२८	५७
२	नविकरण फर्म संख्या	६२	३८	१००
३	पुँजी वृद्धि फर्म संख्या	५	५	१०
४	खारेजी फर्म संख्या	१५	१८	३३
	व्यवशाय रजिष्ट्रेशन तथा नविकरण दस्तुर रु.			रु. २५,३८,५७०।-

फर्म दर्ता, नविकरण र खारेजी सम्बन्धि समस्या

- १- व्यवसायीहरूमा फर्म दर्ता, नविकरण र खारेजीको कानून व्यवस्था सम्बन्धि अनविज्ञता ।
- २- साना उद्योग गरिरहेका उत्पादित सामानको बजारिकरणको व्यवस्था नहुनु । जस्तै सावुन, अचार, डल कुसन, खुकुरी, चाउचाउ चाउमिन, टपरी उद्योग ।
- ३- फर्महरूले तोकिएको समयमा नविकरण नगर्ने ।
- ४- व्यवसायीहरूले सन्धिखर्क न.पा. र घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमा फर्म दर्ता गर्ने तर वडा कार्यालयमा व्यवसाय दर्ता तथा नविकरण नगरेको ।

फर्म दर्ता, नविकरण र खारेजी सम्बन्धि समस्याका समाधान तथा सूझाव

- १- व्यवसायीहरुमा फर्म दर्ता, नविकरण र खारेजी सम्बन्धि कानुनी सचेतना कार्यक्रम संचालन गर्नु पर्ने ।
- २- व्यवसायीहरुलाई व्यवसायीक परामर्श कार्यक्रम संचालन गर्नुपर्ने ।
- ३- उत्पादित सामानको बजारिकरणको व्यवस्थामा पहल गर्नु पर्ने ।
- ४- समय समयमा फर्महरु/ व्यवसाय अनुगमन गर्नुपर्ने ।



सन्धिखर्क नगरपालिका,
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय,
अर्घाखाँची ।

सामाजिक सुरक्षा तथा पञ्जिकरण शाखा

तेस्रो त्रैमासिक सम्मको प्रगति प्रतिवेदन

आ.व.२०८२/०८३

पंकज न्यौपाने
एम.आइ.एस. अपरेटर

सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी विवरण

क. लाभग्राही संख्या (तेस्रो त्रैमासिक सम्म)

क्र सं	लक्षित समुह	जम्मा संख्या	कैफियत
१	अन्य जेष्ठ नागरिक	२७२२	
२	जेष्ठ नागरिक (दलित)	४४८	
३	जेष्ठ नागरिक (एकल महिला)	५१५	
४	विधवा	७८३	
५	पूर्ण अपाङ्ग	२०३	
६	अति अशक्त अपाङ्ग	२४७	
७	दलित बालबालिका	५७२	
	जम्मा	५४९०	

सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी विवरण

ख. भत्ता वितरण विवरण (तेस्रो त्रैमासिक सम्म)

क्र सं	त्रैमासिक	जम्मा संख्या	रकम	कैफियत
१	प्रथम त्रैमासिक	५,४९९	५,१५,७२,६०८	
२	दोस्रो त्रैमासिक	५,५००	५,१६,२२,६८०	
३	तेस्रो त्रैमासिक	५,४९०	५,१४,०१,१४८	
४	चौथो त्रैमासिक अनुमानित संख्या र रकम	५,५७२ अनुमानित	३,९७,७३,५८९ वाँकी बजेट	१,६०,९४,०४९ नपुग रकम माग गरिएको

व्यक्तिगत घटना दर्ता विवरण (तेस्रो त्रैमासिक सम्म)

क्र सं	घटना प्रकार	संख्या	कैफियत
१	जन्म दर्ता	६०७ २०८	जम्मा भएको दर्ता त्यो अवधिमा जन्म भएको संख्या
२	मृत्यु दर्ता	२४९	
३	विवाह दर्ता	३१०	
४	बसाइँसराइ	५६०	
५	सम्बन्ध विच्छेद	४१	

धन्यवाद

नमस्ते





राष्ट्रीय रोजगार प्रवर्द्धन कार्यक्रम

स्थानीय तहमा सञ्चालित कार्यक्रमहरूको
समीक्षा र भावी योजना

पारिवारिक स्वास्थ्य तथा सहायता

स्वास्थ्य सहायता

वैदेशिक रोजगार बोर्ड मार्फत प्रदान गरिने पारिवारिक स्वास्थ्य उपचार सेवा अन्तर्गत यस अवधिमा ९ जना सेवाग्राहीको निवेदन बोर्डमा सिफारिस गरी पठाइएको छ।



Key point

बोर्डबाट आउने सहायताले विपन्न परिवारको उपचारमा ठूलो राहत पुऱ्याउँछ।



अङ्गभङ्ग र बिरामी सहायता



वैदेशिक रोजगारीको क्रममा बिरामी वा अङ्गभङ्ग भएका कामदारहरूको विवरण:

- जम्मा लाभग्राही: २ जना
- भुक्तानी प्राप्त: रु ४,२०,००० (१ जना)
- प्रक्रियामा रहेको: १ जनाको निवेदन दर्ता भएको

□ Remember

श्रम स्वीकृति लिएर गएका कामदारले मात्र यस्तो आर्थिक सहायता प्राप्त गर्न सक्छन्।


मृत्यु राहत र शैक्षिक छात्रवृत्ति

मृत्यु राहत विवरण

- १ जनालाई रु १० लाख राहत वितरण गरिएको।
- १ जनाको निवेदन दर्ता भई प्रक्रियामा रहेको।

सन्तति छात्रवृत्ति

- वैदेशिक रोजगारीमा मृत्यु भएका परिवारका ७ जना सन्ततिको छात्रवृत्तिका लागि निवेदन दर्ता भएको। हाल रकम उपलब्ध हुन बाँकी रहेको छ।

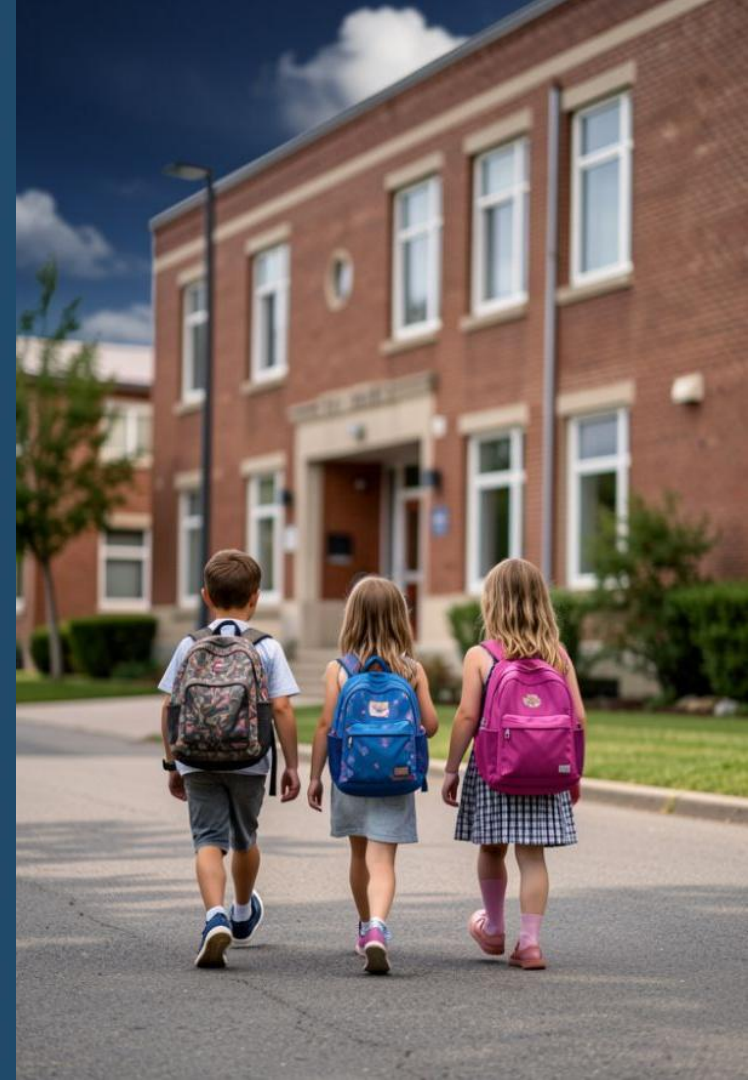

श्रम नवीकरण र उद्यमशीलता

श्रम नवीकरण

यस आर्थिक वर्षमा हालसम्म ३५६ जना श्रमिकहरूको श्रम नवीकरण कार्य सम्पन्न भएको छ।

उद्यमशीलता तालिम

फर्किएका कामदारहरूलाई स्वरोजगार बनाउन १५ जनाको तालिमका लागि निवेदन दर्ता गरिएको छ।



🔍 Example

विदेशमा सिकेको सीपलाई स्वदेशमै उद्यममा बदल्ने लक्ष्य राखिएको छ।



राष्ट्रिय रोजगार प्रवर्द्धन कार्यक्रम


नगरपालिका र संघीय सरकारको ५०/५० प्रतिशत साझेदारीमा कूल रु १०,६०,००० बजेट विनियोजन गरिएको छ। यसमध्ये संघीय सरकारको रु ५,३०,००० ज्याला भुक्तानीमा खर्च गरिनेछ।



Key point

यो कार्यक्रमले स्थानीय स्तरमा रोजगारी सिर्जना र पूर्वाधार विकास दुवैलाई समेट्छ।

पूर्वाधार विकास र योजना



योजना छनौट

वडा नं. १ र २ मा सडक नाली स्तरोन्नति गर्ने निर्णय।

प्राविधिक स्टिमेट

हाल योजनाको प्राविधिक स्टिमेट तयार गर्ने प्रक्रियामा रहेको।

अतिरिक्त बजेट उपयोग

ज्यालाबाट बँचेको रकम अन्य वडाहरूमा 'बर्खेबाटो मर्मत' मा खर्च गरिने।

वैदेशिक रोजगारी तर्फ

Question 1:

यस आ.व. मा हालसम्म कति जनाको श्रम नवीकरण भएको छ?

Answer 1:

३५६ जना

Question 2:

राष्ट्रिय रोजगार प्रवर्द्धन कार्यक्रमको जम्मा बजेट कति हो?

Answer 2:

रु १०,६०,००० (नगरपालिका र संघको साझेदारी सहित)

Question 3:

छात्रवृत्तिका लागि कति जनाको निवेदन दर्ता भएको छ?

Answer 3:

७ जना



Answers on the next slide...

रोजगार सेवा केन्द्र

आगामी लक्ष्यः ५८५ नयाँ रोजगारी

अर्को आर्थिक वर्षमा रोजगारीमा खटाउनका लागि ५८५ जनाको निवेदन वडा कार्यालयहरू मार्फत संकलन गरी अनलाइन प्रणालीमा प्रविष्टि (Entry) गरिएको छ।



Fun fact

डिजिटल प्रणालीले रोजगारी वितरणमा पारदर्शिता सुनिश्चित गर्दछ।



छलफलको विषय



स्थानीय स्तरमा 'बर्खेबाटो मर्मत' र 'नाली स्तरोन्नति' जस्ता योजनाले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकालाई कसरी जोड्न सकिन्छ?



You might have said...

फर्किएका कामदारको प्राविधिक सीपलाई सुपरिवेक्षणमा प्रयोग गर्ने
ज्याला मार्फत उनीहरूको तत्कालको आयआर्जनमा सहयोग पुऱ्याउने
स्थानीय पूर्वाधार निर्माणमा उनीहरूको अपनत्व महसुस गराउने

गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम (मेड्पा)



गरिबी निवारणका लागी लघु उद्यम विकास कार्यक्रम (मेड्पा) २०८३ तेस्रो त्रैमासिक प्रगति समिक्षा

गरिबी निवारणका लागी लघु उद्यम विकास कार्यक्रम
(मेड्पा)

- ▶ स्थान: सन्धिखर्क नगरपालिका कार्यालय
- ▶ मिति: २०८३/०१/३१ गते

- ▶ प्रस्तुतकर्ता:
- ▶ अनिता रावत
- ▶ उद्यम विकास सहजकर्ता

आ.व. ०८२/०८३ तऱस्रो त्रैमासिक हालसम्मको प्रगति विवरण

क्र.स	कार्यक्रम	बजेट	खर्च रकम	खर्च प्रतिशत
१.	मेडपा विभिन्न कार्यक्रमहरु	१३०००००	४१५५२०	३२%

आ.व. ०८२/०८३ तेस्रो त्रैमासिक मिति: २०८३/०२/०३

क्र.स	कार्यक्रम	बजेट	खर्च रकम	खर्च प्रतिशत
१.	मेडपा कार्यक्रमको अभिमुखिकरण	९७००	९६८०	९९.७९%
२.	सहभागित्मक ग्रामिण लेखाजोखा (पि.आर.ए)	११५००	११४६०	९९.६५%
३.	उद्यमशीलता विकास तालिम	५५४६०	५५३६०	९९.८२%
४.	स्तरोउन्नती व्युटी पार्लर सीप विकास तालिम	६३०००	भुक्तानी प्रक्रियामा	
५.	स्तरोउन्नती सिलाई कटाई सीप विकास तालिम	६७०००	भुक्तानी प्रक्रियामा	
६.	स्तरोउन्ती सिलाई कटाई समुहका सदस्यलाई प्रविधि हस्तान्तरण	७५०००	भुक्तानी प्रक्रियामा	
७.	स्तरोउन्ती व्युटी पार्लर समुहलाई प्रविधि हस्तान्तरण	६५०००	भुक्तानी प्रक्रियामा	

नयाँ सिर्जना तर्फ आ.व ०८२/०८३ अर्धवार्षिक समिक्षा मिति: २०८३/०२/०३

क्र.स	क्रियाकलापहरु	महिला	पुरुष	जम्मा प्रगति	रकम
१.	अभिमुखिकरण	३६	१०	४६ जना	९७००
२.	सहभागित्मक ग्रामिण लेखाजोखा (पि.आर.ए)	४८	१	४९ जना	११५००
३.	उद्यमशिलता विकास तालिम	३२	०	३२	५५४६०
४.	स्तरोउन्नती सीप विकास तालिम	२२	२२	२२	१३००००
५.	प्रविधि हस्तान्तरण (२ वटा समुहमा)	१५	०	१५ जना	१४००००

स्तरोउन्नति तर्फः

क्र.स	क्रियाकलापहरु	महिला	पुरुष	जम्मा संख्या	जम्मा बजेट
१.	स्तरोउन्नति व्युटी पार्लर र सिलाई कटाई सीप विकास तालिम	२२	०	२२	१३००००
२.	समुहमा प्रविधि हस्तान्तरण (२ वटा समुहमा १५ जना)	१५ जना	०	१५ जना	१४००००

१. सीप सिलाई कटाई तालिममा - १२ जना
२. सीप व्युटी पार्लर तालिममा - १० जना
३. प्रविधि हस्तान्तरण व्युटी पार्लर समुहलाई - १० जना
४. प्रविधि हस्तान्तरण सिलाई कटाई समुहका सदस्य- ५ जना

मेडपा कार्यक्रमको अभिमुखिकरण कार्यक्रम तस्विरहरु



सहभागितात्मक ग्रामिण लेखाजोखा (पि.आर.ए) तस्विर



उद्यमशिलता विकास तालिम (SIYB) तस्विरहरु



स्तरौउन्नती व्युटी पार्लर सीप विकास तालिमको तस्विरहरु



स्तरोउन्नती व्युटी पार्लर र सिलाई कटाई समुहमा प्रविधि हस्तान्तरण तस्विरहरु



“नमस्कार”



धन्यवाद



सन्धिखर्क नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
सन्धिखर्क, अर्घाखाँची



भवन तथा शहरी विकास उपशाखा

भवन निर्माण इजाजत तथा नियमनको प्रगति प्रतिवेदन

 नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

 आव 2022/83 प्रगति समीक्षा

सेवा प्रवाह तथा भौतिक प्रगति विवरण

कार्यसम्पादन अवस्था



1. नक्सा दर्ता (Design Submission)

दर्ता भरका कुल नक्सा आवेदनहरू

70

फाइलहरू



2. प्लिनथ लेभल इजाजत / नक्सा पास

DPC सम्मको अस्थायी निर्माण स्वीकृति

35

स्वीकृत



3. सुपरस्ट्रक्चर इजाजत (Superstructure)

डीपीसी माथिको स्थाई निर्माण स्वीकृति

15

स्वीकृत



4. निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र (Completion)

अन्तिम प्रमाण-पत्र वितरण तथा अभिलेख

5

जारी

स्वामित्व हस्तान्तरण (नामसारी)

यस अवधिमा नक्सा पास भई वा निर्माण सम्पन्न भई कुल 1 (एक) वटा भवनको नियमानुसार नामसारी (स्वामित्व हस्तान्तरण) कार्य सफलतापूर्वक सम्पन्न गरिएको छ।

प्रगतिको सापेक्षिक अनुपात

(नक्सा दर्ता 70 को तुलनामा)

प्लिनथ लेभल इजाजत

50% (35)

सुपरस्ट्रक्चर इजाजत

21% (15)

निर्माण सम्पन्न प्रमाण-पत्र

7% (5)
