

सन्धिखर्क नगरपालिका नगरकार्यपालिकाको कार्यालय सन्धिखर्क, अर्घाखाँची

आ.व. २०७८।७९ को वार्षिक समीक्षा कार्यक्रमका
प्रगति प्रतिवेदन
२०७९ कार्तिक

सन्धिखर्क नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
सन्धिखर्क, अर्घाखाँची

सन्धिखर्क नगरपालिका, अर्घाखाँचीद्वारा आयोजित
आ.व. २०७८।७९ को वार्षिक समीक्षा कार्यक्रमका
लागि तयार पारिएको प्रस्तुति


२४ कार्तिक २०७९

प्रस्तुतकर्ता
डिल कुमार के .सी.
कम्प्यूटर अधिकृत

सन्धिखर्क नगरपालिकाको प्रशासकीय भवन



अर्घाखाँची जिल्ला
सन्धिखर्क नगरपालिका

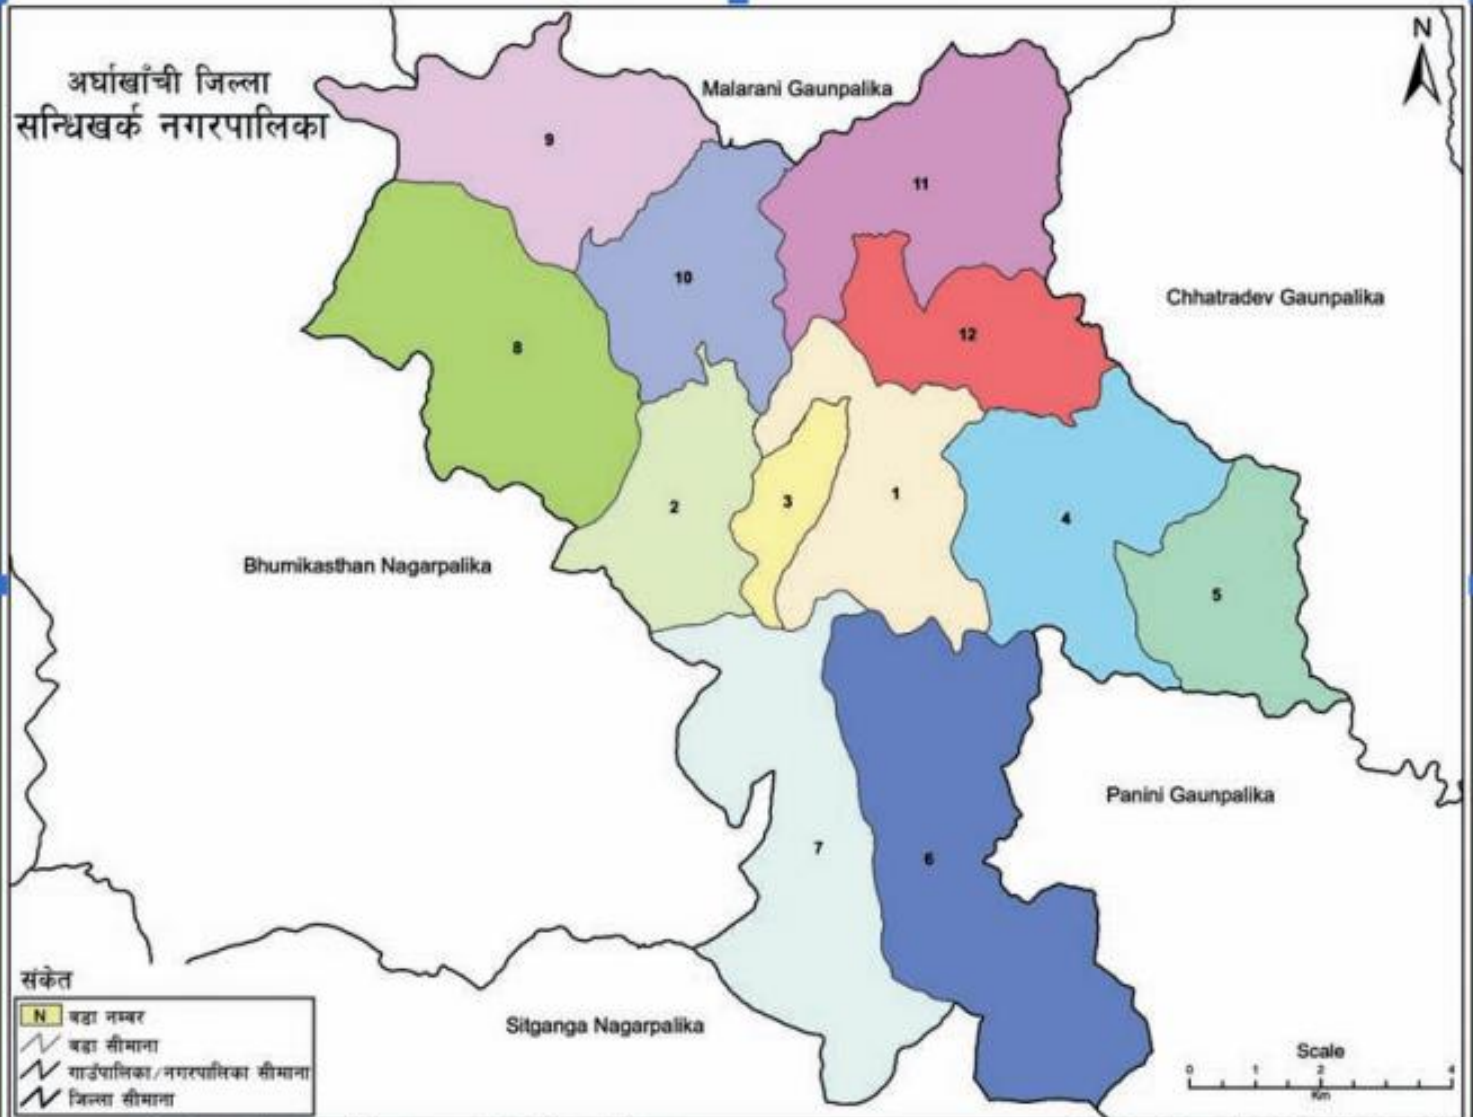

स्रोत: स्थलरूप नक्सा (स्केल १:२२०००/१:२००००), वापसी विभाग र जनगणना २०६८, केन्द्रिय तथ्यांक विभाग
तयार पार्ने: गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, सरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संस्था तथा सीमाना निर्धारण आयोग

१) बजेटका श्रोतहरु तर्फ

सि.नं.	विवरण	रकम रु
१	समानीकरण अनुदान (संघ)	१४,१०,००,०००
२	राजश्व बाँडफाँड(संघ)	९,३८,००,०००
३	संघीय शसर्त	४५,३९,७५,६८०
४	बिशेष अनुदान (संघ)	१,६६,००,०००
५	समपुरक अनुदान (संघ)	२,०६,००,०००
६	समानिकरण अनुदान (प्रदेश)	६६,७२,०००
७	राजश्व बाडफाँड (प्रदेश)	२,२७,६३,०१०
८	शसर्त अनुदान (प्रदेश)	१,२५,४४,०००
९	बिशेष अनुदान (प्रदेश)	९०,००,०००
१०	समपुरक अनुदान (प्रदेश)	२,००,००,०००
११	अन्य अनुदान (संघ र प्रदेशबाट) अन्तर सरकारी अख्तियारी समेत	२२,८९,५८,६८८
११	आन्तरिक राजश्व (संचिक कोष सहित)	११,५२,०१,७९९
	जम्मा	१,१४,११,१५,१७७

२) वित्तीय प्रगति

सि.नं	विवरण	स्वीकृत बजेट	बजेटको श्रोत	निकासा	खर्च	प्रति शत
क)	चालू	६३२३११४४८	संघ, प्रदेश र आन्तरिक	५७४८५८९०	५७४८५८९०	९१.४९
ख)	पूँजीगत	५०८८०३७२९		४३९५४६५४५	४३९५४६५४५	८६.३९
	जम्मा	११४१११५१७७		१०१८०३२४३६	१०१८०३२४३६	८९.२१

- ३) क) भौतिक प्रगति (योजना शाखाको): ९९.२ प्रतिशत
ख) वित्तीय प्रगति (योजना शाखाको): ९७.०१ प्रतिशत

४) योजना सम्बन्धी विवरण

- क) रु. १ लाख भन्दा कम लागतका योजना संख्या: ३८८
ख) रु. १ लाख देखि ५ लाखसम्मको लागत भएका योजना संख्या: ३७८
ग) रु. ५ लाख देखि १० लाखसम्मको लागत भएका योजना संख्या: ६३
घ) रु. १० लाख भन्दा माथिको लागतका योजना संख्या: ३७
ङ) कुल सम्पन्न योजना संख्या: ८६६

योजना शाखा अन्तर्गत क्षेत्रगत वनियोजित बजेट तथा खर्च

स.न .	योजना/कार्यक्रमको नाम	अनुदान रकम रु.	सम्पन्न खुद भुक्तानी रकम.	प्रगति प्रतिशत
१	आर्थिक विकासतर्फ	२४००४००	२४००४००	१००
२	सामाजिक विकासतर्फ	५३३३३३८६	५१९१५३६२	९७.३४
३	भौतिक पुर्वाधार विकासतर्फ	२३१३२५८०१	२२५१३६०७१	९७.३२
४	वातावरण तथा वपद् व्यवस्थापनतर्फ	५३९९२६९.३	५१७६०४५.१	९५.८७
५	सस्थागत विकास सेवा प्रवाह र सुशासनतर्फ	६९१४६६०	६८८४१८०	९९.५६
	जम्मा	२९९३७३५१६	२९१५१२०५८	९७.३७

नगरपालिकाको समग्र क्षेत्रगत प्रगति

क्र.सं.	विषयगत क्षेत्र	विनियोजित बजेट			यथार्थ खर्च			खर्च प्रतिशत
		चालु	पूँजीगत	कुल	चालु	पूँजीगत	कुल	
1.	भौतिक पूर्वाधार विकास	9511000	333334679	342845679	8598600	301896315	310494915	91
2.	सामाजिक विकास	318566000	99117840	417683840	290919941	85550583	376470524	90
3.	आर्थिक विकास	15040000	42129610	57169610	13081094	25392962	38474056	67
4.	वन, वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन	0	4305400	4305400	0	3750440	3750440	87
5.	सुशासन तथा संस्थागत विकास	111036200	13916200	124952400	88244532	8903755	97148287	78

सम्पन्न मुख्य मुख्य योजनाहरू

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा सम्पन्न भएका मुख्य मुख्य योजनाहरू

सि. न.	योजना / कार्यक्रमको नाम	अनुदान रकम रु.	भुक्तानी रकम .	प्रगति प्रतिशत
१	वडा नं. ७ का सम्पूरण मोटरबाटो मर्मत तथा अन्य	१२०००००	११९७७५१	१००
२	जाडीखोला हटिया जरेखोला मोटरबाटो स्तरोन्नती	१००००००	१००००००	१००
२	खाँची फुदवाङ देउराली मोटरबाटो	१५०००००	१५०००००	१००
३	अर्घा दरवार संरक्षण तथा पुननिर्माण सनपा-९	१५०००००	१५०००००	१००
४	सरला मार्ग स्तरोन्ती	१७०००००	१७०००००	१००
५	ज्ञानप्रकाश मा.वि. भवन निर्माण	१७६६३८३	११८०९९२	६६.८६
६	नगर सडक गुरु योजना	२००००००	१८४९५८४	९२
७	साना सिचाइ पूर्वाधार निर्माण (ठूलटारी सिंचाइ)	२००००००	२००००००	१००
८	वडा कार्यालय प्रशासनिक भवन निर्माण सपना-२	२२०००००	१७४९२१६	८०
९	अर्लादी ट्रस वृज स्टिल पार्टस आपूर्ति कार्य	३३६७७२०	३३६७७१९	१००
१०	अरनिको आ.वि. चारकोठे भवन निर्माण	३४५८४८५	३४५७८३८	९९.९८
११	कुर नेटा वेहोरे ढोरपाटन सडक	३४६१३४९	२४६१३००	७१.११

क्रमशः

सि. न.	योजना / कार्यक्रमको नाम	अनुदान रकम रु.	भुक्तानी रकम .	प्रगति प्रतिशत
१२	चन्द्र प्रभा मा.वि. चारकोठे भवन निर्माण	३५४४५६४	३५४३५६३	९९.९७
१३	दुवार गच्छे पशु सेवा कार्यालय हटारी सन्धिखर्क चुत्रावेसी सडक स्तरोन्नती	३९०२६३३	२७९५८९८	७१.६४
१४	अर्घा भगवती मन्दिर संरक्षण कार्य सनपा-९	४१०००००	४०८४६८०	१००
१५	जगत हटारी गौतमबुद्धमार्ग सन्धिखर्क चुत्रावेसी (बजारका भित्रीबाटाहरु समेत)	५९८९००५	५१४७०९२	८५.९४
१६	सभाहल सहितको अधुरो प्रशासनीक भवन निर्माण	७५०००००	७५०००००	१००
१७	चुत्रावेसी अर्घा मो.बा.	८२८१०४६	८२८१०४६	१००
१८	औद्योगिकग्राम निर्माण कार्य	८८९९०६८	८८९७०५७	९९.९८
१९	वडा कार्यालय भवन निर्माण सनपा ३,४,९ र ११	१४६६७१९९	१४६६७१९९	१००
२०	विद्याविनय आधारभूत विद्यालय भवन निर्माण सनपा-६	१६६०००००	१६६०००००	१००
२१	चुत्रावेसी भक्तीटोला धरमपानी अर्घा मैदान सडक	२०६०००००	२०६०००००	१००
२२	कोल्ड स्टोर भवन निर्माण सनपा-१	२४००००००	२३७९९७३०	९९
२३	मिलमिले सल्लीकोट खानेपानी म्याचिङ	४३०००००	४३०००००	१००

प्रदेश समपुरक अनुदानबाट संचालित योजनाहरुको प्रगति विवरण

स.न.	कार्य विवरण	वार्षिक बजेट	वार्षिक खर्च	खर्च प्रतिशत	भौतिक प्रतिशत
१	गंगा सरोवर ताल स्तरोन्नती तथा निर्माण	५००००००	५००००००	१००	१००
२	अर्घा भगवती मन्दिर संरक्षण पूर्वाधार	१५००००००	१५००००००	१००	१००
३	बिहार कवरा धार लहरेबाद भै सथला जो गमारे मोटरवाटो	५००००००	५००००००	१००	१००
४	सद्धेश्वर टोलका भित्रि बाटा र शान्तिनगर टोल सुधारका भित्रि बाटाहरु	५००००००	५००००००	१००	१००
५	ठुलटारी -रिड्दी -मथुरा लब्दी हुदै भूडभूडगे कृष सडक	५००००००	४९८६८९०	९९.९३	१००
६	घोचेखोला पकले मोटरवाटो	५००००००	५००००००	१००	१००
७	मल मले -सल्लीकोट - लादाम मोटरवाटो	५००००००	५००००००	१००	१००
८	डम्पिङ साइट पूर्वाधार निर्माण	५००००००	५००००००	१००	१००

शहरी शासकीय तथा पूर्वाधार आयोजना तर्फका योजनाहरुको प्रगति प्रतिवेदन

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा शहरी शासकीय तथा पूर्वाधार आयोजना अन्तर्गतका मुख्य मुख्य योजनाहरुको विवरण						
सि. न.	योजना /कार्यक्रमको नाम	वडा न.	बार्षिक बजेट	भुक्तानी रकम	वित्तीय प्रगति %	कार्यान्वयन
१	उल्टेकुला बगैँचा पक्की नाली निर्माण र मुक्ती आ.वि. भवन तथा शौचालय मर्मत	७	५०००००	४९९०२०	१००	उपभोक्ता समिति
२	प्लस टु भवनमुनी पहिरो नियन्त्रण तथा भगवती आ.वि. मेशिनरी वाल निर्माण	७	५०००००	४८३१६१	९७	उपभोक्ता समिति
३	फुदवाड खाँचीखोला मो.वा. तार तथा पक्की नाली निर्माण	७	५०००००	५०००००	१००	उपभोक्ता समिति
४	चौतारादेखि कुडहरसम्म घर संरक्षण बाल भर्लेनीमाथि बाल निर्माण गहते राना टोला विकटोला ठकुरीटोला र कुड स्वार चुँदाली टोला गोरेटो बाटो निर्माण	११	५१७०००	५१७०००	१००	उपभोक्ता समिति
५	धनेहटियादेखि गोइपोखरी अर्नासम्म सिढी निर्माण र गच्छाली टोलामा ढुङगा सेलिड कार्य	११	५१७०००	५१७०००	१००	उपभोक्ता समिति
६	रानीपोखरा आमडाँडा कोटफेरा मसुरखोला कुसुनडाडा भक्तिटोला मोटरबाटो पक्की नाली तथा पर्खाल निर्माण	४	५६४०००	५६४०००	१००	उपभोक्ता समिति
७	सारनटारी हाईटटारी पण्डित खेत सिंचाइ कुलो	१०	५६४०००	५६४०००	१००	उपभोक्ता समिति
८	खोल्टेपानी पहिरो व्यवस्थापन र धरम्पानी भगवतीडाँडा मोटर बाटो	१०	५६४०००	५६४०००	१००	उपभोक्ता समिति

क्रमशः

सि. न.	योजना /कार्यक्रमको नाम	वडा न.	बार्षिक बजेट	भुक्तानी रकम	वित्तीय प्रगति %	कार्यान्वयन
९	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र निर्माण र ठूलाचौर अधुरो प्रतिक्षालय निर्माण	११	५६४०००	५६४०००	१००	उपभोक्ता समिति
१०	जोगीमारे कोलडाँडा मन्दिर निर्माण र ढाँडपोखरी जुलुके मन्दिर जाने गोरेटोबाटो निर्माण	११	५६४०००	५६४०००	१००	उपभोक्ता समिति
११	शशिधर स्वामी शिवालय मन्दिर सिढी तथा गेट तथा तल्लाहिले उकालो मोटरबाटो	९	६०००००	६०००००	१००	उपभोक्ता समिति
१२	खरिपाटा आमडाँडा नत्रेकापोखरी माझहटिया भुमिकाथान मनेटा पधेरो पोखरी तथा तटबन्ध निर्माण	४	६३४५००	६३४५००	१००	उपभोक्ता समिति
१३	साविक १,२ र ३ वडाका शाखा सडक मर्मत तथा जाली	६	६५८०००	६५८०००	१००	उपभोक्ता समिति
१४	वडा कार्यालय तथा स्वास्थ्य चौकी संरक्षण बाल निर्माण तथा तारजाली व्यवस्थापन र स्वार ठाडो बाटो निर्माण	११	६५८०००	६५८०००	१००	उपभोक्ता समिति
१५	हर्सिङखोर विहार सिंचाइ कुलो	१०	७५२०००	७५२०००	१००	उपभोक्ता समिति
१६	नगरपानी सतिनेटा पोखेडाडा मोटरबाटो ग्रावेल तथा कच्ची नाली स्तरोन्नती	६	७५२०००	७५२०००	१००	उपभोक्ता समिति

क्रमशः

सि. न.	योजना / कार्यक्रमको नाम	वडा न.	वार्षिक बजेट	भुक्तानी रकम	वित्तीय प्रगति %	कार्यान्वयन
१७	टुनीपोखरा छाप आदित्यपुर अमलडाँडा भण्डारी पोखरा सन्यासथुम झाक्रीकाथान ढाक्रेपानी भवन तथा प्रतिक्षालय मर्मत निर्माण	४	७७५५००	७५५५००	९७	उपभोक्ता समिति
१८	सुरक्षा सामग्री खरिद आपूर्ति	०	८३१९३२	८१९९९८	९९	उपभोक्ता समिति
१९	कोट मालिकादेवि राधाकृष्ण गहते मन्दिर मर्मत तथा निर्माण	४	८४६०००	८४६०००	१००	उपभोक्ता समिति
२०	ओलेन्दी ट्रस तथा इन्टेक, काफलपानी खानेपानी टंकी र फिल्ड निर्माण तथा आतेकासाहु नौलापानी चप्रुड मो.वा.	९	९०००००	९०००००	१००	उपभोक्ता समिति
२१	सरला मार्ग दहपाटा स्वामीकारुख खण्ड स्तरोन्नती	३	९४००००	९४००००	१००	उपभोक्ता समिति
२२	सिद्धेश्वर टोल सुधार भित्र नाली निर्माण	२	९४००००	९३२४९२	९९	उपभोक्ता समिति
२३	भगवती मा.वि. कुर प्रवेशद्वार निर्माण र कुर धनेको चौपारी निर्माण र चौतारा पोखरी मर्मत संभार	२	९४००००	७८८१७१	८४	उपभोक्ता समिति

क्रमशः

२४	घोचेखोला रामचन्द्र बन्जाडेको घरदेखि तल खोलामा चेकड्याम र भद्रीपाखो पँधेरोमा वाल निर्माण तथा डिल्लीराज बन्जाडेको घरको उत्तर तर्फ र अगाडी तर्फ मेसिनरी वाल निर्माण	२	९४००००	७९१३७५	८४	उपभोक्ता समिति
२५	जिमुरथुम गायत्रीटोला बस्यालटोला टाकुरा मो.बा. ग्रावेल तथा स्तरोन्नती	१२	९४००००	९४००००	१००	उपभोक्ता समिति
२६	ज्ञान प्रकाश मा.वि. बाटो तथा भवन मर्मत तथा सल्लीकोट जरेखोला बाटो मर्मत र कच्ची नाली निर्माण	१२	९४००००	९४००००	१००	उपभोक्ता समिति
२७	जिमुरथुम मन्दिर संरक्षण पूर्वाधार	१२	९४००००	९४००००	१००	उपभोक्ता समिति
२८	गुन्टेखोला किरियापुत्री भवन निर्माण	१	९४००००	९४००००	१००	उपभोक्ता समिति
२९	हाते औजार खरिद	०	१००५८६०	१००५८५९	१००	उपभोक्ता समिति
३०	सरला मार्ग सालघारी घुम्टी अलुवाखोला खण्ड स्तरोन्नती	३	१८८००००	१८८००००	१००	उपभोक्ता समिति
३१	पकले पौवा अधुरो भवन निर्माण र नाली तथा गोरेटो बाटो निर्माण	८	१८८००००	१८८००००	१००	उपभोक्ता समिति
३२	अन्य ५ लाख भन्दा साना योजनाहरू	०	२९९५२२०८	२९२३३४३१	९८	उपभोक्ता समिति
	जम्मा		५५००००००	५३९२३५०७	९८	

क्रमशः

प्रगति प्रतिवेदनको साराश			
जम्मा छनौट भएका योजना संख्या	90	श्रमिकहरुले जम्मा कार्य गरेको दिन	34902
जम्मा कार्यान्वयन भएका योजना संख्या	90	जम्मा रोजगार भएका श्रमिकको संख्या	1382
जम्मा विनियोजित बजेट	55000000	जम्मा रोजगार भएका मध्ये दक्ष श्रमिक संख्या	230
जम्मा खर्च रकम	53923507	जम्मा रोजगार भएका मध्ये अर्धदक्ष श्रमिक संख्या	1152
वित्तिय प्रगति प्रतिशत	98.04	जम्मा रोजगार भएका मध्ये महिला श्रमिक संख्या	790
भौतिक प्रगति प्रतिशत	100	अप्रत्यक्ष फाइदा भएको जम्मा जनसंख्या	59580
ज्यालामा भुक्तानी भएको रकम	५७ 30780503	प्रत्यक्ष फाइदा भएको जनसंख्या	4608
निर्माण सामाग्री तथा अन्य खर्च	४३ 23143004	सम्पूर्ण श्रमिकहरुको ज्याला रकम खातामा भुक्तानी भएको	

शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखाबाट सम्पादित मुख्य मुख्य योजना/कार्यक्रमहरु

सि.नं	योजना कार्यक्रमको नाम र स्थान	विनियोजित बजेट	खर्च भएको बजेट	कार्यान्वयन ढाँचा(ठेक्का,उपभोक्ता समिति,साझेदारी)
१	नमुना विद्यालय शैक्षिक तथा व्यवस्थापकीय अनुदान(श्री जनताकृष्ण माध्यामिक विद्यालय)	३००००००।	१६६३७८६।	विद्यालय व्यवस्थापन समिति (सम्झौता)
२	केन्द्रबाट छनौट भएका नमुना विद्यालयको क्रमागत भवन निर्माण अनुदान (श्री जनताकृष्ण माध्यामिक विद्यालय)	७००००००।	७००००००।	विद्यालय व्यवस्थापन समिति (सम्झौता)
३	प्राविधिक धार सञ्चालित कक्षा ११ स्तरोन्नती भएका विद्यालयका लागि ल्याव व्यवस्थापन अनुदान (श्री जनताकृष्ण माध्यामिक विद्यालय)	१८०००००।	१००००००।	विद्यालय व्यवस्थापन समिति (सम्झौता)

क्रमशः

क्र स	योजना कार्यक्रमको नाम र स्थान	विनियोजित बजेट	खर्च भएको बजेट	कार्यान्वयनको ढाँचा(ठेक्का,उपभोक्त समिति र साझेदारी)
४	विद्यालयमा शैक्षिक गुणस्तर सुदृढिकरण कार्यक्रम अन्तर्गत माध्यामिक विद्यालयमा विज्ञान प्रयोगशाला निर्माण अनुदान (श्री जीवनोद्धार मा.वि र श्री भगवती मा.वि)	१३०००००।	१३०००००।	कार्यक्रम समझौता (विद्यालय व्यवस्थापन समिति)
५	विद्यालयमा शैक्षिक गुणस्तर सुदृढिकरण कार्यक्रम अन्तर्गत माध्यामिक विद्यालयमा ICT ल्याव व्यवस्थापन र पुस्तकालय निर्माण अनुदान (श्री युवावर्ष जनता रविचित्र मा.वि, श्री भृकुटी आधारभूत विद्यालय र श्री जनज्योती माध्यामिक विद्यालय)	१९५००००।	१९५००००।	कार्यक्रम समझौता (विद्यालय व्यवस्थापन समिति)
६	मुख्यमन्त्री शैक्षिक सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत शौचालय निर्माण कार्यक्रम (श्री गौतम आधारभूत विद्यालय र श्री विद्या विकास आधारभूत विद्यालय)	८०००००।	८०००००।	कार्यक्रम समझौता (विद्यालय व्यवस्थापन समिति)

क्रमशः

क्र स	योजना कार्यक्रमको नाम र स्थान	विनियोजित बजेट	खर्च भएको बजेट	कार्यान्वयनको ढाँचा(ठेक्का,उपभोक्ता समिति र साझेदारी)
७	विद्युतीय अध्ययन अध्यापनका लागि डिजिटल उपकरणहरुको खरिद र वितरण	रु. ५०००००।	रु.५०००००।	
८	धार्मिक विद्यालय व्यवस्थापन अनुदान (श्री पाणीनी वेद विद्याश्रम)	रु. २०००००।	२०००००।	विद्यालय व्यवस्थापन समिति (सम्झौता)
९	राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत माध्यामिक विद्यालयमा ICT ल्याव व्यवस्थापन कार्यक्रम	रु. १३०००००।	रु. १३०००००।	कार्यक्रम सम्झौता विद्यालय व्यवस्थापन समितिसँग
१०	प्राविधिक धार सञ्चालित विद्यालयका लागि प्रति विद्यार्थी सिकाई लागत तथा OJT, Operation cost व्यवस्थापन अनुदानप्रति विद्यार्थी रु १५ हजारका दरले	रु १२३००००	रु १२३००००।	विद्यालयबाट प्राप्त प्रस्तावका आधारमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिसँग कार्यक्रम सम्झौता

सन्धिखर्क नगरपालिकाको आ.व. ०७८/७९ मा पशु सेवा तर्फ स्वीकृत कार्यक्रम तथा प्रगति

क्र.स.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	बजेट रु.	खर्च रकम	संचालित स्थान	कार्यान्वयन को ढाँचा	लाभान्वित संख्या
१	साविक वडा नं. १ बाहेक विपन्न दलित जनजातिहरुलाई बाख्रा र खोर निर्माण सामग्री वितरण स.न.पा.-०९	९०००००	९०००००	वडा नं.९	उपभोक्ता समिति	१७५ घरधुरी
२	आ.व.२०७७/७८ मा स्थापना भएको बाख्राको साना व्यवसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र(पकेट) विकास कार्यक्रम निरन्तरता	७०००००	७०००००	वडा नं.७	उपभोक्ता समिति	१०० घरधुरी
३	बाख्राको साना व्यवसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र(पकेट) विकास कार्यक्रम संचालन	१५०००००	१४५००००	वडा नं. ३	उपभोक्ता समिति	१७५ घरधुरी

सन्धिखर्क नगरपालिकाको आ.व. ०७८/७९ मा कृषि विकास तर्फ स्वीकृत कार्यक्रम तथा प्रगति

क्र.स.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	बजेट रु.	खर्च रकम	संचालित स्थान	कार्यान्वयन को ढाँचा	लाभान्वित संख्या
१	साना व्यवसायिक पकेट विकास कार्यक्रम(तरकारी पकेट कार्यक्रम)	१२०००००	१२०००००	वडा नं.१०	पकेट संचालन समिति	९६ घरधुरी
२	खाधान्न बाली(गहुँको बीउ वितरण कार्यक्रम)५०% अनुदान	६०००००	६०००००	सम्पूर्ण वडाहरू	टेण्डर मार्फत	३७२ घरधुरी
३	मिनीटिलर वितरण(५०% अनुदानमा)	४५००००	४५००००	सम्पूर्ण वडाहरू	टेण्डर मार्फत	प्रत्यक्ष-१५ अप्रत्यक्ष-१३० घरधुरी
४	प्लास्टिक टनेल वितरण(५०% अनुदानमा)	५०००००	५०००००	सम्पूर्ण वडाहरू	टेण्डर मार्फत	२२० घरधुरी

मेडपा शाखा अन्तरगत भएका मुख्य मुख्य योजना/कार्यक्रमहरू

क्र.स	योजना कार्यक्रमको नाम र स्थान	विनियोजित बजेट	खर्च भएको बजेट	कार्यान्वयन ढाँचा
१	सिलाई कटाई आधाभुत सिप विकास तालिम सन्धिखर्क नगरपालिका वडा नं.९	४२०९५५	४२०६९२	सन्धिखर्क नगरपालिका कार्यालय
२	फलामका धातुजन्य खुकुरि बनाउने तालिम सन्धिखर्क नगरपालिका वडा नं.९	३६१८३०	३६१५३६	सन्धिखर्क नगरपालिका कार्यालय
३	व्यूटिपार्लर सम्बन्धि सीप विकास तालिम सन्धिखर्क नगरपालिका वडा नं.८	२७९४५५	२७९४२२	सन्धिखर्क नगरपालिका कार्यालय

बेरुजुको अवस्था

.गत आ.व.सम्म फछ्यौट अंक र प्रतिशत ९२७७४००

फछ्यौट: ३८.७६ प्रतिशत

हालसम्मको बेरुजु रकमको अवस्था

कुल बेरुजु	पेशकी बेरुजु	असुल उपर गर्नुपर्ने	नियमित गर्नुपर्ने	अन्य बेरुजु
१४६५८९१७	२५४७२००	१९११७९	११९२०५४६	-

सामाजिक सुरक्षा भत्ता (लाभग्राहीहरुको संख्या र वितरित रकम)

क्रसं	विवरण	संख्या			दर	जम्मा रकम	वितरण गरिएको
		महिला	पुरुष	जम्मा			कुल रकम
१	जेष्ठ नागरिक अन्य	४६५७	४०२९	८६८६	४०००	२५८५१७७४	१०२६७५९०४
२	जेष्ठ नागरिक दलित	१११३	१२४३	२३५६	२६६०	३४४२७८८	१३०६७३०३
३	विधवा / एकल महिला	५३९८	०	५३९८	२६६०	१०८४२१६०	४२७३८३६४
४	पूर्ण अपाङ्ग	२८४	४४२	७२६	३९९०	२९९८४९०	८६०७८०६
५	अति अशक्त अपाङ्ग	२६३	६१२	८७५	२१२८	१४५३४२४	५३२८८५५
६	बाल पोषण भत्ता	१३५७	१५२३	२८८०	५३२	११५१६४३	४४१७२०७
	कुल जम्मा	१३०७२	७८४९	२०९२१		४४९४०२७९	१७६८३५४३९

नगरपालिकाबाट जारी भएका ऐनहरू

स. नं.	ऐनको नाम	स्वीकृत मिति
१	सहकारी ऐन, २०७४	2074/12/30
२	कृष तथा पशु व्यवसाय प्रवर्द्धन ऐन, २०७४	2074/12/30
३	प्रशासनीयक कार्य व ध नियम मत गर्ने ऐन, २०७४	2074/12/30
४	न्यायिक समितिलाई उजुरी तथा गुनासोको कारवाही कनारा गर्दा अपनाउनु पर्ने व धका सम्बन्धमा व्यवस्थाप गर्ने बनेको ऐन, २०७४	2074/12/30
५	सन्धिखर्क नगरपालिकाको वातावरण तथा प्राकृतिक श्रोत संरक्षण ऐन २०७६	२०७६/९/२८
६	सन्धिखर्क नगरपालिकाको “फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०७८	2078/9/26
७	सन्धिखर्क नगरपालिकाको बजार व्यवस्थापन तथा अनुगमन ऐन , २०७८	2078/9/26
८	सन्धिखर्क नगरपालिकामा वपद् जोखम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको नभएको ऐन २०७८	2078/9/26

क्रमशः

स. नं.	ऐनको नाम	स्वीकृत मति
९	सन्धिखर्क नगरपालिकाको सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५	2078/9/26
१०	सन्धिखर्क नगरपालिकाको सामुदायिक वन ऐन २०७५	2078/9/26
११	सन्धिखर्क नगरपालिकाको संस्था दर्ता ऐन २०७५	2078/9/26
१२	सन्धिखर्क नगरपालिकामा सावक स्थानीय निकायबाट समायोजन भएका स्थायी कर्मचारीहरूलाई प्रोत्साहन सवधा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७९	2079/03/09

नगरपालिकाबाट हालसम्म जारी भएका नियमावली

सि. नं.	नियमावलीको नाम	स्विकृत मिति
१	नगर कार्यपालिका)कार्य विभाजन (नियमावली, २०७४	२०७४/४/३२
२	नगर कार्यपालिका)कार्य सम्पादन (नियमावली, २०७४	२०७४/४/३२
३	निर्णय वा आदेश र अधिकारको प्रमाणिकरण)कार्यविधि (नियमावली, २०७४	२०७४/५/२१
४	नगर प्रहरी नियमावली, २०७५	२०७५/१/३१
५	नगर शिक्षा नियमावली, २०७५	२०७५/१/३१
६	संघ संस्था दर्ता सम्बन्धी नियमावली २०७८	२०७८/१२/०६
७	सहकारी नियमावली २०७९	२०७९/०३/०३

नगरपालिकाबाट हालसम्म जारी भएका कार्यविधि/ मापदण्ड/ निर्देशिका

सि.नं.	निर्माण भएका नियम कार्यविधि मापदण्ड निर्देशिका	स्विकृत मिति
१	राजपत्रको नमूना	२०७५/१/३१
२	योजना तथा बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन, २०७४	२०७४/४/३२
३	नगर सभा संचालन कार्यविधि, २०७४	२०७४/५/२१
४	नगर कार्यपालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४	२०७४/५/३०
५	वस्ती विकास सहरी योजना तथा भवन निर्माण सम्बन्धी आधारभूत निर्माण मापदण्ड, २०७४	२०७४/५/३१
६	पदाधिकारीहरुको आचार संहिता, २०७४	२०७४/५/३१
७	विपद् कोष व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७५	२०७५/१/३१
८	फोहोर व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७५	२०७५/१/३१
९	एफ.एम.रेडियो व्यवस्थापन तथा संचालन कार्यविधि, २०७५	२०७५/१/३१
१०	उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५	२०७५/१/३१

क्रमशः

सि.नं.	निर्माण भएका नियम कार्यविधि मापदण्ड निर्देशिका	स्विकृत मिति
११	कार्यक्रम संचालन (तालिम, गोष्ठी, अनुगमन, भेला, भ्रमण आदि) का लागि खर्चको मापदण्ड (नम्रस) सम्बन्धी निर्देशिका, २०७१	२०७५/१/३१
१२	बजार अनुगमन निर्देशिका, २०७५	२०७५/१/३१
१३	जेष्ठ नागरिक परिचय-पत्र निर्देशिका, २०७५	२०७५/१/३१
१४	कर्मचारीहरूको शिष्टाचार तथा आचार संहिता, २०७५	२०७५/१/३१
१५	घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५	२०७५/१/३१
१६	करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि २०७५	२०७५/१/३१
१७	लक्षित वर्ग कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७५	२०७५/१/३१
१८	असंङ्गठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक वर्ग तथा असाहयहरूलाई उपलब्ध गराइने राहत वितरण कार्यविधि २०७६	२०७६/१२/१८
१९	विपन्न परिवारको लागि जस्तापाता वितरण कार्यविधि २०७७	२०७७/३/७
२०	दुध उत्पादन तथा विक्री वितरणमा आधारित अनुदान कार्यविधि २०७७	२०७७/३/७

क्रमशः

सि.नं.	निर्माण भएका नियम कार्यविधि मापदण्ड निर्देशिका	स्विकृत मिति
२१	विद्यालय अनुदान वितरण कार्यविधि २०७७	२०७७/३/७
२२	कोरोना भाइरस कोभिड -१९ को रोकथाम तथा नियन्त्रण कार्यविधि २०७७	२०७७/५/८
२३	सन्धिखर्क नगरपालिकाको संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्राम्भिक वातावरणीय परीक्षण कार्यविधि २०७७	२०७७/६/१
२४	सन्धिखर्क नगरपालिकाको सार्वजनीक जवाफदेही प्रवर्द्धन सम्बन्धी कार्यविधि २०७७	२०७७/६/१
२५	सन्धिखर्क नगरपालिकाको सूचना तथा अभिलेख केन्द्रको स्थापना तथा सञ्चालन	२०७७/६/१
२६	योजना तर्जुमा सञ्चालन अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण कार्यविधि २०७७	२०७७/६/१
२७	लैङ्गिक एवं मूल प्रवाहिकरण र पछाडि पारिएका व्यक्ति वर्ग समुदायको हित र प्रवर्धन गर्ने सम्बन्धि कार्यविधि २०७७	२०७७/६/१
२८	लघु घरेलु तथा साना उद्योग दर्ता नवीकरण सञ्चालन र नियमन सम्बन्धि कार्यविधि २०७७	२०७७/६/१
२९	जेष्ठ नागरिक मञ्च गठन तथा सञ्चालन कार्यविधि २०७७	२०७७/६/१

क्रमशः

सि.नं	निर्माण भएका नियम कार्यविधि मापदण्ड निर्देशिका	स्विकृत मिति
३०	अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचयपत्र वितरण कार्यविधि २०७७	२०७७/७/४
३१	बीउ पूँजी चालुकोष सञ्चालन कार्यविधि २०७७	२०७७/७/४
३२	बाली तथा पशु विमा प्रिमियम अनुदान कार्यविधि २०७७	२०७७/७/४
३३	पशु सुत्केरी भत्ता गाई भैसी अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७७	२०७७/७/४
३४	बाँझो जग्गा व्यवस्थापन कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०७७	२०७७/७/४
३५	मेलमिलाप सम्बन्धी कार्यविधि २०७७	२०७७/९/८
३६	टोल विकास संस्था सञ्चालन व्यवस्थापन कार्यविधि २०७७	२०७७/९/८
३७	सुलभ कृषि कर्जा कार्यविधि २०७७	२०७७/९/८
३८	लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष सञ्चालन कार्यविधि २०७७	२०७७/९/८

क्रमशः

सि.नं.	निर्माण भएका नियम कार्यविधि मापदण्ड निर्देशिका	स्विकृत मिति
३९	व्यवसाय दर्ता /तथा नवीकरण कार्यविधि २०७७	२०७७/९/८
४०	विपन्न दलित गन्धर्व तथा अल्पसंख्यक समुदायका लागि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम कार्यविधि २०७७	२०७७/९/८
४१	बाल समूह गठन तथा सहजीकरण निर्देशिका २०७७	२०७७/९/८
४२	बालमैत्री स्थानीय कार्यान्वयन कार्यविधि २०७७	२०७७/९/८
४३	गैरसरकारी सघ/संस्था समन्वय कार्यविधि २०७७	२०७७/९/८
४४	नगर प्रमुख छात्रवृत्ति वितरण कार्यविधि २०७८	२०७८/३/१
४५	अन्तर सरकार समन्वय कार्यविधि २०७८	२०७८/२/२१
४६	सन्धिखर्क नगरपालिकाको कृषि तथा पशुपंक्षी विपद् व्यवस्थापन कोष सञ्चालन कार्यविधि २०७८	२०७८/२/२१
४७	सन्धिखर्क नगरपालिकाको नगर क्षेत्रभित्रका निजी घरहरूमा हरियो रङ लगाउने लागत साझेदारी कार्यविधि २०७८	२०७८/६/२२

क्रमशः

सि.नं.	निर्माण भएका नियम कार्यविधि मापदण्ड निर्देशिका	स्विकृत मिति
४८	सन्धिखर्क नगरपालिकाको नगर प्रमुख खुत्रुके बचत योजना सञ्चालन कार्यविधि २०७८	२०७८/६/२२
४९	सन्धिखर्क नगरपालिकाको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली सम्बन्धी कार्यविधि -२०७८	२०७८/७/२६
५०	सन्धिखर्क नगरपालिकाको कन्टिन्जेन्सी रकम खर्च गर्ने कार्यविधि-२०७८	२०७८/९/८
५१	सन्धिखर्क नगरपालिकाको अद्यौगिक ग्राम सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि २०७८	२०७८/९/८
५२	बाल विवाह न्यूनीकरण सम्बन्धी अभियान सञ्चालन कार्यविधि, २०७८	२०७८/१२/०६
५३	सामाजिक विकास समिति कार्य सञ्चालन कार्यविधि-२०७८	२०७८/१२/०६
५४	पूर्वाधार विकास समिति कार्य सञ्चालन कार्यविधि-२०७८	२०७८/१२/०६
५५	आर्थिक विकास समिति कार्य सञ्चालन कार्यविधि-२०७८	२०७८/१२/०६
५६	वन वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन समिति कार्य सञ्चालन कार्यविधि-२०७८	२०७८/१२/०६
५७	सुशासन तथा संस्थागत विकास समिति कार्य सञ्चालन कार्यविधि-२०७८	२०७८/१२/०६

न्यायिक समितिको हालसम्मको कार्य प्रगति

- ❖ रितपूर्वक प्राप्त भएका उजुरी संख्या: ८७
- ❖ न्यायिक समितिबाट मेलमिलाप गराइ फछ्यौट भएको संख्या: ४६
- ❖ मेलमिलाप हुन नसकी सम्बन्धित अदालतमा पठाएको संख्या: ३
- ❖ फछ्यौट हुन बाँकी संख्या: १
- ❖ तामेली संख्या (डिसमिस): २६

मुख्य मुख्य कार्यहरु

- ❖ क्रमागत योजना अन्तर्गत वडा प्रशासनीय भवन निर्माणका ४ वटा भवन मध्ये **४ वटै भवन निर्माण सम्पन्न** भएका ।
- ❖ जिल्लाकै धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्र **अर्घा भगवति मन्दिरको** स्तरोन्नति कार्य सम्पन्न हुनुको साथै सो क्षेत्रमा **गर्लाम अर्घा मैदान लिफ्ट खानेपानी आयोजना सम्पन्न** भएको ।
- ❖ लुम्बिनी प्रदेशको प्रसिद्ध धार्मिक स्थल सुपादेउरालीमा आउने भक्तजनहरुलाई मनोरञ्जन समेत गराउने उद्देश्यले **नरपानीमा गंगा सरोवर ताल स्तरोन्नति कार्य सम्पन्न** भएको ।
- ❖ अर्घा भगवति मन्दिर जाने पहुँच मार्ग **चुत्रावेसी धरम्पानी अर्घा सडक स्तरोन्नति** भइ रहेको ।

मुख्य मुख्य कार्यहरु

- ❖ अन्तरपालिका तथा वडा कार्यालय जाने पहुँच मार्गहरुको स्तरोन्नती कार्यलाई निरन्तरता दिईएको ।
- ❖ नगरपालिकाको सभाहल सहितको प्रशासनिक भवन (२ वटा) निर्माण कार्य भइ रहेका ।
- ❖ जिल्ला समन्वय समिति र नगरपालिकाको म्याचिङमा सनपा-१२मा मिलिमिले खानेपानी आयोजना सम्पन्न भएको ।
- ❖ सन्धिखर्क नगरपालिका वडा नं. ६ स्थित विद्याविनय आ.वि.को भवन निर्माण (रु. २ करोड ५४ लाख लागतमा) भइ रहेको र चालु आ.व. उक्त भवन सम्पन्न हुने ।

मुख्य मुख्य कार्यहरु

- ❖ कोभिड-१९ को कारण निर्माण कार्यमा प्रत्यक्ष असर भएतापनि सामाजिक दुरी कायम गर्दै करिव **१० कि.मी. नयाँ ट्रयाक तथा सडक चौडा गर्ने कार्य, ९ कि.मी. सडक ग्राभेल, करिव २ कि.मी. कालोपत्रे र ४ कि.मी पक्की नाली निर्माण** कार्य सम्पन्न
- ❖ सनपा-५ मा **अर्लादीटारी ट्रस वृज निर्माण** कार्य सम्पन्न भएको ।
- ❖ प्रदेश सरकारको समपुरक अनुदान र नगरपालिका म्याचिङमा सन्धिखर्क नगरपालिका भित्र **ग्रिन स्मार्ट सन्धिखर्क सिटी परियोजना लागु भएको** र उक्त परियोजनाबाट **paperless Governance** को अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याईएको ।

लक्ष्य अनुसार कार्यक्रम सम्पन्न हुन नसक्नुका कारणहरु

- कोभिड १९ महामारी
- स्वीकृत दरबन्दी अनुसारको जनशक्तिको पदपूर्ति नहुनु ।
- जटिल प्रकृतिका पूर्वाधार निर्माणको कार्य पनि उपभोक्ता समितिमार्फत गराउने अभ्यास हुनु ।
- कठिन भौगोलिक वनावट र प्रतिकूल मौसम
- न्यून आन्तरिक आय
- छरिएको बस्ती
- समयमा बजेट निकासा प्राप्तिमा कठिनाई

मुख्य समस्या/चुनौती

- योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि समयतालिका निर्माण र सोको प्रभावकारी कार्यान्वयन
- अत्यधिक टुक्रे योजना
- स्वीकृत दरबन्दी अनुसारको जनशक्तिको पदपूर्ति नहुनु
- सुपादेउराली मन्दिरको आम्दानी/खर्च व्यवस्थापन

मुख्य समस्या/चुनौती

- निर्माण कार्यको गुणस्तर नियन्त्रण
- आन्तरिक आय वृद्धि र दायरा बिस्तार
- सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहबीचको क्षेत्राधिकार विवाद/अस्पष्टता
- फोहोरको दीर्घकालीन व्यवस्थापन
- सेवा प्रवाहलाई छिटो छरितो, मितव्ययी, प्रभावकारी, पारदर्शी, पूर्वानुमानयोग्य तथा गुणस्तरीय बनाउने विषय

नगरपालिकाको अपेक्षा (संघ, प्रदेश र जिल्ला समन्वय समितिसँग)

- संघ तथा प्रदेश मन्त्रालयहरूले सा-साना योजनाहरूमा बजेट वनियोजनलाई न्यूनीकरण हुनु पर्ने ।
- संघ तथा प्रदेशबाट योजनाहरूमा रकम वनियोजन गर्दा दोहोरो नपर्ने गरी वनियोजन हुनु पर्ने ।
- जिल्ला समन्वय समितिबाट संघ, प्रदेश र गापा/नपाका योजनाहरूको अनुगमनलाई थप प्रभावकारी बनाउनु पर्ने ।

नगरपालिकाको अपेक्षा Contd.....

- अन्तरसरकार समन्वय सहजिकरण एवं साझेदारी
- विकास निर्माण कार्यको अनुगमन नियमन
- श्रोतको वनियोजनमा दोहोरोपना हटाउनु पर्ने
- अनुदान रकम समयमै उपलब्ध हुनु पर्ने ।

जिल्ला समन्वय समितिसँगको अपेक्षा

- अन्तरस्थानीय तहको विकास कार्यमा सहजिकरण र अनुगमन हुनु पर्ने ।
- गैह्र सहकारी संस्थाका क्रयाकलापको समेत अनुगमन हुनु पर्ने ।
- विकास निर्माण कार्यको पृष्ठपोषण ।

तस्विरमा उपलब्धि.....



वडा प्रशासनिक भवन वडा नं. ३



वडा प्रशासनिक भवन वडा नं. ४



वडा प्रशासनिक भवन वडा नं. २



अर्घा भगवती मन्दिरको मूर्ति -९

निर्माणाधिन विद्याविनय आ.वि.सनपा-६



सन्धिखर्क नगरपालिकाको निर्माणाधिन प्रशासनिक भवन



सन्धिखर्क नगरपालिकाको निर्माणाधिन प्रशासनिक भवन






निर्माणाधिकन कोल्ड स्टोर सनपा-१

मौलीपोखरा सनपा-५



शहरी शासकीय तथा पूर्वाधार आयोजनातर्फ

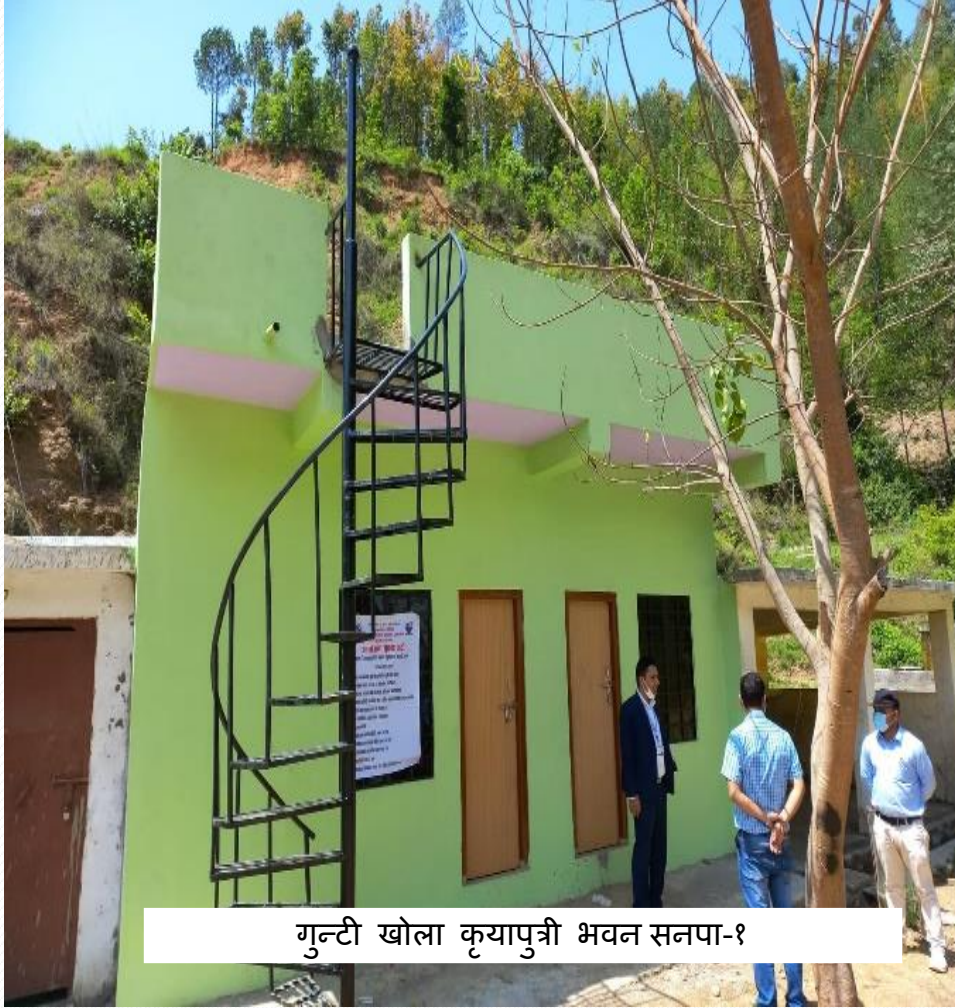

गुन्टी खोला कृयापुत्री भवन सनपा-१



बलेवाड माझगाउँ जाने बाटोमा वाल निर्माण सनपा-५



पकले पौवा सनपा-८



फूदवाड संचाइ कुल निर्माण सनपा-७


Supervision by Municipality



Supervision by Municipality



धरम्पानी भगवती डाँडा सडकमा व्या वन वाल निर्माण सनपा-१०

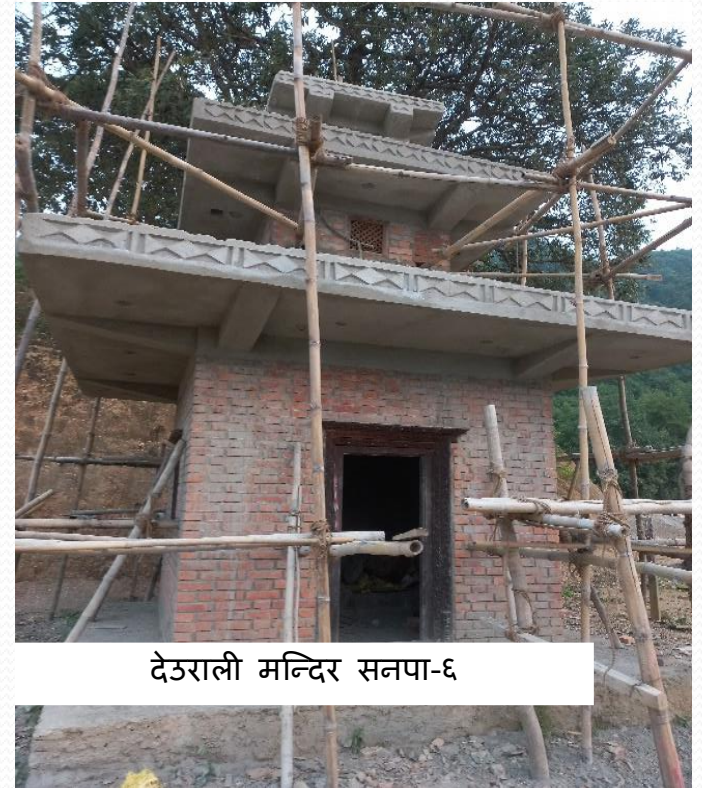

देउराली मन्दिर सनपा-६

Supervision by Municipality



दुर्गा भगवती मन्दिर ट्रेस निर्माण सनपा-९



गाउँघर क्लिनिक निर्माण सनपा-४



चत्रापोखरा सडक स्तरोन्नती
सनपा-९



जिमुर्थुम यायत्री टोला सडक
स्तरोन्नती सनपा-१२



रतहले सता श्रेष्ठको घरदेखि शोव
बहादुर घरसम्म निर्माण सनपा-१



सारनटारी संचाइ कुलो सनपा-
10



बुढीचौरदे ख घोचेखोलासम्म बाटो ढलान सनपा-१०



ज्ञान प्रकाश मा. व. भवन मर्मत सनपा-१२



भगवती मा.वि. कुर प्रवेशद्वार
निर्माण सनपा-२



चौतारा पोखरी मर्मत संभार सनपा-२



चौतारा पोखरी मर्मत संभार सनपा-२

भैरव मन्दिर हुलाकहुँदै मूल सडकसम्म
मो.वा.मा नाली निर्माण सनपा-१



पशु विकास शाखा तर्फ



बाख्रापकेट वडा नं. ३

बाख्रा वितरण कार्यक्रम वडा नं. ९



कृषि विकास शाखा तर्फ







मेडपा तर्फ

सिलाई कटाई सम्बन्धि सिप विकास तालिम



धातुजन्य खुकुरी बनाउने सीप विकास तालिम



व्यूटिपार्लर सम्बन्धि सीप विकास तालिम

